

بسمه تعالی

---

## دهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید

---



مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰  
شماره: ۵۱۶/۳/۵۹۱۰۳/۰۵/۵  
پیوست: دارد

جناب آقای مهندس خواجه دلویی  
رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای فلاحتی  
معاون محترم پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

جناب آقای مهندس بلدی  
معاون محترم توسعه و عمران روستایی

جناب آقای مهندس رحمانی خلیلی  
معاون محترم برنامه ریزی

جناب آقای سیروس  
مدیر کل محترم حوزه نماینده ولی فقیه

جناب آقای مهندس دربندی  
مدیر کل محترم حوزه ریاست

جناب آقای مهندس سلطانی نژاد  
مدیر کل محترم دفتر نظارت راهبردی و مدیریت عملکرد

جناب آقای مهندس ساقیان  
مدیر کل محترم امور شرکتها و مجامع

جناب آقای خاکی پور  
مدیر کل محترم حساب ۱۰۰ و مشارکتهای مردمی

جناب آقای مهندس افتخار  
مدیر کل محترم دفتر تأمین سرمایه و امور بین الملل

جناب آقای خلیجی  
مدیر کل محترم دفتر برنامه، بودجه و تأمین سرمایه

جناب آقای مهندس حیدری ابیانه  
مدیر عامل محترم هلدینگ نوساز ی و عمران تهران

مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان ...

سلام علیکم

احتراماً پیرو جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ با موضوع پیگیری و تحقق تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد، به پیوست نهمین صورت جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید، جهت استحضار و دستور اقدام لازم به حضور ایفاد می گردد.

مجید جودی  
معاون بازسازی و مسکن روستایی

رونوشت:

- جناب آقای رساپور مدیر کل محترم روابط عمومی، جهت اطلاع و اقدام لازم.

نخستین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳

دومین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

سومین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

چهارمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

پنجمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

ششمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳

هفتمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

هشتمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴

نهمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۹

**موضوع جلسه:** نهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید به منظور پیشبرد برنامه‌های مصوب طرح مذکور در بودجه سال ۱۴۰۵ تشکیل و موارد ذیل مقرر گردید:

۱- معاونت بازسازی و مسکن روستایی نسبت به احصاء چالش‌ها و مشکلات اجرایی طرح خانه امید در استان‌ها اقدام نماید تا در جلسات ستاد هماهنگی نسبت به مرتفع نمودن آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

۲- در جلسات طرح خانه امید با حضور استان‌ها، مقرر گردید استان‌های دارای تجربه موفق در زمینه جذب خیرین و همچنین ترویج موضوع طرح خانه امید نسبت به ارائه تجربیات خود اقدام نمایند.

۳- به منظور تأمین زمین در شهرهای فاقد اراضی تا سقف سهمیه ۲۰ هزار واحد مسکونی برای طرح خانه امید، استان‌های فاقد اراضی مناسب می‌توانند از ظرفیت «دستورالعمل اجرایی واگذاری اراضی روستایی» ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی به شماره ۴۰۸۵۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ به منظور شناسایی و امکان‌سنجی الحاق اراضی جدید اقدام نمایند.

۴- معاونت توسعه و عمران روستایی در جلسات آتی نسبت به ارائه گزارش از میزان اراضی واگذار شده در راستای صورتحساب واگذاری زمین در روستاهای حریم شهر و نیز برنامه و عملکرد واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله، ماده ۴، جوانی جمعیت و مسکن معیشت-محور اقدام نماید.

۵- با توجه به واریزی علی‌الحساب عواید حاصل از فروش زمین به حساب استان‌ها به مبلغ ۹۴ میلیارد تومان، مقرر گردید هزینه مبلغ مذکور مطابق با دستورالعمل اجرایی تأمین مسکن محرومین ابلاغی به استان‌ها و ثبت در سامانه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی صورت پذیرد. در خصوص استان‌هایی که مبلغ موجود در حساب مشترک آن‌ها کمتر از سهم تعیین شده توسط دفتر امور زمین معاونت توسعه و عمران روستایی می‌باشد، مقرر گردید عدد اعلامی مذکور در راستای طرح خانه امید آن استان هزینه و سند مالی آن به معاونت پشتیبانی ارائه شود.

۶- معاونت برنامه‌ریزی نسبت به ارائه گزارش از میزان اعتبارات مصوب، ابلاغی و تخصیص‌یافته از محل موافقتنامه‌های مبادله شده استانی اقدام نماید.

۷- معاونت پشتیبانی در جلسه آتی نسبت به ارائه گزارش از میزان تخصیص امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه مهر ایران به معاونت بازسازی و مسکن روستایی جهت تکمیل و تأمین اعتبار در طرح خانه امید اقدام نماید.

۸- پیرو بند (۴) هشتمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید، دفتر امور مجامع نسبت به پیگیری ایجاد حساب یکپارچه در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به منظور استفاده از ۲۰ درصد سرجمع امتیاز اعتبارات تسهیلات نزد بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت جهت تخصیص به طرح خانه امید اقدام نماید. گزارش عملکرد در این خصوص در جلسات آتی توسط دفتر مربوط به ارائه گردد.

۹- به منظور تأمین منابع اعتباری سهم بدهی شرکت‌های تابعه به حساب ۱۰۰ حضرت امام در بودجه سال ۱۴۰۵ بنیاد به مبلغ ۱۰۶۹ میلیارد تومان، دفتر امور مجامع ضمن تهیه جدول سهم هر یک از شرکت‌ها، موضوع را در جلسه بررسی عملکرد شرکتها مطرح نماید تا در خصوص تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه سهم حساب ۱۰۰، تصمیم‌گیری شود.

۱۰- با توجه به گزارش معاون محترم برنامه ریزی در خصوص ظرفیت‌های استفاده از اعتبارات مالیاتی شرکت‌های بزرگ، مقرر گردید دفتر امور مجامع نسبت به پیگیری استفاده از ظرفیت مالیات شرکت‌های تابعه برای طرح خانه امید اقدام و در جلسه آتی میزان ظرفیت قابل استفاده را اعلام نماید.

۱۱- به منظور استفاده بهینه از منابع و اعتبارات سهم شرکت‌های تابعه در طرح خانه امید، مقرر گردید تعریف پروژه در استان‌ها در چارچوب گردشکار توافق شده فی مابین معاونت بازسازی و مسکن روستایی، معاونت پشتیبانی و همچنین دفتر امور مجامع صورت پذیرد. در همین راستا دفتر امور مجامع نسبت به هماهنگی با شرکت‌های تابعه اقدام نماید.

۱۲- با توجه به گزارش مدیرعامل محترم هلدینگ «نوسازی و عمران تهران» در خصوص امکان استفاده از ظرفیت زمین واقع در هشتگرد برای طرح خانه امید، مقرر گردید متناسب با گردشکار تعریف شده با هماهنگی معاونت بازسازی و مسکن روستایی نسبت به تعریف پروژه طرح خانه امید اقدام شود.

۱۳- به منظور استفاده بهینه از اراضی در اختیار هلدینگ «نوسازی و عمران تهران» مقرر گردید، نسبت به مولدسازی اراضی فاقد توجیه تعریف پروژه و ساخت مسکن در طرح خانه امید، به منظور تأمین منابع در طرح خانه امید اقدام شود.

۱۴- دفتر حساب ۱۰۰ و مشارکتهای مردمی نسبت به ارائه گزارش از تعداد مجمع خیرین برگزار شده در استان‌ها و همچنین اقدامات صورت گرفته در این راستا اقدام نماید.

۱۵- دفتر روابط عمومی نسبت به ارائه گزارش از تعداد اخبار انتشار یافته جهت اطلاع رسانی و پخش کلیپ‌های تهیه شده در زمینه طرح خانه امید در رسانه‌های جمعی و همچنین انعکاس اخبار انتشار یافته و ضرب نفوذ اخبار طرح خانه امید در رسانه‌های جمعی اقدام نماید.

# □ وظایف معاونت بازسازی



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

شماره: ۵/۰۵/۵۹۱۰۱/۳۲۴۸۲

پیوست: ندارد

مدیران کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها

سلام علیکم

احتراماً در راستای بند (۱) نهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید و همچنین به منظور تسریع در پیشبرد اهداف طرح مذکور، خواهشمند است دستور فرمائید چالش‌ها و مشکلات اجرایی در سطوح مختلف شهرستانی و استانی در ۵ بخش به شرح جدول زیر احصاء و به همراه راهکارهای پیشنهادات آن استان حداکثر تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ به این دفتر ارسال نمایند.

| بخش                            | چالش‌ها و مشکلات | راهکارهای پیشنهادی |
|--------------------------------|------------------|--------------------|
| تأمین زمین                     |                  |                    |
| تسهیلات ساخت و یا تکمیل واحدها |                  |                    |
| تأمین کمک بلاعوض               |                  |                    |
| تأمین نهاده‌های ساختمانی       |                  |                    |
| ضوابط و فرایندهای ساخت و ساز   |                  |                    |

سید رضا حمیدی  
مدیر کل مسکن روستایی

✓ معاونت بازسازی و مسکن روستایی نسبت

به احصاء چالش‌ها و مشکلات اجرایی طرح

خانه امید در استان‌ها اقدام نماید تا در

جلسات ستاد هماهنگی نسبت به مرتفع

نمودن آن‌ها تصمیم‌گیری شود



# اجزاء طرح خانه امید در بنیاد مسکن



# اجزاء طرح خانه امید در بنیاد مسکن



# تعداد واحد در دست اجرای طرح خانه امید در سال ۱۴۰۵

۵۶۴۹۳  
واحد روستایی  
۷۰ درصد

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۴۱۷ واحد | عملکرد طرح ویژه بهسازی مسکن <b>روستایی</b> اعتبار ۱۴۰۴                          |
| ۲۱۲۸ واحد  | پروژه های در دست اجرای طرح ویژه بهسازی سنوات گذشته (دارای مشارکت مدنی)          |
| ۱۰۶۶۹ واحد | پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین روستایی بنیاد ساخت انتقالی                  |
| ۹۸۸ واحد   | تفاهم نامه ۸ هزار واحدی روستایی کمیته امداد (۱۴۹۱ واحد سهمیه مانده در سال ۱۴۰۵) |
| ۵۱۴۰ واحد  | تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین روستایی (بدون مشارکت مدنی)                 |
| ۳۷۹۲ واحد  | واحدهای نیمه تمام انتقالی از محل طرح تامین مسکن محرومین از محل حساب ۱۰۰         |
| ۱۳۵۹ واحد  | تفاهم نامه ۸ هزار واحدی بهزیستی - روستایی                                       |

۲۴۷۷۹  
واحد شهری  
۳۰ درصد

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۹۸۶۶ واحد  | عملکرد طرح ویژه بهسازی مسکن <b>شهری</b> اعتبار ۱۴۰۴                    |
| ۳۱۵۵ واحد  | پروژه های در دست اجرای طرح ویژه بهسازی سنوات گذشته (دارای مشارکت مدنی) |
| ۶۳۰۰ واحد  | پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین شهری انتقالی (۶۳۰۰ واحد)           |
| ۱۹۰۰ واحد  | تفاهم نامه ۳۰ هزار واحدی شهر زیر ۲۵ هزار کمیته امداد                   |
| ۱۲۵۳ واحد  | تفاهم نامه ۸ هزار واحدی بهزیستی - شهری                                 |
| ۱۷۷ واحد   | مسکن استیجار شهری (استان خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری و بوشهر)     |
| ۲۱۲۸ واحد  | پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی در انتظار معرفی به بانک                  |
| ۸۱۳۷۹ واحد | مجموع                                                                  |
| ۸۴ درصد    | برنامه تا (۱۴۰۵، ۶، ۱۵)                                                |
| تحقق       | ۹۷۰۰۰ واحد                                                             |

# تعداد واحد در دست اجرای مسکن محرومین در سال ۱۴۰۵

| شرح                    |               |             |        |                         |           |        |         |           |                                                                           |
|------------------------|---------------|-------------|--------|-------------------------|-----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| تعداد واحد در دست اجرا | معرفی به بانک | عقد قرارداد | پی کنی | درصد شروع عملیات اجرایی | فونداسیون | اسکلت  | سفتکاری | نازک کاری |                                                                           |
| ۳۲،۴۱۷                 | ۳۲،۴۱۷        | ۷،۲۸۰       | ۳۰،۶۴۸ | %۹۵                     | ۷،۰۳۳     | ۳،۴۸۲  | ۱،۰۶۸   | ۲۶۶       | ۱ طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی اعتبار ۱۴۰۴                                |
| ۱۰،۶۶۹                 | ۴،۴۰۱         | ۴،۴۰۱       | ۱۰،۶۶۹ | %۱۰۰                    | ۱۰،۶۶۹    | ۵،۷۳۰  | ۴،۹۹۷   | ۱،۱۹۷     | ۲ پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین روستایی بنیاد ساخت انتقالی          |
| ۹۸۸                    | ۹۹۱           | ۷۱۳         | ۹۸۸    | %۱۰۰                    | ۸۰۶       | ۶۷۵    | ۲۹۵     | ۲۵۵       | ۳ تفاهم نامه ۸ هزار واحدی روستایی کمیته امداد                             |
| ۵،۱۴۰                  | ۵،۱۴۰         | ۵،۱۴۰       | ۵،۱۴۰  | %۱۰۰                    | ۵،۱۴۰     | ۵،۰۲۸  | ۴،۷۶۹   | ۱،۵۱۱     | ۴ تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین روستایی                            |
| ۳،۷۹۲                  | ۳،۷۲۷         | ۳،۷۲۱       | ۳،۶۴۳  | %۹۶                     | ۳،۶۱۸     | ۳،۴۷۵  | ۳،۰۷۲   | ۹۲۴       | ۵ واحدهای انتقالی از محل طرح تامین مسکن محرومین از محل حساب ۱۰۰           |
| ۱،۳۵۹                  | ۱،۳۰۹         | ۱،۲۴۷       | ۱،۲۶۷  | %۹۳                     | ۱،۲۵۳     | ۱،۲۰۱  | ۱،۰۴۴   | ۶۵۹       | ۶ تفاهم نامه ۸ هزار واحدی بهزیستی                                         |
| ۲،۱۲۸                  | ۲،۱۲۸         | ۲،۱۲۸       | ۲،۱۲۸  | %۱۰۰                    | ۱،۹۸۸     | ۱،۳۰۴  | ۶۲۴     | ۰         | ۷ پروژه های در دست اجرای طرح ویژه بهسازی سنوات گذشته (دارای مشارکت مدنی)  |
| ۵۶،۴۹۳                 | ۵۰،۱۱۳        | ۲۴،۶۳۰      | ۵۴،۴۸۳ | %۹۶                     | ۳۰،۵۰۷    | ۲۰،۸۹۵ | ۱۵،۸۶۹  | ۴،۸۱۲     | مجموع                                                                     |
| ۹،۸۶۶                  | ۹،۸۶۶         | ۲،۱۳۲       | ۹،۱۲۵  | %۹۲                     | ۲،۸۷۹     | ۱،۵۲۰  | ۵۸۰     | ۷۸        | ۸ عملکرد طرح ویژه بهسازی مسکن شهری اعتبار ۱۴۰۴                            |
| ۶،۳۰۰                  | ۵،۹۷۴         | ۴،۲۰۳       | ۶،۳۰۰  | %۴                      | ۶،۰۲۸     | ۵،۳۴۸  | ۳،۳۹۲   | ۱،۳۵۲     | ۹ پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین شهری                                |
| ۱،۹۰۰                  | ۱،۶۰۳         | ۱،۵۲۹       | ۱،۸۲۲  | %۹۶                     | ۱،۶۹۷     | ۱،۵۷۷  | ۱،۴۷۴   | ۱،۴۰۴     | ۱۰ تفاهم نامه ۳۰ هزار واحدی شهر زیر ۲۵ هزار کمیته امداد                   |
| ۱،۲۵۳                  | ۱،۰۸۲         | ۹۸۸         | ۱،۰۶۴  | %۸۵                     | ۱،۰۲۶     | ۹۲۵    | ۷۷۹     | ۴۶۸       | ۱۱ تفاهم نامه ۸ هزار واحدی بهزیستی                                        |
| ۱۷۷                    | ۰             | ۰           | ۱۷۷    | %۱۰۰                    | ۱۷۷       | ۱۷۷    | ۱۷۷     | ۱۷۷       | ۱۲ مسکن استیجار (بصورت پایلوت)                                            |
| ۲،۱۲۸                  | ۰             | ۰           | ۲،۱۲۸  | %۱۰۰                    | ۰         | ۰      | ۰       | ۰         | ۱۳ پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی در انتظار معرفی به بانک                  |
| ۳،۱۵۵                  | ۳،۱۵۵         | ۳،۱۵۵       | ۳،۱۵۵  | %۱۰۰                    | ۲،۹۵۳     | ۲،۳۵۷  | ۱،۱۸۶   | ۰         | ۱۴ پروژه های در دست اجرای طرح ویژه بهسازی سنوات گذشته (دارای مشارکت مدنی) |
| ۲۴،۷۷۹                 | ۲۱،۶۸۰        | ۱۲،۰۰۷      | ۲۳،۷۷۱ | %۹۶                     | ۱۴،۷۶۰    | ۱۱،۹۰۴ | ۷،۵۸۸   | ۳،۴۷۹     | مجموع                                                                     |
| ۸۱،۳۷۹                 | ۷۱،۷۹۳        | ۳۶،۶۳۷      | ۷۸،۲۵۴ | %۹۶                     | ۴۵،۲۶۷    | ۳۲،۷۹۹ | ۲۳،۴۵۷  | ۸،۲۹۱     | کل                                                                        |

# عملکرد بانک ها از محل اعتبار تخصیصی طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اعتبار سال ۱۴۰۴

| ردیف  | بانک عامل | تعداد سهمیه اختصاص یافته | تاریخ ابلاغ بانک | سهمیه ابلاغ شده از سوی بانک عامل |      | وضعیت معرفی به بانک |                         | وضعیت انعقاد قرارداد |               | مجموع جذب (میلیارد ریال) |
|-------|-----------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|       |           |                          |                  | تعداد                            | درصد | تعداد               | درصد از سهمیه ابلاغ شده | تعداد                | نسبت به معرفی |                          |
| ۱     | تجارت     | ۲۴,۰۰۰                   | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳       | ۲۴,۰۰۰                           | ۱۰۰٪ | ۱۶,۷۵۲              | ۷۰٪                     | ۵,۲۹۷                | ۳۲٪           | ۷,۴۴۴                    |
| ۲     | رفاه      | ۱۲,۵۴۵                   | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳       | ۱۲,۵۴۵                           | ۱۰۰٪ | ۹,۳۰۰               | ۷۴٪                     | ۲,۲۳۰                | ۲۴٪           | ۲,۷۲۰                    |
| ۳     | سپه       | ۵,۴۵۵                    | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰       | ۵,۴۵۵                            | ۱۰۰٪ | ۳,۳۲۵               | ۶۱٪                     | ۴۴۲                  | ۱۳٪           | ۴۱۸                      |
| ۴     | صادرات    | ۲۴,۰۰۰                   | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷       | ۲۴,۰۰۰                           | ۰٪   | ۱۰,۰۷۳              | ۴۲٪                     | ۱,۴۲۴                | ۱۴٪           | ۱,۳۹۶                    |
| ۵     | پست بانک  | ۶,۰۰۰                    | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲       | ۶,۰۰۰                            | ۰٪   | ۷۱۱                 | ۱۲٪                     | ۹                    | ۱٪            | ۳                        |
| ۶     | ملت       | ۲۴,۰۰۰                   | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷       | ۲۴,۰۰۰                           | ۰٪   | ۲,۱۲۲               | ۹٪                      | ۱۱                   | ۱٪            | ۸                        |
| ۷     | ملی       | ۲۴,۰۰۰                   | —                | ۰                                | ۰٪   | ۰                   | ۰٪                      | ۰                    | ۰٪            | ۰                        |
| مجموع |           | ۱۲۰,۰۰۰                  | —                | ۹۶,۰۰۰                           | ۸۰٪  | ۴۲,۲۸۳              | ۴۴٪                     | ۹,۴۱۳                | ۲۲٪           | ۱۱,۹۸۹                   |

مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص اعتبار ۱۴۰۴ (تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی)

ابلاغ سهمیه بانک ها از تسهیلات بهسازی اعتبار ۱۴۰۴ - توسط بانک م.ج.ا به بانک های عامل

صدور تضمین نامه از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور با شناسه یکتای ۹۹۱۶۳۱۷۷۸۲

صدور تضمین نامه از طرف صندوق ملی زمین و مسکن

۱۴۰۴/۱۱/۲۰

۱۴۰۵/۰۲/۱۶

۱۴۰۵/۰۵/۱۷

۱۴۰۵/۰۵/۱۷

# تفاهم نامه های مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

تفاهم نامه تامین ۸ هزار واحد مسکن روستایی

تعداد پرونده تایید شده ۷۸۰۸

| پرونده<br>تایید شده | معرفی به<br>بانک | انعقاد<br>قرارداد | پی کتی | فونداسیون | اسکلت | گچ و خاک، نصب در و پنجره |                 |
|---------------------|------------------|-------------------|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------------|
| ۷۸۰۸                | ۷۵۰۱             | ۷۲۲۴              | ۷۴۹۷   | ۷۳۱۵      | ۷۱۸۱  | ۶۷۶۴                     | عملکرد کلی      |
| ۱۲۹۹                | ۹۹۱              | ۷۱۳               | ۹۸۸    | ۷۹۶       | ۶۶۵   | ۲۵۵                      | عملکرد سال ۱۴۰۵ |

کمک به ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن شهری  
سهامیه شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر : ۲۵۰۰ واحد

تعداد پرونده تایید شده ۱۹۰۵

| پرونده<br>تایید شده | معرفی به<br>بانک | انعقاد<br>قرارداد | پی کتی | فونداسیون | اسکلت | گچ و خاک، نصب در و<br>پنجره |            |
|---------------------|------------------|-------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------|------------|
| ۱۹۰۵                | ۱۶۰۰             | ۱۵۷۲              | ۱۸۲۱   | ۱۶۹۴      | ۱۵۷۵  | ۱۴۰۱                        | عملکرد کلی |

## □ وظایف معاونت بازسازی

✓ عملکرد تفاهم نامه ۶۰۰۰ واحد کمیته امداد برای پروژه های بنیاد ساخت شهری

(واحدهای بنیاد ساخت شهری با سرانه بلاعوض ۴۰۰ میلیون تومان کمیته امداد)

• تا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ تعداد **۳۵۷۵ واحد** صورتجلسه شده می باشد.

| پی کنی | فونداسیون | اسکلت | سفتکاری | نازک کاری |
|--------|-----------|-------|---------|-----------|
| ۲۹۲۷   | ۱۹۱۷      | ۱۶۳۲  | ۱۰۲۴    | ۴۴۱       |

## □ وظایف معاونت بازسازی


✓ عملکرد تفاهم نامه ۸۰۰۰ واحد بهزیستی (۴۹۰۰ سهمیه شهری و ۳۱۰۰ سهمیه روستایی)

| معرفی به بانک | عقد قرارداد | پی کنی | فونداسیون | اسکلت | سفتکاری | نازک کاری |         |
|---------------|-------------|--------|-----------|-------|---------|-----------|---------|
| ۱۰۸۲          | ۹۸۸         | ۱۰۶۴   | ۱۰۲۶      | ۹۲۵   | ۷۷۹     | ۴۶۸       | شهری    |
| ۱۳۰۹          | ۱۲۴۸        | ۱۲۶۷   | ۱۲۵۳      | ۱۲۰۱  | ۱۰۴۴    | ۶۵۹       | روستایی |
| ۲۳۹۱          | ۲۲۳۵        | ۲۳۳۱   | ۲۲۷۹      | ۲۱۲۶  | ۱۸۲۳    | ۱۱۲۷      | مجموع   |



## □ وظایف معاونت بازسازی

✓ عملکرد تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین روستایی

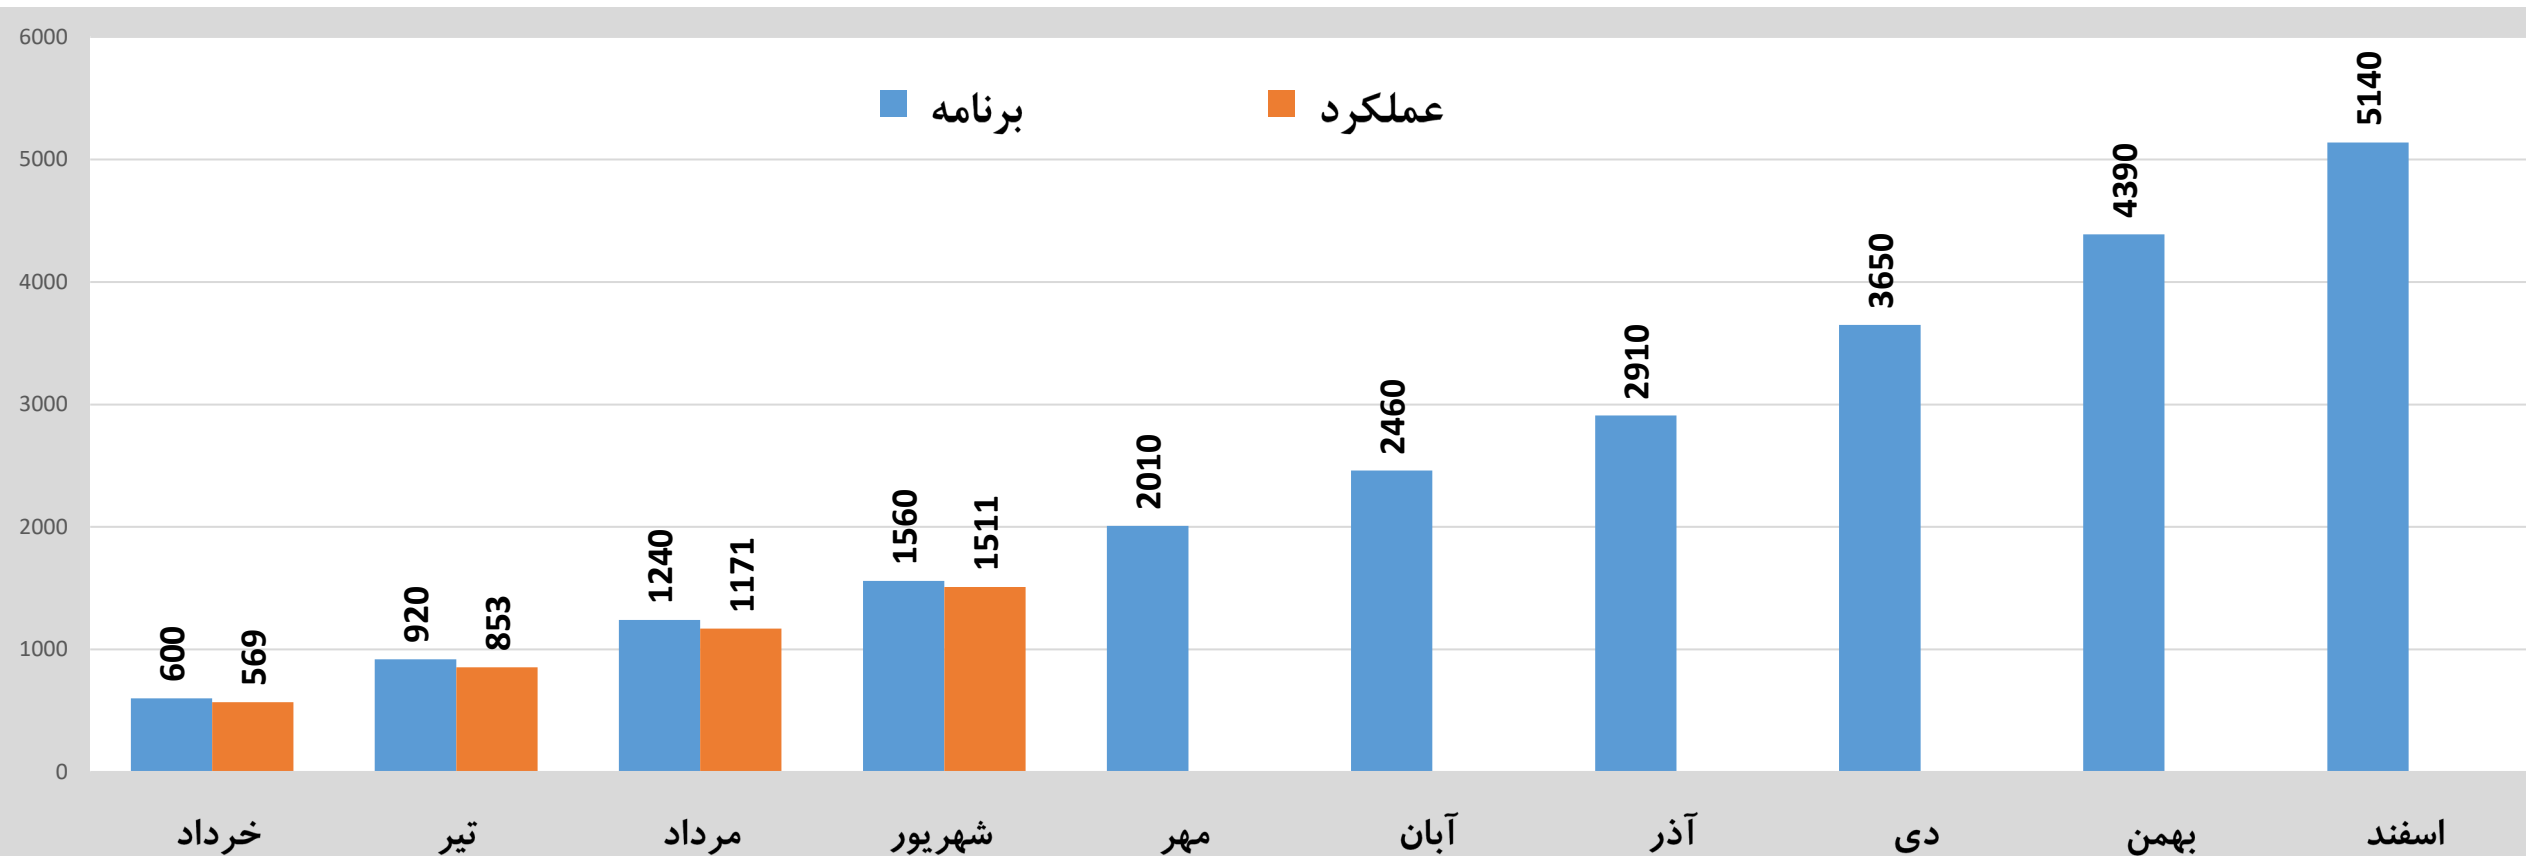

## □ میزان کمک بلاعوض پرداختی به استان‌ها (از محل موافقتنامه ۱۴۰۴ و واریزی های سال ۱۴۰۵)

| شرح     | ابلاغ ماده ۷۵ |       | حساب ۱۰۰ |       | مجموع (میلیارد ریال) |
|---------|---------------|-------|----------|-------|----------------------|
|         | ۱۴۰۴          | ۱۴۰۵  | ۱۴۰۴     | ۱۴۰۵  |                      |
| روستایی | -             | -     | ۴۰۰      | ۶۹۲,۰ | ۱,۹۴۸                |
|         | -             | -     | ۴۰۰      | ۸۵۶   |                      |
|         | ۰             | ۰     | ۴۰۰      | ۱,۵۴۸ |                      |
| شهری    | ۲,۵۱۱         | ۱,۰۴۱ | -        | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۵۲                |
|         | ۲,۵۱۱         | ۱,۰۴۱ | ۰        | ۵۰۰   |                      |
|         | ۲,۵۱۱         | ۱,۰۴۱ | ۰        | ۲۳۰   |                      |
|         | ۲,۵۱۱         | ۱,۰۴۱ | ۰        | ۱,۷۰۰ |                      |
| کل کشور | ۲,۵۱۱         | ۱,۰۴۱ | ۴۰۰      | ۳,۲۴۸ | ۷,۲۳۰                |

باقیمانده از ۷۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص موافقتنامه سال ۱۴۰۴، ۲۷۰ میلیارد ریال است که نزد شرکت بازرگانی بعنوان خرید مصالح هزینه می‌شود.

- سلول نارنجی در انتظار پرداخت پشتیبانی است.

# □ میزان کمک بلاعوض پرداختی به استان‌ها (از محل موافقتنامه ۱۴۰۴ و واریزی های سال ۱۴۰۵)


| شرح     | ۱۴۰۴  |                       | ۱۴۰۵    |                                             | مجموع (میلیارد ریال) |
|---------|-------|-----------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|
|         | مبلغ  | سرفصل اعتبار          | مبلغ    | سرفصل اعتبار                                |                      |
| روستایی | ۴۰۰   | موافقتنامه (حساب ۱۰۰) | ۵۶۸     | تفاهم‌نامه‌های سنوات قبل                    | ۳،۹۶۶                |
|         |       |                       | ۴۳۰     | اقشار محروم                                 |                      |
|         |       |                       | ۶۹۲     | موافقتنامه (حساب ۱۰۰)                       |                      |
|         |       |                       | ۸۵۶     | موافقتنامه (حساب ۱۰۰)                       |                      |
|         |       |                       | ۳۰۰     | تفاهم نامه کمیته امداد (۸ هزار واحدی)       |                      |
|         |       |                       | ۷۲۰     | تفاهم نامه کمیته امداد (۸ هزار واحدی)       |                      |
|         | مجموع | ۴۰۰                   | مجموع   | ۳،۵۶۶                                       |                      |
| شهری    | ۲،۵۱۱ | موافقتنامه (ماده ۷۵)  | ۱،۰۴۱   | موافقتنامه (ماده ۷۵)                        | ۸،۱۲۱                |
|         |       |                       | ۱،۰۰۰   | موافقتنامه (حساب ۱۰۰)                       |                      |
|         |       |                       | ۵۰۰     | موافقتنامه (حساب ۱۰۰)                       |                      |
|         |       |                       | ۲۳۰     | موافقتنامه (حساب ۱۰۰)                       |                      |
|         |       |                       | ۳۳      | نیم درصد سود بانک‌ها                        |                      |
|         |       |                       | ۸۰      | مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان |                      |
|         |       |                       | ۱،۷۷۱   | عواید فروش زمین                             |                      |
|         |       |                       | ۲۰۲     | کمک نقدی خیرین و سهم بنیاد                  |                      |
|         |       |                       | ۴۲۳     | کمک نقدی خیرین و سهم بنیاد                  |                      |
|         |       |                       | ۳۳۰     | تفاهم نامه کمیته امداد (۸ هزار واحدی)       |                      |
|         | مجموع | ۲،۵۱۱                 | مجموع   | ۵،۶۱۰                                       |                      |
| کل کشور |       | ۲،۹۱۱                 | کل کشور |                                             | ۱۲،۰۸۷               |

▪ اعداد آبی منابع غیراز موافقتنامه سال ۱۴۰۴ می باشند. - سلول نارنجی در انتظار پرداخت پشتیبانی است.

# کمک بلاعوض تخصیص داده شده به استان‌ها (میلیارد ریال)

مجموع پرداختی: ۱۲۰۸۷ میلیارد ریال

متوسط ۳۹۰ میلیارد ریال

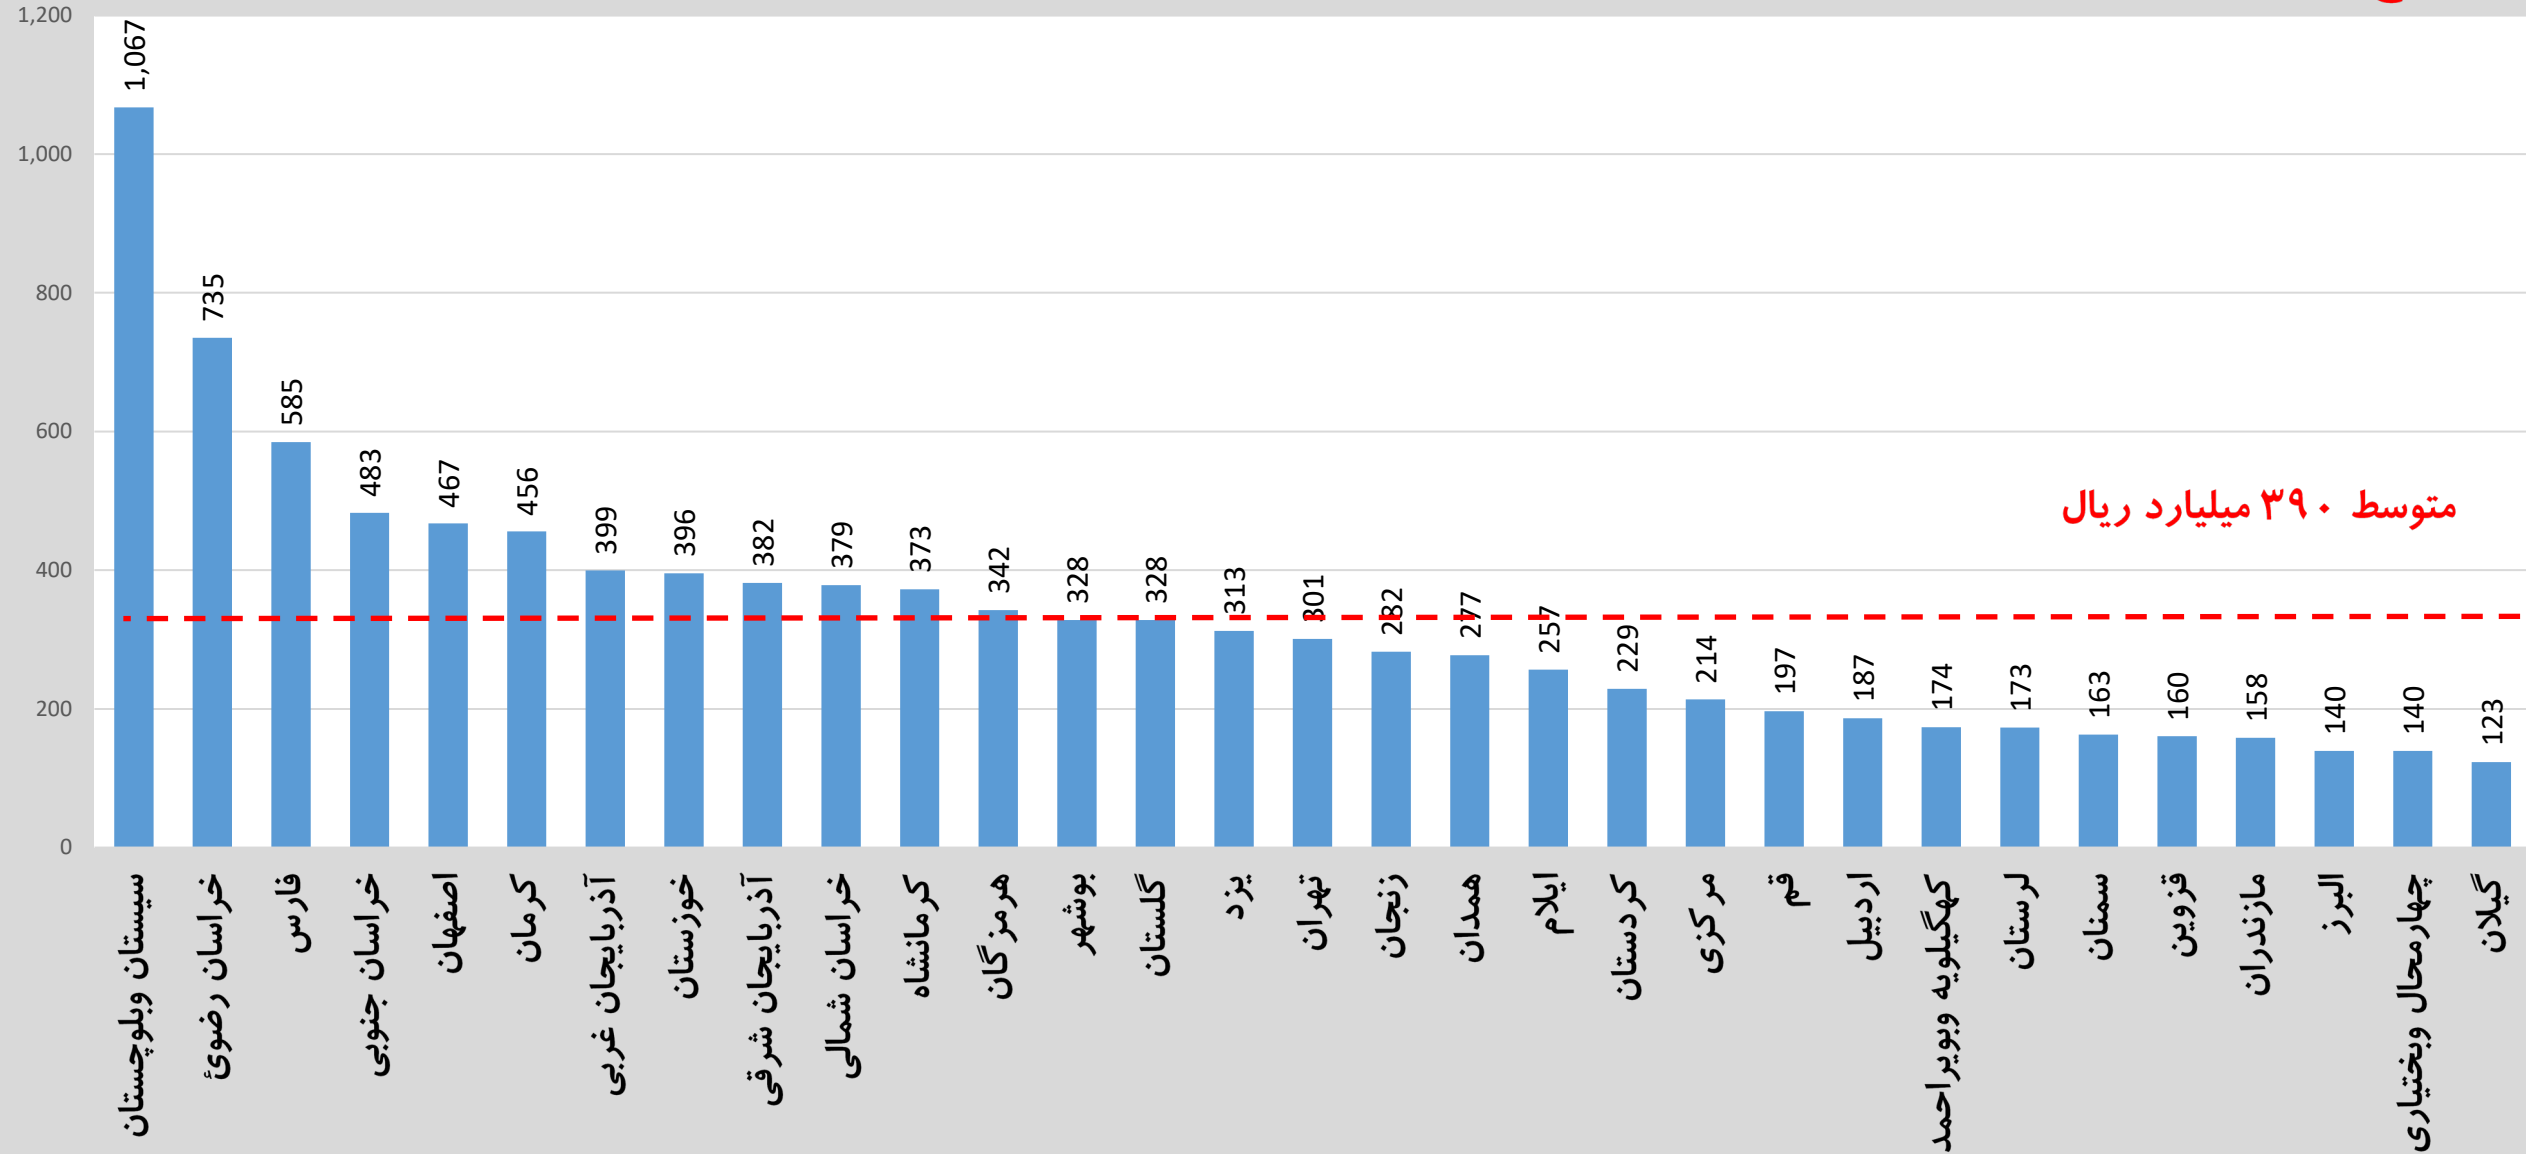

# مسکن استیجار و اجاره داری:

بنیاد مسکن در راستای تنوع بخشی روش های افزایش دسترسی به مسکن جامعه هدف و به منظور **افزایش دربرگیری طرح خانه** امید برای متقاضیانی (گروه های درآمدی ۱ تا ۴) که امکان تأمین آورده اولیه را ندارند.

نسبت به تدوین برنامه و دستورالعمل اجرایی مسکن استیجار در **۹ استان بصورت پایلوت** (خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و بوشهر) اقدام نموده است.

## مسکن استیجار (بسته مدیریت بازار اجاره مصوبه بیستمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴)

**ماده ۶:** به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادر تخصصی عمران شهرها جدید اجازه داده می‌شود؛ منابع داخلی، اراضی و املاک در اختیار و تحت تملک خود را در سقف بودجه مصوب، با واحدهای مسکونی تکمیل شده و **آماده عرضه به بازار** تهاتر و واحدهای مذکور را در قالب مسکن اجاره‌ای در اختیار زوج‌های جوان ازدواج اولی فاقد مسکن واجد شرایط قرار دهند. (تامین ۱۰۸۲۰ واحد)

**ماده ۸:** وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، و وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها و **بنیاد مسکن انقلاب اسلامی** نسبت به تدوین برنامه عملیاتی – اجرای **احداث ۷۵ هزار واحد مسکن استیجار (در طول مدت ۳ سال)** ویژه زوج‌ها جوان ازدواج اولی با اولویت خانوارهای تحت پوشش اقدام نماید. اولویت اجرای این برنامه کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور است.

## تفاهم نامه مسکن استیجار

### بسته سیاستی مسکن استیجار بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن و آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن

#### هدف:

ساخت ۶۰ هزار واحد مسکن استیجار طی ۳ سال  
(سالی ۲۰ هزار واحد)

#### تعهدات بنیاد مسکن

- ✓ تأمین زمین در روستاهای حریم شهر
- ✓ تأمین اعتبار به میزان ۳۰۰ میلیون بلاعوض برای هر واحد
- ✓ تدوین دستورالعمل اجرایی
- ✓ شناسایی متقاضیان جامعه هدف و اجاره‌داری
- ✓ مدیریت و راهبری ساخت مسکن استیجار

#### تعهدات سازمان ملی زمین و مسکن

- ✓ تأمین زمین برای ساخت مسکن استیجار بصورت غیرمتمرکز
- ✓ تأمین تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی
- ✓ واگذاری قطعی زمین پس از پایان دوران اجاره‌داری

تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه با سازمان ملی زمین  
مسکن مطابق با دستورالعمل اجرایی ماده ۸ بسته  
مسکن استیجار مصوبه بیستمین جلسه شورای عالی  
مسکن مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۴ به منظور تأمین زمین و  
منابع اعتباری جهت ساخت مسکن استیجار؛

# □ ساختار پیشنهادی مسکن استیجار در قالب چارچوب طرح خانه امید (تهیه چارچوب برنامه و اجرا به صورت پایلوت در ۸ استان)

## جامعه هدف (تقاضا)

کلیه خانوارهای فاقد مسکن ملکی و یا زمین با کاربری مسکونی در ۵ سال اخیر که جزء دهک درآمدی ۱ الی ۴ می‌باشند و ضمن سکونت حداقل ۵ سال در شهرستانی که واحد مسکونی استیجار واگذار می‌گردد، توسط کمیته اجرایی استان تأیید گردند.

با اولویت:

- ۱- زوج‌های جوانی که حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته باشد؛
- ۲- خانوارهای دارای سرپرست زن و بد سرپرست؛
- ۳- خانوارهای دارای عضو معلول و یا بیماری‌های خاص؛
- ۴- خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر؛
- ۵- خانواده شهدا و ایثارگران؛
- ۶- خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی.

واحد حقوقی بنیاد استان به عنوان کارگزار

مدت زمان اجاره حداکثر ۳ سال می‌باشد  
بدون تمدید و تکرار

### کمیته اجرایی

مدیر کل بنیاد مسکن استان (رئیس کمیته)، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان، معاون امور بازسازی و مسکن روستایی (دبیر کمیته)، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی، معاون توسعه و عمران روستایی، مدیر حراست، مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، مدیر شهرستان مرتبط با پروژه

### مبلغ اجاره:

دهک درآمدی ۱ و ۲ معادل ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز  
دهک درآمدی ۳ و ۴ معادل ۳۰ درصد قیمت کارشناسی روز

### هزینه کرد عواید:

- ۱- ۱۰ درصد خدمات مدیریت
- ۲- ۳۰ درصد هزینه تعمیر و نگهداری
- ۳- ۶۰ درصد به عنوان اعتبار نزد قرض الحسنه برای کمک در مرحله نخست و یا پس از اتمام ۳ سال به عنوان کمک ودیعه اجاره بازار آزاد و یا طرح ملکی خانه امید

## عرضه واحد مسکونی استیجار

### ساخت مسکن استیجار/اجاره داری (ماده ۸)

#### زمین

- ۱- زمین‌های مناسب در تفاهم‌نامه منعقد شده فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرای جدید به تشخیص کمیته اجرایی
- ۲- روستاهای واقع در حریم شهر
- ۳- زمین‌های واقع در بافت ناکارآمد مصوب شهرها که امکان مشارکت در ساخت توسط شرکت‌های تابعه و یا بنیاد استان با تأیید کمیته اجرایی
- ۴- اراضی در اختیار، شهرداری‌ها، نهادهای حمایتی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اراضی وقفی
- ۵- هبه زمین توسط خیرین

### منابع مالی

- ۱- پرداخت تا سقف مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض از محل اعتبارات دولتی و یا حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) برای هر واحد مسکونی؛
- ۲- پرداخت تا سقف مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از محل اعتبارات نزد بانک‌های عامل برای هر واحد مسکونی به خیرین؛
- ۳- استفاده از ظرفیت کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین؛
- ۴- استفاده از ظرفیت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از محل مسئولیت اجتماعی

### تأمین مسکن استیجار (ماده ۶)

- ۱- پنج درصد از واحدهای مسکن انتفاعی بنیاد ساخت شهری که از سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسیده است؛
- ۲- ظرفیت واحدهای مسکونی شرکت‌های بنیاد مسکن به عنوان سهم بدهی آن شرکت به حساب ۱۰۰
- ۳- ظرفیت هبه واحدهای مسکونی از سوی خیرین
- ۴- واحدهای مسکونی بنیاد ساخت روستایی فاقد متقاضی

\* سایر شیوه‌های جذب مشارکت در خصوص تأمین و یا احداث واحد استیجار به جز موارد ذکر شده در مفاد قبلی، با تصویب کمیته اجرایی استان و اخذ مجوز از بنیاد مرکز بلامانع می‌باشد



# □ وظایف معاونت بازسازی و مسکن روستایی



نهاد مسکن انقلاب اسلامی  
حساب ۱۰۰ نام  
دفتر مرکزی

بسمه تعالی

۱۴۰۵/۰۶/۱۴

۵/۰۵/۱۳۹۹

ندارد

جناب آقای سروری

مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

با سلام

احتراماً، در راستای اجرای طرح خانه امید و پیرو نامه شماره ۲۷۴۹۱/د مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷، با موضوع

مبالغ تخصیص یافته به پروژه‌های مسکن محرومین، به استحضار می‌رساند در این مرحله مبلغ ۱۸۳,۶۹۱

میلیون ریال از محل عواید حاصل از فروش زمین (موضوع نامه شماره ۲۹۸۴۰/د مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ مدیرکل

محترم امور مالی) بابت پروژه‌های انتقالی و ساخت جدید شهری، به آن استان اختصاص یافته است که

وضعیت مبالغ تخصیص یافته تا این تاریخ، برابر جدول ذیل می‌باشد.

| مجموع<br>(میلیون ریال) | عواید فروش<br>زمین | نیم درصد<br>سود بانک‌ها | موافقت نامه سال ۱۴۰۴ |         |
|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------|
|                        |                    |                         | حساب ۱۰۰             | ماده ۷۵ |
| ۳۳۳,۶۹۱                | ۱۸۳,۶۹۱            | ۰                       | ۵۰,۰۰۰               | ۱۰۰,۰۰۰ |

با توجه به نامه مدیرکل محترم امور مالی، مبنی بر عدم واریز مبلغ مربوطه (تمام/بخشی) توسط آن استان

به دفتر مرکزی، ضمن تأمین اعتبار مبلغ مذکور در استان، خواهشمند است دستور فرمایید مطابق

دستورالعمل اجرایی طرح تأمین مسکن محرومین سال ۱۴۰۵، ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۷۱۴/د مورخ

۱۴۰۵/۰۳/۲۷، با رعایت سرانه مجموع کمک‌ها برای هر نفر، نسبت به هزینه کرد مبالغ، ذیل سرفصل‌های

تعریف شده در سامانه بهسازی مسکن روستایی، از طریق تهیه صورت وضعیت الکترونیک، اقدام گردد.


سید رضا حمیدی  
مدیرکل مسکن روستایی

✓ استان‌هایی که مبلغ موجود در حساب مشترک آن‌ها در ارتباط با عواید حاصل از فروش زمین، کمتر از سهم تعیین شده توسط دفتر امور زمین معاونت توسعه و عمران روستایی می‌باشد، مقرر گردید عدد اعلامی مذکور در راستای طرح خانه امید آن استان هزینه و سند مالی آن به معاونت پشتیبانی ارائه شود.

✓ ۹۴ میلیارد تومان در مرحله نخست به استان‌ها واریزی شده است و با احتساب سهم استان خراسان رضوی مجموعاً ۱۰۸ میلیارد تومان از عایدی ناشی از فروش زمین در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.

✓ مانده اعتبار از ۱۷۷ میلیارد تومان (۶۹ میلیارد تومان) طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت پشتیبانی مقرر گردید استان‌ها اعتبار ناشی از این سرفصل را در طرح خانه امید استان هزینه نمایند.

# کل سهمیه، موجودی قابل برداشت و کمبود حساب هر استان (میلیون تومان)

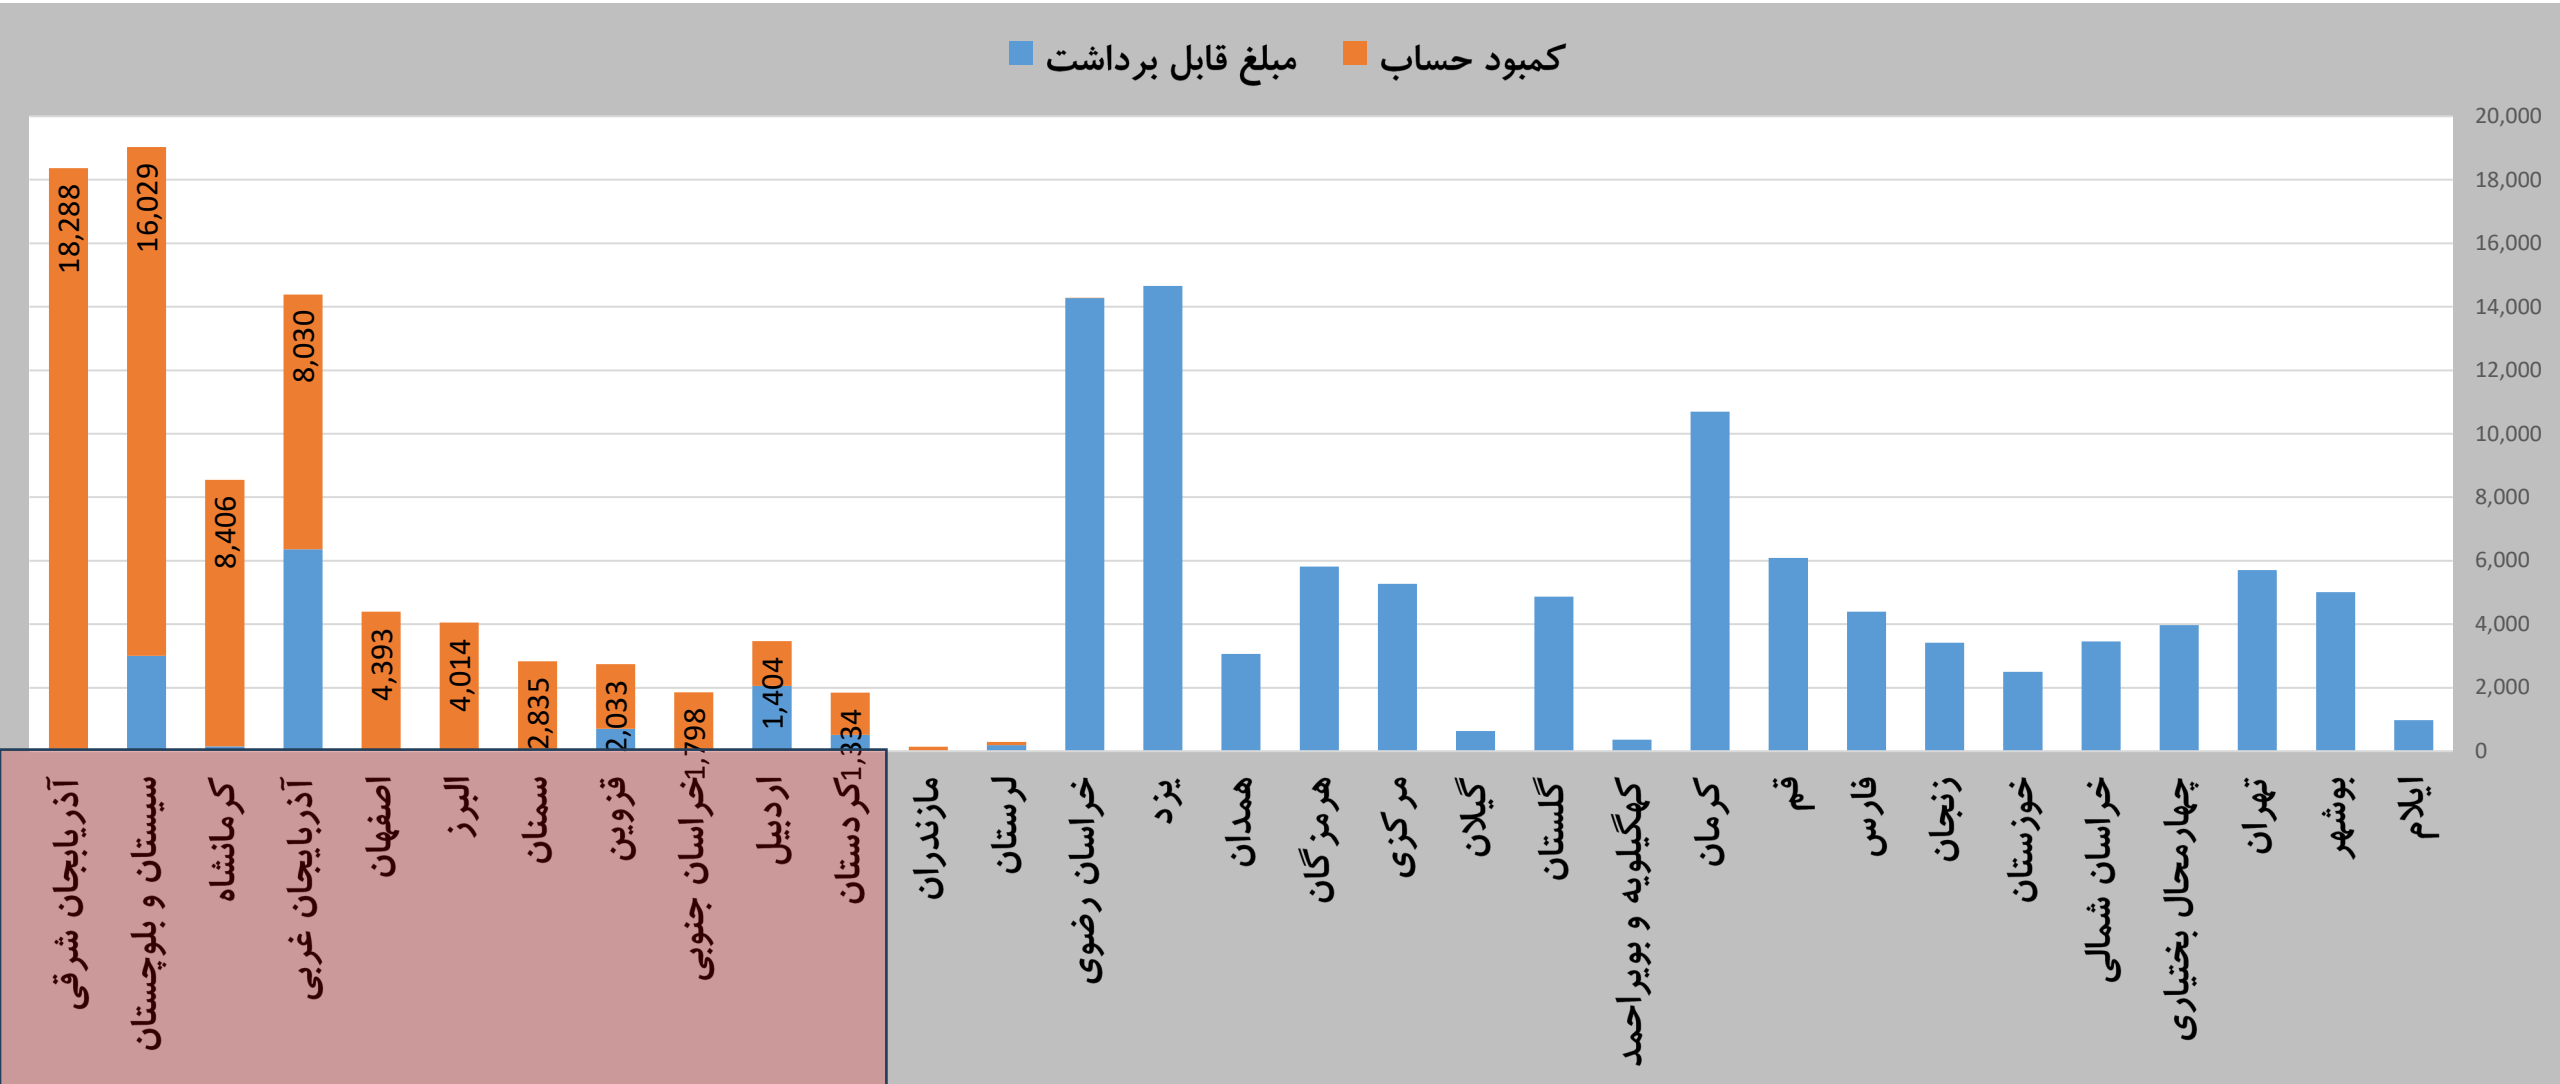

# برنامه تأمین و واگذاری زمین رایگان در طرح خانه امید

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |                              |                                     |                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| شناسایی<br>۵۲۶ قطعه زمین<br>برای ۲۸ هزار<br>واحد                                                                                                                                                                                                                                                        | صور تجلسه<br>تحويل<br>۲۶۵۰۰<br>واحد | قرارداد واگذار<br>ی<br>۲۰۰۰۰<br>واحد | دستور نقشه<br>۱۷۸۱۰<br>واحد  | پروانه<br>ساختمانی<br>۱۱۰۰۰<br>واحد | شروع عملیات<br>اجرای<br>۱۰۵۰۰<br>واحد | تفاهم نامه تأمین زمین برای<br>۵۰ هزار واحد مسکونی با سازمان<br>ملی زمین و مسکن       |
| شناسایی زمین<br>برای ۵۷۸۳ واحد مسکونی<br>در ۱۲ شهر جدید                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      | صورت جلسه تحويل<br>۱۵۳۴ واحد |                                     |                                       | تفاهم نامه تأمین زمین برای<br>۲۵ هزار واحد مسکونی با شرکت<br>عمران شهرهای جدید       |
| شناسایی<br>۳ هزار قطعه زمین                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                      |                              |                                     |                                       | تأمین زمین رایگان برای ۲۰ هزار<br>واحد مسکونی متعلق به بنیاد در<br>روستاهای حریم شهر |
| واگذاری حدود ۳۱ هزار قطعه به متقاضیان سرریز شهرها در سامانه تم                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                              |                                     |                                       | بارگذاری زمین برای ۳۳ هزار قطعه<br>زمین در سامانه سماع و تم                          |
| هبه زمین برای احداث حدود ۴ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۵                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |                              |                                     |                                       | اراضی هبه شده از سوی خیرین                                                           |
| اراضی در اختیار شهرداری ها (براساس وظیفه شهرداری ها در تأمین مسکن ماده ۵۵ قانون شهرداری ها) / اراضی متعلق به کارخانجات و صنایع<br>بزرگ / اراضی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام) / اراضی منابع ملی که توسط شورای<br>مسکن استان ها شناسایی و تخصیص می یابد. |                                     |                                      |                              |                                     |                                       |                                                                                      |

شناسایی و تخصیص زمین برای : ۵۰ هزار واحد مسکونی

برنامه تأمین زمین: ۱۲۸ هزار قطعه زمین مسکونی

## □ وظایف معاونت توسعه و عمران روستایی

✓ به منظور تأمین زمین در **شهرهای فاقد اراضی تا سقف سهمیه ۲۰ هزار قطعه** برای طرح خانه امید، استان‌های فاقد اراضی مناسب می‌توانند از ظرفیت «دستورالعمل اجرایی واگذاری اراضی روستایی» ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی به شماره ۴۰۸۵۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ به منظور شناسایی و امکان‌سنجی الحاق اراضی جدید اقدام نمایند.

✓ معاونت توسعه و عمران روستایی در جلسات آتی نسبت به ارائه **گزارش از میزان اراضی واگذار شده** در راستای صورتجلسه واگذاری زمین در روستاهای حریم شهر و نیز برنامه و عملکرد واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله، ماده ۴، جوانی جمعیت و مسکن معیشت-محور اقدام نماید.


| عملکرد واگذاری ۲۰ هزار قطعه زمین در روستاهای حریم شهر |        |         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| برنامه                                                | عملکرد | تحقق    |
| ۲۰۰۰۰                                                 | ۲۹۹۱   | ۱۵ درصد |

| عملکرد واگذاری ۳۲۷۰۴ قطعه زمین اراضی ۹۹ ساله، ماده ۴، جوانی جمعیت در سامانه تم و سماع |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| برنامه                                                                                | عملکرد | تحقق    |
| ۳۲۷۰۴                                                                                 | ۳۰۷۶۴  | ۹۴ درصد |

# □ وظایف معاونت توسعه و عمران روستایی

برنامه عملکرد

کل سهمیه: ۳۲۷۰۴ قطعه  
تعداد قطعه واگذار شده به متقاضیان: ۳۰۷۶۴ قطعه زمین (۱۰۰۸۹ سرفصل اراضی ۹۹ ساله، ۱۲۴۷۳ ماده ۴ و ۸۲۰۲ واحد جوانی جمعیت)  
تحقق: ۹۴ درصد

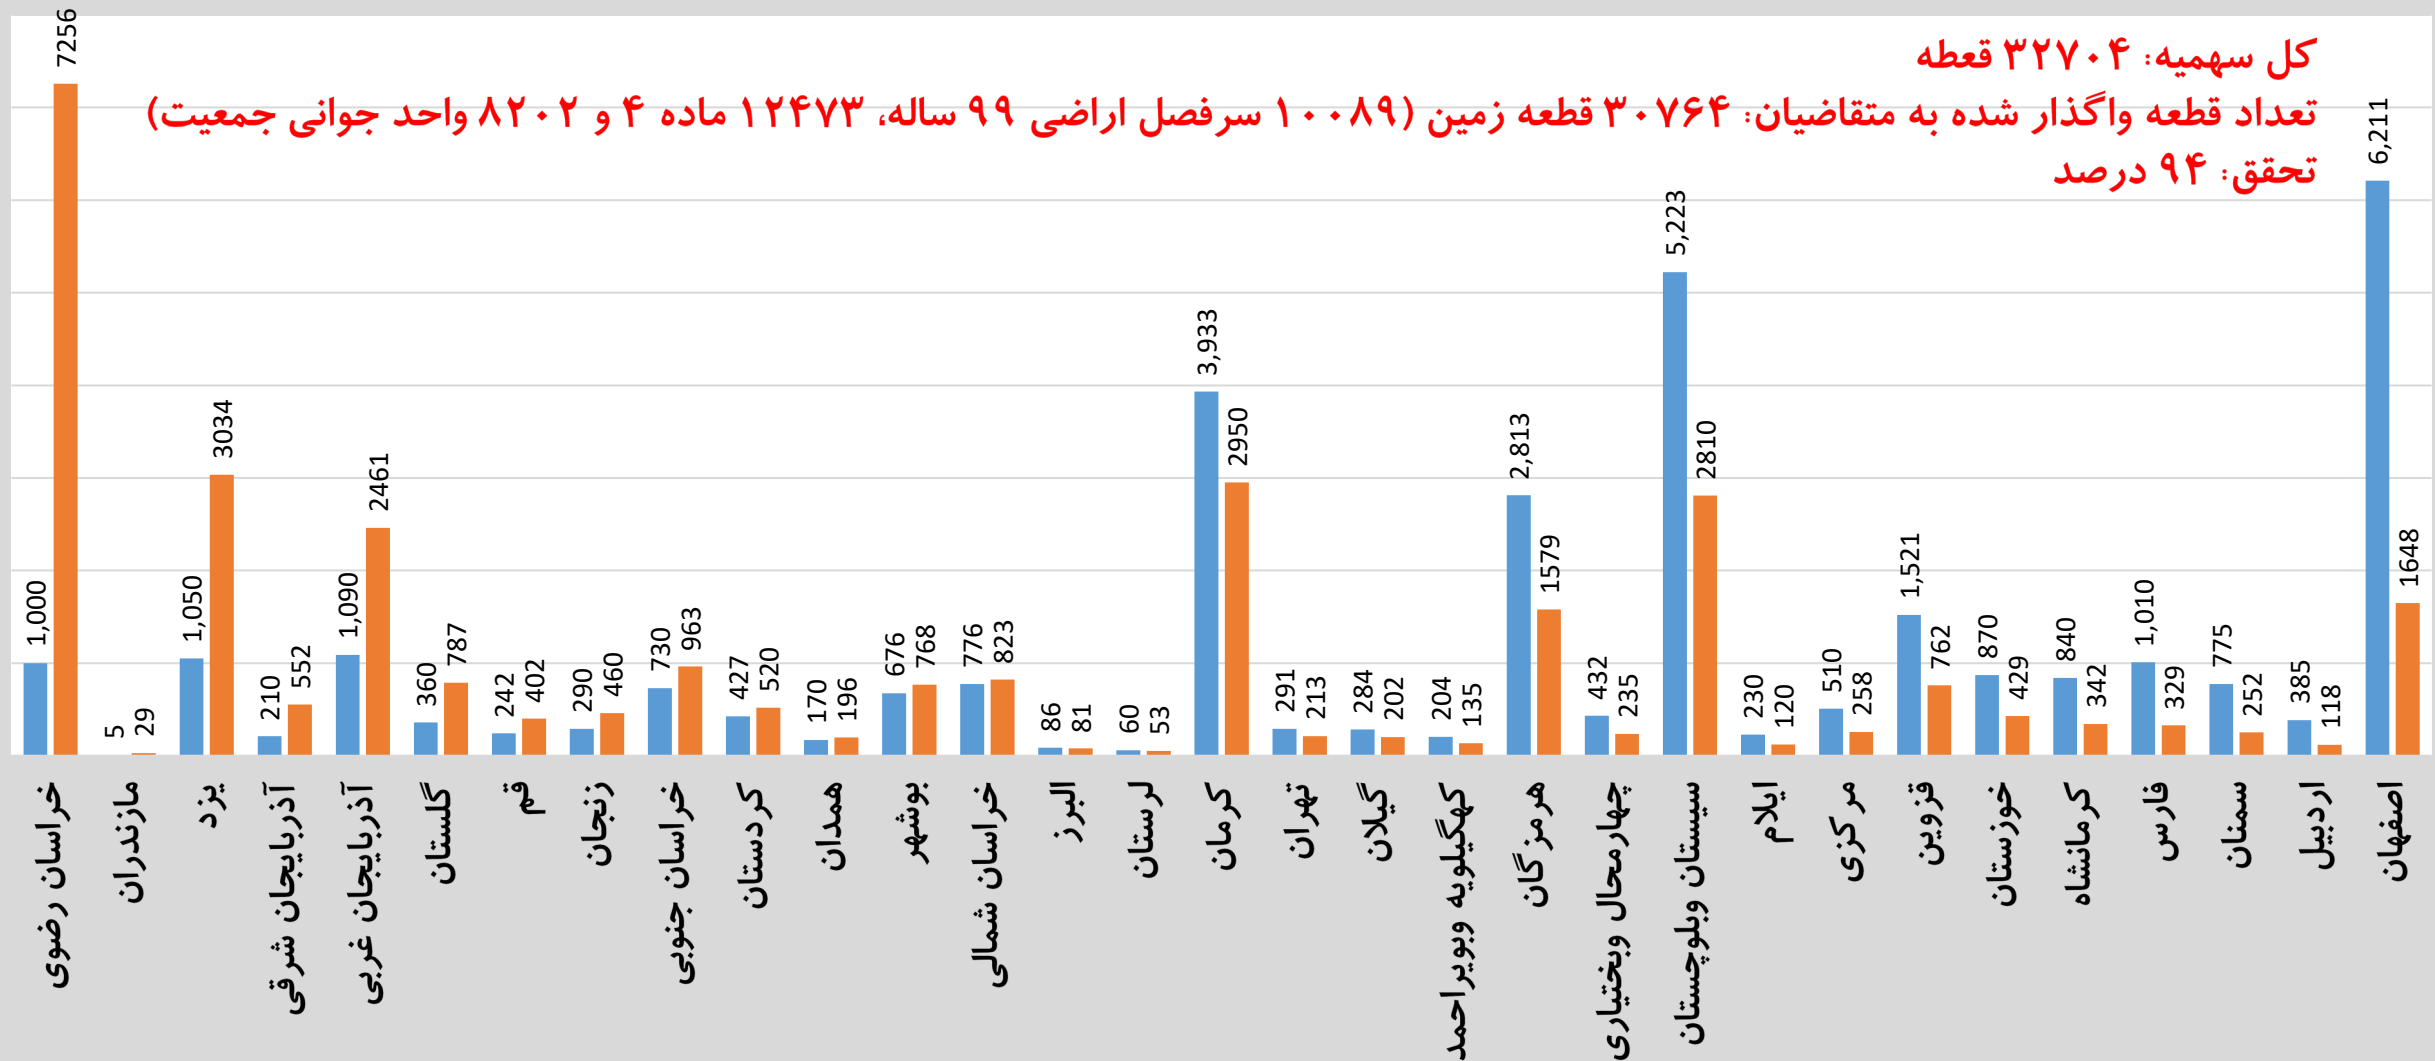


درصد  
تحقق

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ۷۲۶٪ | ۵۸۰٪ | ۲۸۹٪ | ۲۶۳٪ | ۲۲۶٪ | ۲۱۹٪ | ۱۶۶٪ | ۱۵۹٪ | ۱۳۲٪ | ۱۲۲٪ | ۱۱۵٪ | ۱۱۴٪ | ۱۰۶٪ | ۹۴٪ | ۸۸٪ | ۷۵٪ | ۷۳٪ | ۷۱٪ | ۶۶٪ | ۵۶٪ | ۵۴٪ | ۵۴٪ | ۵۲٪ | ۵۱٪ | ۵۰٪ | ۴۹٪ | ۴۱٪ | ۳۳٪ | ۳۳٪ | ۳۱٪ | ۲۷٪ |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

# □ وظایف معاونت توسعه و عمران روستایی

تعداد قطعه واگذار شده به معاونت بازسازی سهمیه

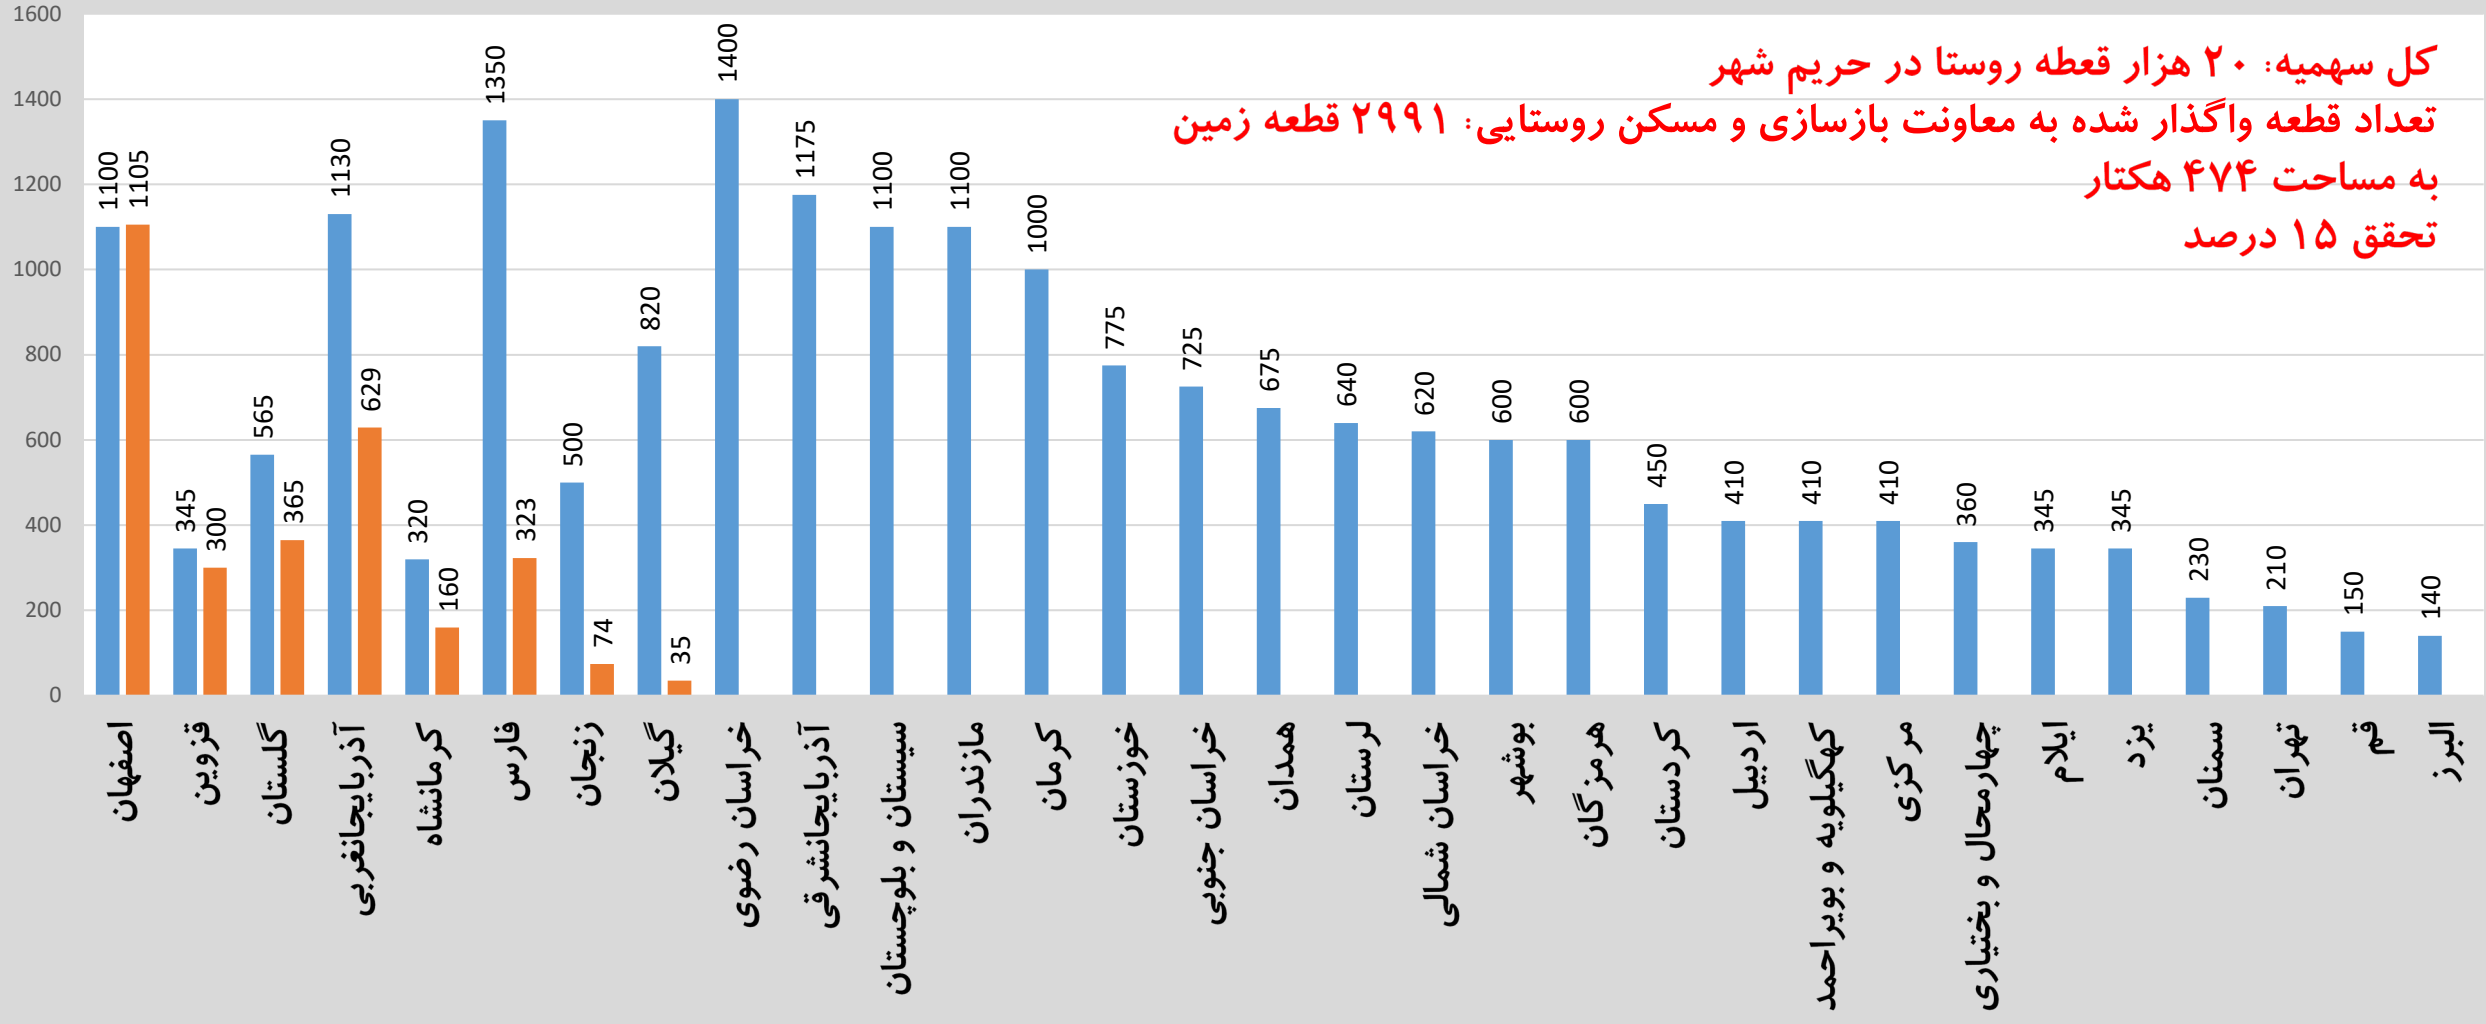

# برنامه تأمین منابع مالی در طرح خانه امید- سال ۱۴۰۵ (احداث ۱۵۵ هزار واحد روستایی - ۶۵ هزار واحد شهری)

## لیست منابع مالی

جمع کل :

۲۳۴  
همت

|                                                                                           |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| تسهیلات ساخت قرص الحسنه ۲۰ ساله ۵۰۰ میلیون تومانی : از ۱۱۰ همت تسهیلات مصوب سال ۱۴۰۴      | ۸۹   | همت           |
| کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام بنیاد مسکن                                           | ۳۹۴۸ | میلیارد تومان |
| نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی)                                                    | ۳۹۳۸ | میلیارد تومان |
| اعتبارات دولتی - ملی                                                                      | ۲۰۴۶ | میلیارد تومان |
| اعتبارات دولتی - استانی (اعتبارات در اختیار نمایندگان) توازن ۱، توازن ۲ و ۳٪ اعتبارات نفت | ۸۶۴  | میلیارد تومان |
| نیم درصد سهم سود بانک                                                                     | ۵۰   | میلیارد تومان |
| کمک خیرین (نقدی - غیر نقدی)                                                               | ۵۲۶  | میلیارد تومان |
| کمک مسئولیت های اجتماعی (نقدی - غیر نقدی) / بند خ ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه               | ۱۱۲۶ | میلیارد تومان |
| واگذاری اراضی ۹۹ ساله                                                                     | ۳۸   | همت           |
| تخفیفات خدمات نظام مهندسی (طراحی و نظارت) و هزینه صدور پروانه                             | ۶    | همت           |
| عواید حاصل از فروش زمین                                                                   | ۱۷۷  | میلیارد تومان |
| هزینه آماده سازی (بستر سازی)                                                              | ۲۰   | همت           |
| عواید حاصل از تخصیص قیر یارانه دار                                                        | ۳۰۰  | میلیارد تومان |
| آورده متقاضی                                                                              | ۶۹   | همت           |

# برنامه تأمین منابع مالی در طرح خانه امید- سال ۱۴۰۵ (گردش حساب ۱۰۰ امام (ره) و یارانه واحدهای طرح خانه امید)

## لیست منابع مالی :

|                                                                                           |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام بنیاد مسکن                                           | ۳۹۴۸ | میلیارد تومان |
| نهادهای حمایتی (کمیتة امداد و بهزیستی)                                                    | ۳۹۳۸ | میلیارد تومان |
| اعتبارات دولتی - ملی                                                                      | ۲۰۴۶ | میلیارد تومان |
| اعتبارات دولتی - استانی (اعتبارات در اختیار نمایندگان) توازن ۱، توازن ۲ و ۳٪ اعتبارات نفت | ۸۶۴  | میلیارد تومان |
| کمک خیرین (نقدی - غیر نقدی)                                                               | ۵۲۶  | میلیارد تومان |
| کمک مسئولیت های اجتماعی (نقدی - غیر نقدی) / بند خ ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه               | ۱۱۲۶ | میلیارد تومان |
| واگذاری اراضی ۹۹ ساله                                                                     | ۳۸   | همت           |
| عواید حاصل از فروش زمین                                                                   | ۱۷۷  | میلیارد تومان |
| هزینه آماده سازی (بستر سازی)                                                              | ۲۰   | همت           |
| عواید حاصل از تخصیص قیر یارانه دار                                                        | ۳۰۰  | میلیارد تومان |
| تخفیفات خدمات نظام مهندسی (طراحی و نظارت) و هزینه صدور پروانه                             | ۶    | همت           |
| جمع کل                                                                                    | ۷۷   | همت           |



## □ وظایف معاونت برنامه‌ریزی

□ ارائه گزارش در خصوص چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین به منظور کاهش هزینه و زمان ساخت مسکن محرومین، با هماهنگی موسسه سوانح طبیعی (براساس بند ۲ پنجمین جلسه ستاد هماهنگی مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۷ در مهلت ۴۵ روزه؛

□ ارائه گزارش از میزان اعتبارات مصوب، ابلاغی و تخصیص‌یافته از محل موافقتنامه‌های مبادله شده استانی (توازن ۱ و ۲، سه درصد نفت و گاز)

## □ وظایف معاونت برنامه ریزی

| اعتبارات دولتی – استانی (میلیارد تومان) |                          |      |       |
|-----------------------------------------|--------------------------|------|-------|
| برنامه تا پایان سال                     | برنامه تا پایان آذر ۱۴۰۵ | مصوب | تخصیص |
| ۸۶۴                                     | ۲۵۹                      | ۱۲۳  | ۰     |


| اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ / مالیات های نشانه دار (میلیارد تومان) |                          |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|
| برنامه تا پایان سال                                                        | برنامه تا پایان آذر ۱۴۰۵ | مصوب | تخصیص |
| ۱۱۲۶                                                                       | ۴۵۰                      | ۸۰۸  | ۲۰۰   |

| مجموع (میلیارد تومان) |                          |      |       |
|-----------------------|--------------------------|------|-------|
| برنامه تا پایان سال   | برنامه تا پایان آذر ۱۴۰۵ | مصوب | تخصیص |
| ۱۹۹۰                  | ۷۰۹                      | ۹۳۱  | ۲۰۰   |

## □ وظایف معاونت برنامه‌ریزی

مجموع اعتبار تحقق یافته: ۱۲۳ میلیارد تومان موافقتنامه‌های مبادله شده استانی (توازن ۱ و ۲ و سه درصد نفت و گاز)


عملکرد تخصیص اعتبار: صفر

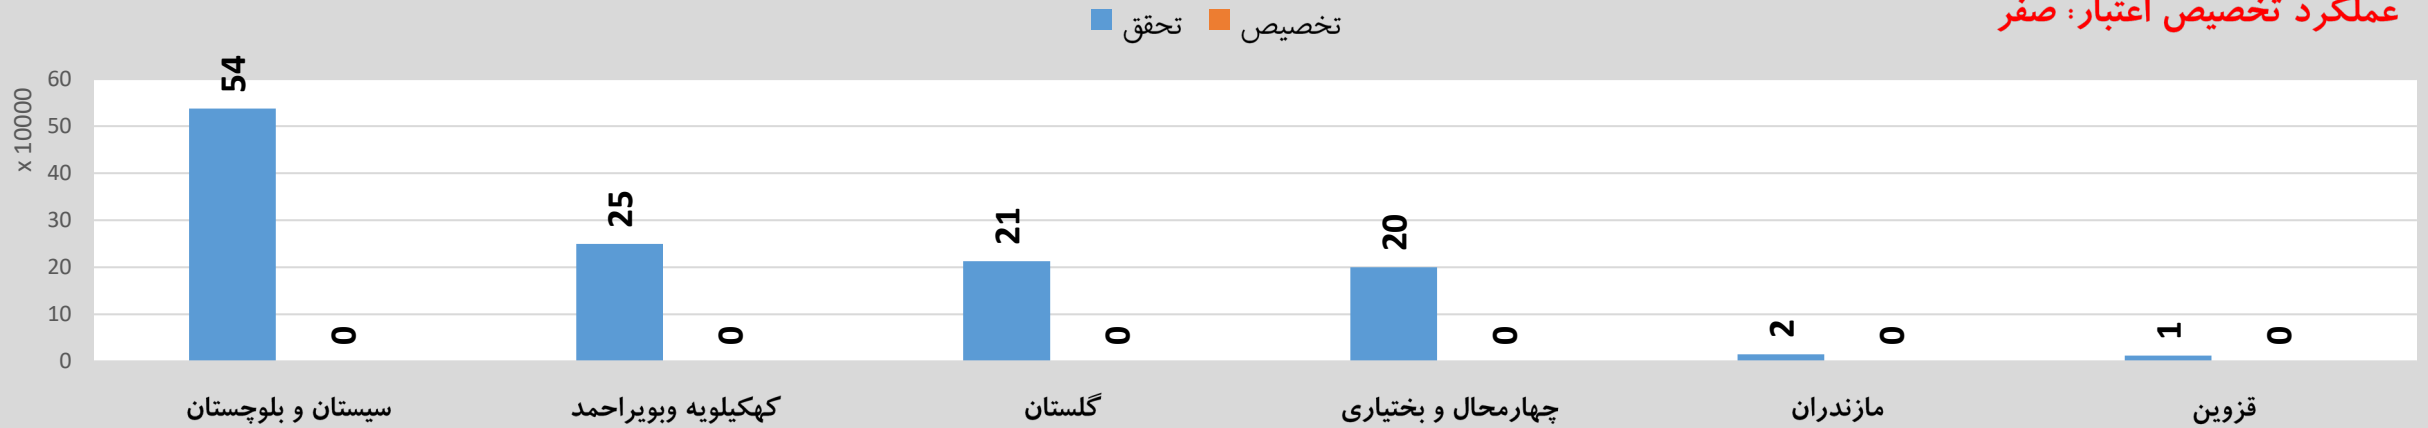

### مسئولیت اجتماعی / مالیات‌های نشانه‌دار

مجموع اعتبار تحقق یافته: ۸۰۸ میلیارد تومان

عملکرد تخصیص اعتبار: ۲۰۰ میلیارد تومان

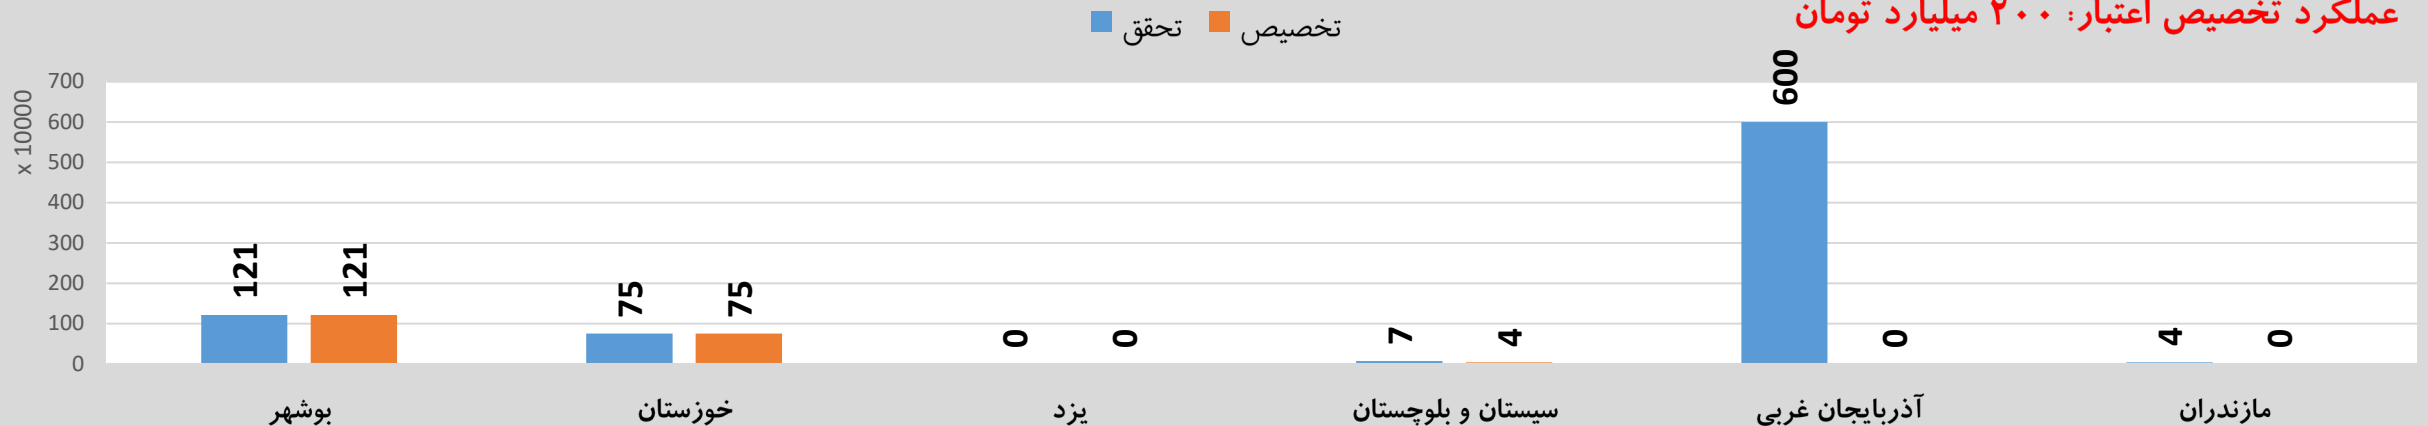

# □ وظایف معاونت امور پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی

بسمه تعالی



جناب آقای مهندس فلاحی

معاون محترم پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی

با سلام

احتراماً؛ پیرو بند (۸) ششمین و بند (۵) هفتمین صورتجلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید، خواهشمند است دستور فرمائید در مرحله اول نسبت به تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال امتیاز تسهیلات قرض الحسنه بانک مهر ایران با سقف فردی تا ۱۵۰۰ میلیون ریال، با دوران بازپرداخت ۳۶ ماهه به دفتر مسکن روستایی، اقدام نمایند.

لیست اسامی متقاضیان واجد شرایط پس از کنترل در سامانه بهسازی مسکن روستایی، بصورت وب سرویس به بانک عامل ارسال و نتیجه انعقاد و پرداخت وجه، به معاونت پشتیبانی گزارش می گردد.

مجید جودی  
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی

✓ میزان اعتبار قابل انتقال از محل تسهیلات قرض الحسنه به معاونت بازسازی و مسکن روستایی، با اولویت تکمیل واحدهای نیمه تمام سنوات گذشته

## □ وظایف معاونت امور پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی

| میزان (میلیارد تومان)    | سرفصل اعتبار                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $177 = 108 + 69$         | نیم درصد عواید حاصل از فروش زمین                                      |
| ۳۰۰                      | عواید حاصل از تخصیص قیر یارانه‌دار                                    |
| ۱۰۶۸                     | سهم حساب ۱۰۰ از درآمدهای سال ۱۴۰۴ شرکتهای تابعه                       |
| $321 = 4,8 + 23 + 293,2$ | معادل یک برابر آورده نقدی خیرین                                       |
| $63,2 = 20,2 + 43$       | مانده تفاهم‌نامه‌های سازمان برنامه<br>مجموع<br>۱۲۰ میلیارد            |
| ۵۶,۸                     |                                                                       |
| ۳,۳                      | نیم درصد حاصل از سود بانک‌ها                                          |
| ۱۲۰                      | باقیمانده موافقتنامه روستایی سال ۱۴۰۴ نزد پشتیبانی                    |
| $150 + 23$               | باقیمانده موافقتنامه شهری سال ۱۴۰۴ نزد شرکت سرمایه‌گذاری              |
| ۲۷ مصالح                 |                                                                       |
| ۳۶,۸                     | باقیمانده موافقتنامه روستایی سال ۱۴۰۴ نزد پشتیبانی انتقالی از ذیحسابی |
| ۲۲۹۶,۱                   | مجموع                                                                 |


رنگ سبز: اعتبارات پرداخت شده  
 رنگ آبی: اعتبارات در انتظار پرداخت  
 رنگ قرمز: اعتبارات پرداخت نشده

## □ وظایف معاونت امور پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی


مبالغ به میلیارد تومان

| ماه    | پیشرفت فیزیکی طرح<br>(تعداد واحد شهری غیر<br>تحت پوشش) | درصد<br>پیشرفت<br>فیزیکی طرح | درصد پیشرفت<br>تجمعی فیزیکی<br>طرح | درصد<br>جذب | برنامه تجمعی<br>کل اعتبار مورد<br>نیاز | برنامه اعتبار<br>مورد نیاز | برنامه تجمعی اعتبار<br>مورد نیاز از محل<br>حساب ۱۰۰ | تخصیص اعتبار<br>توسط معاونت<br>پشتیبانی | تخصیص تجمعی<br>اعتبار توسط معاونت<br>پشتیبانی |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| خرداد  | ۹۱۴                                                    | %۲                           | %۲                                 | %۴          | ۹۳۸                                    | ۹۲                         | ۹۲                                                  | ۰                                       | ۰                                             |
| تیر    | ۲۷۴۱                                                   | %۶                           | %۸                                 | %۱۲         | ۳،۷۵۱                                  | ۲۷۶                        | ۳۶۷                                                 | ۱۵۶،۸                                   | ۱۵۷                                           |
| مرداد  | ۲۷۴۱                                                   | %۶                           | %۱۴                                | %۱۲         | ۶،۵۶۴                                  | ۲۷۶                        | ۶۴۳                                                 | ۲۴۰،۲                                   | ۳۹۷                                           |
| شهریور | ۲۷۴۱                                                   | %۶                           | %۲۰                                | %۱۲         | ۹،۳۷۶                                  | ۲۷۶                        | ۹۱۸                                                 | ۱۶۲                                     | ۵۵۹                                           |
| مهر    | ۲۷۴۱                                                   | %۶                           | %۲۶                                | %۱۲         | ۱۲،۱۸۹                                 | ۲۷۶                        | ۱،۱۹۴                                               |                                         |                                               |
| آبان   | ۲۷۴۱                                                   | %۶                           | %۳۲                                | %۱۲         | ۱۵،۰۰۲                                 | ۲۷۶                        | ۱،۴۷۰                                               |                                         |                                               |
| آذر    | ۲۷۴۱                                                   | %۶                           | %۳۸                                | %۱۲         | ۱۷،۸۱۵                                 | ۲۷۶                        | ۱،۷۴۵                                               |                                         |                                               |
| دی     | ۱۸۲۷                                                   | %۴                           | %۴۲                                | %۸          | ۱۹،۶۹۱                                 | ۱۸۴                        | ۱،۹۲۹                                               |                                         |                                               |
| بهمن   | ۱۸۲۷                                                   | %۴                           | %۴۶                                | %۸          | ۲۱،۵۶۶                                 | ۱۸۴                        | ۲،۱۱۲                                               |                                         |                                               |
| اسفند  | ۱۸۲۷                                                   | %۴                           | %۵۰                                | %۸          | ۲۳،۴۴۱                                 | ۱۸۴                        | ۲،۲۹۶                                               |                                         |                                               |
| مجموع  | ۲۲۸۴۰                                                  |                              |                                    | %۱۰۰        | -                                      | ۲۲۹۶                       | -                                                   | ۵۵۹                                     | -                                             |

## برنامه زمانبندی کل اعتبارات مورد نیاز

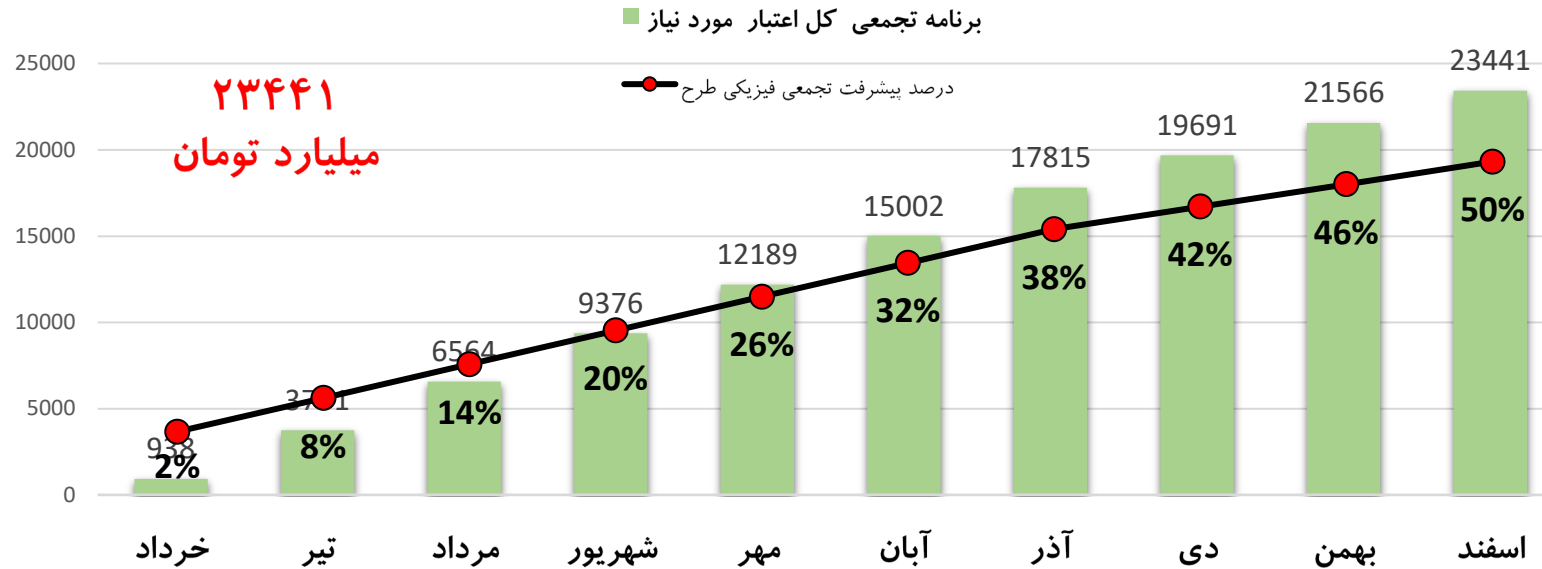

## برنامه زمانبندی منابع مالی مورد نیاز از محل حساب ۱۰۰ و تخصیص

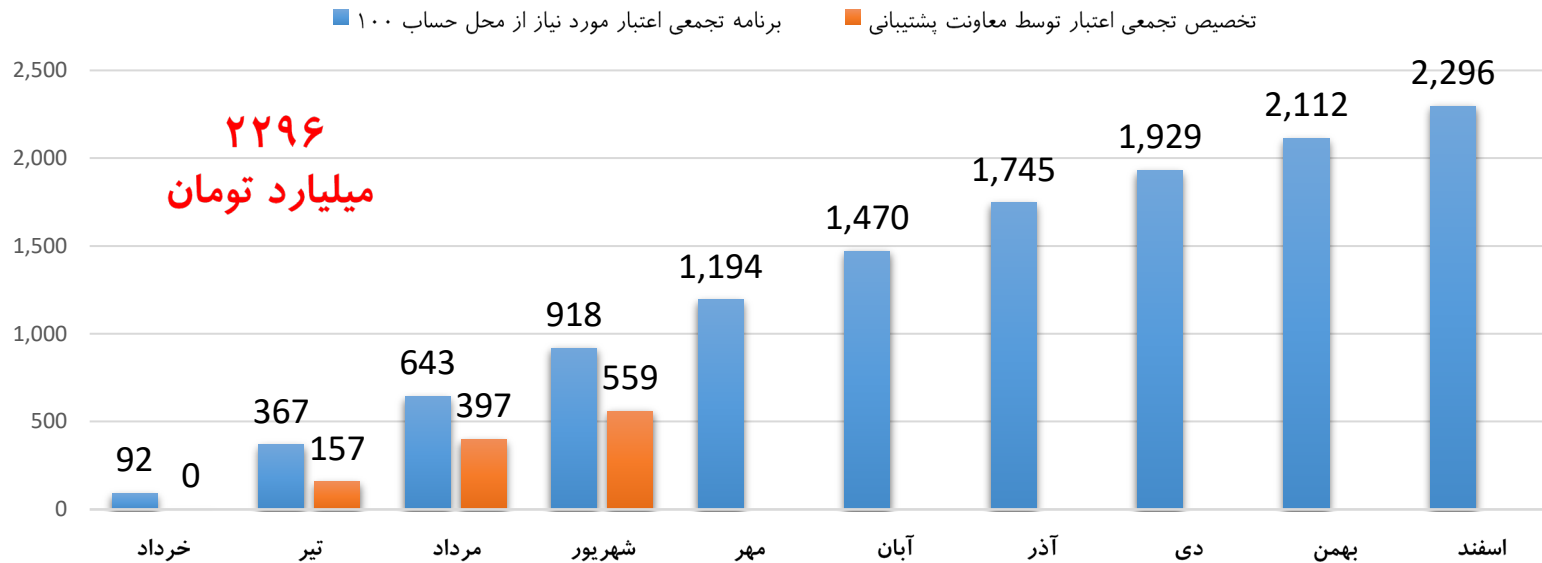

## □ وظایف دفتر امور شرکتها و مجامع

✓ تهیه جدول سهم هر یک از شرکتها در خصوص سهم بدهی شرکت‌های تابعه به حساب ۱۰۰ حضرت امام در بودجه سال ۱۴۰۵ بنیاد و برگزاری جلسه بررسی عملکرد شرکت‌ها به منظور تصمیم‌گیری در خصوص امکان تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه سهم حساب ۱۰۰ حضرت امام (۱۰۶۹ میلیارد تومان)



## □ وظایف دفتر امور شرکتها و مجامع


✓ پیگیری ایجاد حساب یکپارچه در بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور استفاده از **۲۰ درصد**

**سرجمع امتیاز اعتبارات** تسهیلات نزد بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت

✓ پیگیری استفاده از **ظرفیت مالیات شرکتهای تابعه** برای طرح خانه امید اقدام و اعلام میزان

ظرفیت قابل استفاده؛

## گردش کار استفاده از ظرفیت شرکت‌های تابعه

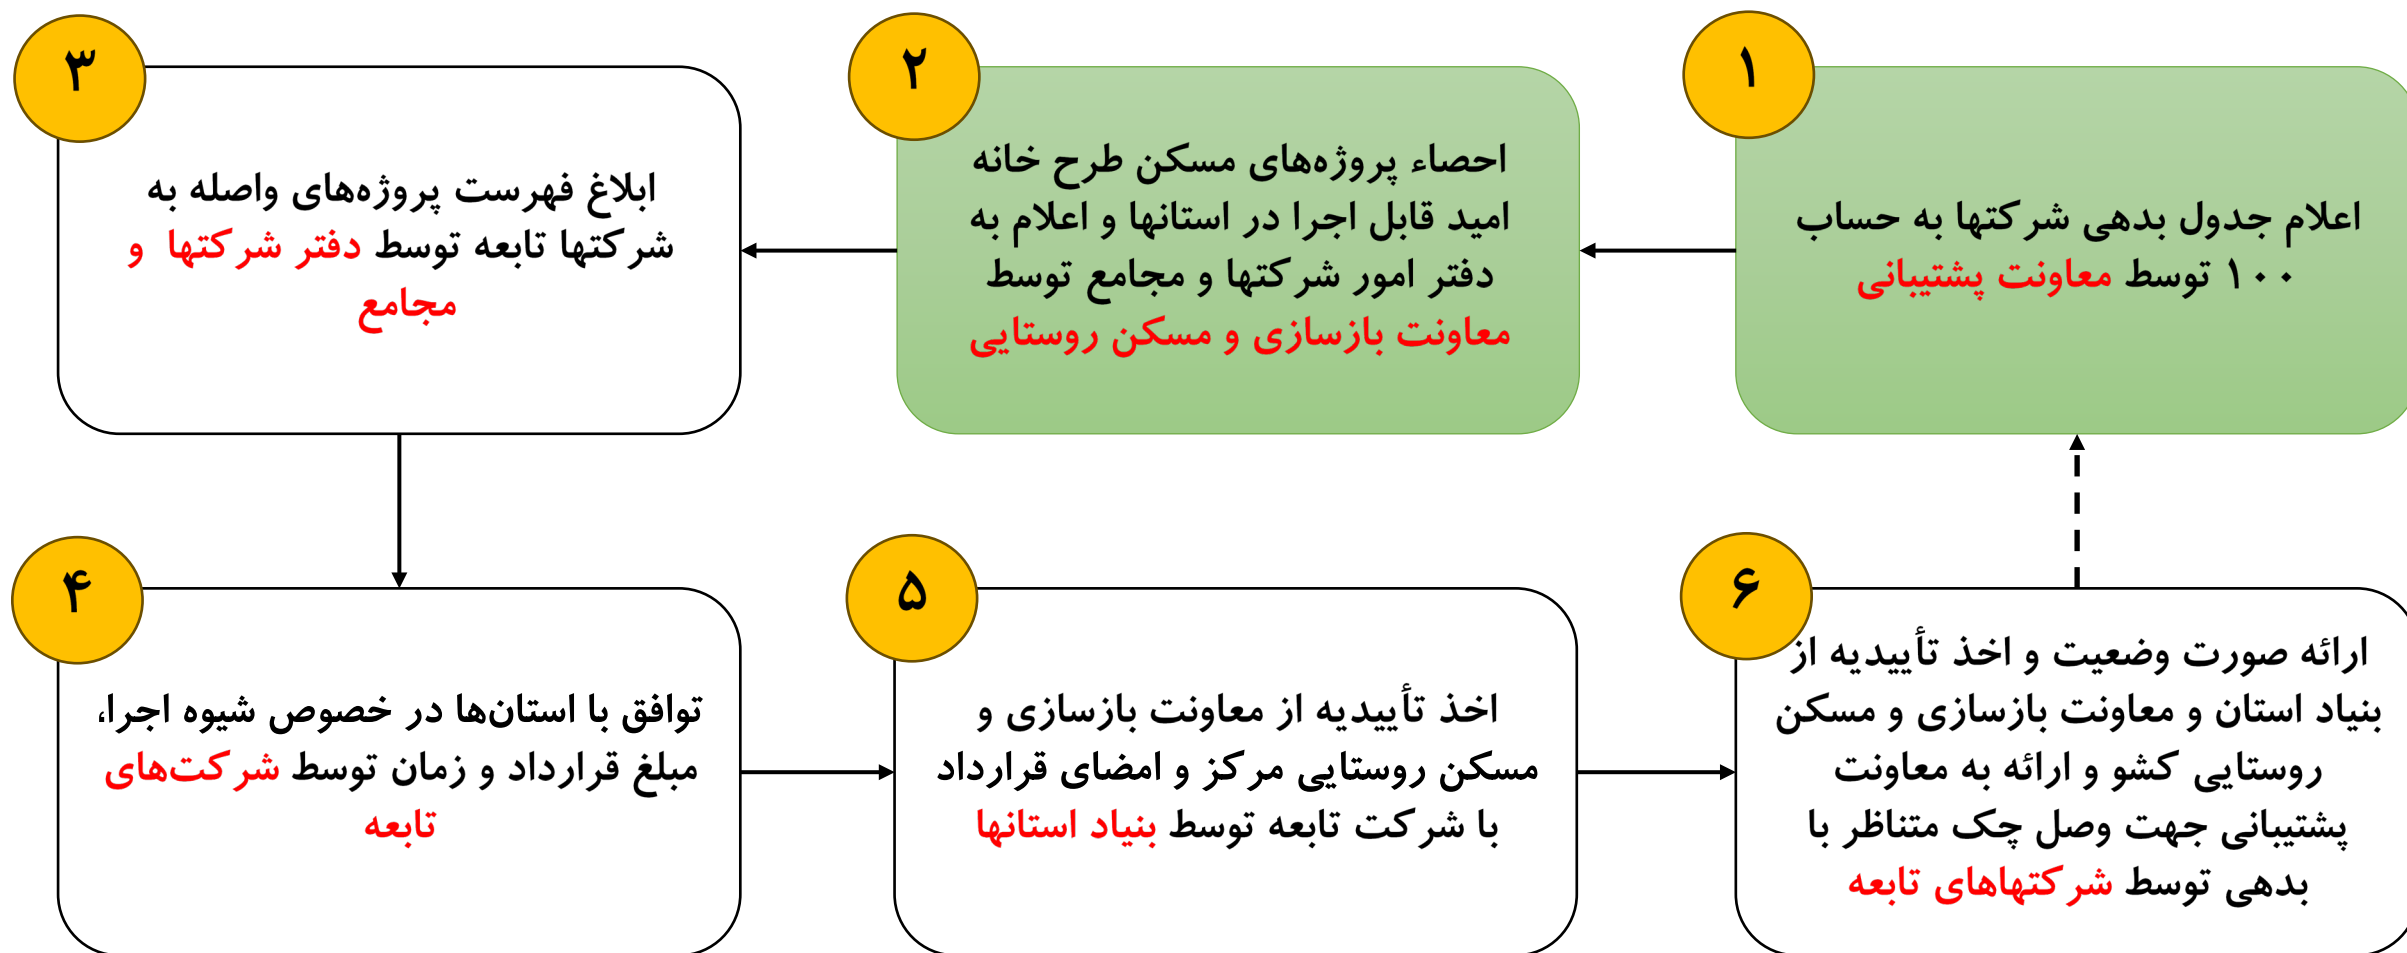



"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"

جناب آقای ساقیان  
مدیرکل محترم امور مجامع و شرکتها

با سلام


احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۲۱۷۵/د مورخ ۱۴۰۵/۵/۴ در خصوص چارچوب اجرای استفاده از ظرفیت شرکت‌های تابعه بنیاد مسکن و نامه شماره ۳۰۱۱۵/۵۹۱۰۰/۰۵/د مورخ ۱۴۰۵/۶/۹ در ارتباط با چارچوب اجرایی استفاده از ظرفیت هلدینگ «نوسازی و عمران تهران» در طرح خانه امید، به پیوست لیست پروژه‌های اعلامی از سوی استان‌ها به حضور ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به معرفی پروژه‌های مذکور به شرکت‌های تابعه جهت هماهنگی با استان‌ها مطابق با چارچوب‌های ابلاغ شده اقدامات لازم صورت پذیرد.

مجید جودی  
معاون بازسازی و مسکن روستایی

## وظایف معاونت بازسازی و مسکن روستایی

| ردیف   | نام استان           | تعداد پروژه | تعداد واحد |
|--------|---------------------|-------------|------------|
| ۱      | آذربایجان شرقی      | ۱۰          | ۱۱۳۱       |
| ۲      | اردبیل              | ۱           | ۴۰         |
| ۳      | اصفهان              | ۳           | ۵۷         |
| ۴      | ایلام               | ۲           | ۹۴         |
| ۵      | خراسان رضوی         | ۳           | ۳۳۸        |
| ۶      | خراسان شمالی        | ۲           | ۴۷۰        |
| ۷      | خوزستان             | ۲           | ۲۶۸        |
| ۸      | سمنان               | ۱           | ۶۶         |
| ۹      | سیستان و بلوچستان   | ۶           | ۲۴۰        |
| ۱۰     | قزوین               | ۷           | ۳۸۵        |
| ۱۱     | کهگیلویه و بویراحمد | ۱           | ۶۴         |
| ۱۲     | لرستان              | ۱           | ۱۶۰        |
| ۱۳     | مرکزی               | ۱           | ۴۸         |
| ۱۴     | یزد                 | ۷           | ۴۷۱        |
| جمع کل |                     | ۴۷          | ۳۸۳۲       |

تعداد واحد معرفی شده از سوی اسنان‌ها

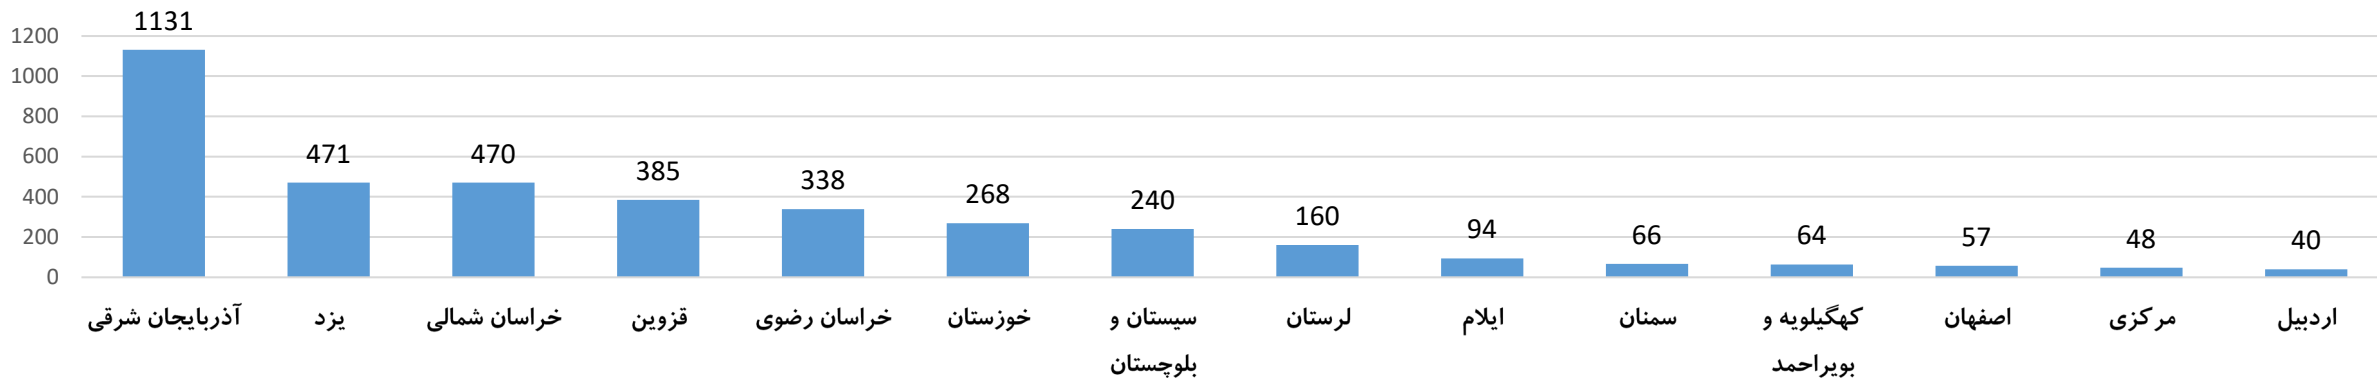

## □ وظایف هلدینگ عمران و نوسازی تهران

✓ به تعریف پروژه طرح خانه امید در **هشتگرد** متناسب با گردشکار تعریف شده با هماهنگی معاونت بازسازی و مسکن روستایی؛

✓ **مولدسازی اراضی فاقد توجیه** تعریف پروژه و ساخت مسکن در طرح خانه امید، به منظور تأمین منابع در طرح خانه امید

## □ وظایف هلدینگ عمران و نوسازی تهران

تفاهم شرکت **سامان محیط** با بنیاد استان **البرز** در خصوص اجرای اسکلت بتنی

پروژه **۱۰۹ واحدی** خانه امید شهرستان **نظرآباد** با مشخصات به شرح زیر:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| متراژ کل    | ۷۸۳۰ مترمربع     |
| تعداد بلوک  | ۴۹ بلوک ساختمانی |
| تعداد واحد  | ۱۰۹ واحد         |
| جمع کل قیمت | ۷۱۸ میلیارد ریال |

## ❑ دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰

✓ ارائه گزارش از **تعداد مجمع خیرین برگزار شده** در استان‌ها

✓ ارائه گزارش در خصوص **میزان اعتبار جذب** شده به تفکیک هر استان در قالب کمک‌های نقدی و غیرنقدی؛

✓ ارائه گزارش در خصوص **برگزاری همایش ملی** خیرین؛

✓ امکان استفاده از امتیاز و اعتبار تسهیلاتی خیرین نزد حساب **بانک رسالت** در طرح خانه امید، تحت عنوان طرح حامی رسالت و میزان اعتبار قابل استفاده؛



# دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰

## ✓ مانده مطالبات دفتر مشارکت های مردمی نزد پشتیبانی ۴۲۳ میلیارد ریال

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| واریزی نقدی خیرین به حساب ۱۰۰ | ۳۴۷ میلیارد ریال |
| واریزی به حساب استانها        | ۱۵۴ میلیارد ریال |
| مانده                         | ۱۹۳ میلیارد ریال |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| تعهد بنیاد مسکن در ازای کمک خیرین | ۲۷۸ میلیارد ریال |
| واریزی به حساب استانها            | ۴۸ میلیارد ریال  |
| مانده                             | ۲۳۰ میلیارد ریال |

جناب آقای علیرضا فلاحي نصراله آبادی  
معاون محترم پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی

موضوع : درخواست جهت تسویه وجوه بلاعوضی خیرین و سهم مرکز جهت متقاضیان در استان ها

سلام علیکم

به پیوست وضعیت جدول واریزی خیرین جهت کمک به تامین مسکن محرومین (خانه امید) به حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) جهت استحضار به حضور ارسال می گردد. با عنایت به ارائه برنامه زمان بندی به ستاد خانه امید، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت مساعدت های نقدی خیرین به مبلغ ۱۹۲.۷۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ( یکصد و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه ) ریال و تعهدات مرکز به مبلغ ۲۲۹.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ( دویست و بیست و نه میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون ) ریال و مجموع ۴۲۲.۵۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ( چهارصد و بیست و دو میلیارد و پانصد و بیست و شش میلیون ) ریال، اقدام لازم معمول و نتیجه به این دفتر ابلاغ گردد.

فرهاد خاکی پور  
مدیرکل دفتر  
مشارکت های مردمی حساب ۱۰۰

رونوشت :

جناب آقای مجید جودی معاون محترم بازسازی و مسکن روستایی جهت استحضار

۱۴۰۵/۰۶/۱۵

د/۰۵/۱۹۱۰۸/۳۱۵۱۸

دارد

بسمه تعالی

✓ ارائه گزارش از **تعداد اخبار انتشار** یافته جهت اطلاع رسانی و پخش کلیپ‌های تهیه شده در زمینه طرح خانه امید در رسانه‌های جمعی

✓ ارائه گزارش از **انعکاس اخبار انتشار یافته** و ضریب نفوذ اخبار طرح خانه امید در رسانه‌های جمعی



## ارزیابی فعالیت رسانه‌ای و میزان بازتاب طرح «خانه امید»

۱۸ مرداد تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵


### ❖ داشبورد مدیریتی طرح خانه امید

این جدول خلاصه‌ای از وضعیت رسانه‌ای طرح در بازه پایش است

| شاخص کلیدی                | مقدار ثبت شده       | وضعیت تحلیل                |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| کل محتوای تولیدی          | ۱۱۳۱ پست            | حجم فعالیت بالا            |
| مجموع بازدید ثبت شده      | ۹۴۲۹۲۶ بازدید       | دسترسی مطلوب               |
| تعداد لایک‌ها             | ۲۶۹۲۹ مورد          | تعامل متمرکز در اینستاگرام |
| رتبه موضوعی طرح خانه امید | اول (با ۶۲ تکرار)   | اولویت اول رسانه‌ای بنیاد  |
| بستر طلایی                | رویتکا (۶۷٪ بازدید) | کانال نفوذ اصلی            |

### ❖ نمودار توزیع بازدید

رویتکا بیشترین سهم از توجه مخاطب را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده موفقیت انتخاب بستر است.




## ❖ سهم بازدید به تفکیک بستر رسانه‌ای

سایر بسترها : ۷۸۴۹

تلگرام : ۸۱۷۲۳

ایتا : ۲۲۲۹۶۷

روبوکا : ۶۳۰۳۸۷



روبوکا | ۶۷٪ (۶۳۰,۳۸۷) بازدید

تلگرام | ۹٪ (۸۱,۷۲۳) بازدید

ایتا | ۲۳٪ (۲۲۲,۹۶۷) بازدید

سایر بسترها | ۱٪ (۷,۸۴۹) بازدید

❖ تثبیت خانه امید به عنوان اولویت اول

با توجه به جدول زیر روابط عمومی به طور هدفمند منابع را بر روی این طرح متمرکز کرده است بطوریکه با مجموع ۶۲ تکرار، این طرح تقریباً ۲ برابر بیشتر از نهضت ملی مسکن در کانون توجهات روابط عمومی قرار داشته است.

| ردیف                                   | اولویت رسانه‌ای | تعداد تکرار | وضعیت تمرکز روابط عمومی |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| طرح خانه امید (با احتساب عناوین مرتبط) | ۱               | ۶۲          | اولویت نخست             |
| نهضت ملی مسکن                          | ۲               | ۳۲          | اولویت دوم              |
| طرح هادی                               | ۳               | ۲۷          | اولویت سوم              |

❖ نمودار تحلیلی: وضعیت فعلی در مقابل هدف‌گذاری

به عنوان نقشه راه آینده، می‌بایست از تولید انبوه خبر به سمت روایت‌های انسانی حرکت کنیم

نقشه راه تحول رسانه‌ای طرح خانه امید

