بسمه‌تعالی

سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲

- نخستین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
- دومین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
- سومین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
- چهارمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
- پنجمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
- ششمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳
- هفتمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
- هشتمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
- نهمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۹
- دهمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
- یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۴
- دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
شماره: ۱۴۰۵/۵۹۱۰۱/۵۸۱۶۲/د
پیوست: دارد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حساب ۱۰۰ امام
دفتر مرکزی

"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"

جناب آقای خواجه دلوئی
رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
جناب آقای فلاحی
معاون محترم پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی
جناب آقای بلدی
معاون محترم توسعه و عمران روستایی
جناب آقای رحمانی خلیلی
معاون محترم برنامه ریزی
جناب آقای هدایت
معاون محترم مسکن و عمران شهری
جناب آقای سیروس
دستیار ویژه و مدیرکل محترم حوزه نماینده ولی فقیه
جناب آقای دربندی
مدیرکل محترم حوزه ریاست
جناب آقای سلطانی نژاد
مدیرکل محترم نظارت راهبردی و مدیریت عملکرد
جناب آقای ساقیان
مدیرکل محترم امور مجامع و شرکت‌ها
جناب آقای خاکی پور
مدیر کل محترم دفتر مشارکت های مردمی حساب ۱۰۰
جناب آقای افتخار
مدیرکل محترم دفتر تامین سرمایه و امور بین الملل
جناب آقای خلجی
مدیرکل محترم دفتر برنامه، بودجه و تامین سرمایه

جناب آقای حیدری ابیانه
مدیرعامل محترم شرکت نوسازی و عمران تهران

سلام علیکم

احتراماً پیرو جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ با موضوع پیگیری و تحقق تامین مسکن برای اقشار کم درآمد، به پیوست دوازدهمین صورتجلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید، جهت استحضار و دستور اقدام لازم به حضور ایفاد می‌گردد.

مجید جودی
معاون بازسازی و مسکن روستایی

2064779671

موضوع جلسه: دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید به منظور پیشبرد برنامه‌های مصوب طرح مذکور در بودجه سال ۱۴۰۵ تشکیل و موارد ذیل مقرر گردید:

۱- مقرر گردید معاونت بازسازی و مسکن روستایی در مکاتبه با استان‌ها بار دیگر به ضرورت و اولویت واگذاری زمین در روستاهای واقع در حریم شهر از محل تفاهم‌نامه مشترک تأمین ۲۰ هزار قطعه زمین با معاونت توسعه و عمران روستایی به منظور تأمین زمین برای متقاضیان سرریز جمعیت شهری تأکید نماید.

۲- با توجه به گزارش معاونت توسعه و عمران روستایی مبنی بر عملکرد ۱۰۰ درصدی در تأمین زمین در قالب توافق‌نامه تأمین ۲۰هزار قطعه زمین در روستاهای حریم شهر با معاونت بازسازی و مسکن روستایی، مقرر گردید سقف تفاهم‌نامه به تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد افزایش یابد و توزیع استانی آن توسط معاونت بازسازی و مسکن روستایی تهیه شود و به معاونت توسعه و عمران روستایی جهت ابلاغ به استان‌ها ارائه شود.

۳- معاونت توسعه و عمران روستایی تا یک ماه آینده نسبت به تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده از محل عواید تخصیص قیر یارانه‌دار به طرح خانه امید (۳۰۰میلیارد تومان) اقدام و گزارش آن را در جلسات آتی ارائه نماید.

۴- پیرو بند (۶) یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید در خصوص طراحی تندیس و لوح یادبود طرح خانه امید، مقرر گردید موضوع از طریق برگزاری مسابقه پیگیری و نتیجه آن در جلسه آتی ستاد هماهنگی ارائه گردد.

۵- با توجه به گزارش معاون برنامه‌ریزی در خصوص ظرفیت استفاده از نیم درصد سود بانک‌ها، مقرر گردید در جدول درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، نسبت به افزایش سقف ردیف مربوطه اقدام و نتیجه آن در ستاد هماهنگی ارائه شود.

۶- با توجه به گزارش معاونت پشتیبانی، مقرر گردید با امضای تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۰ با بانک قرض‌الحسنه رسالت، ماهانه مبلغ ۱۰ میلیارد تومان امتیاز قرض‌الحسنه به طرح خانه امید اختصاص داده شود.

۷- به منظور افزایش ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه، مقرر گردید عواید ناشی از فروش زمین در حساب‌های بانک رسالت مشترک بین دفتر مرکزی و بنیاد استان، واریز شود تا جهت پیشبرد عملیات اجرایی طرح خانه امید استفاده گردد.

۸- پیرو بند (۱۰) دهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید و با توجه به گزارش ارائه شده از سوی دفتر مجامع و امور شرکت‌ها، مقرر گردید از پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵ تسهیلات قرض‌الحسنه از محل رسوب اعتبار شرکتهای تابعه، در مرحله نخست ماهانه ۲۵ فقره تسهیلات با سقف فردی تا ۲۰۰ میلیون تومان با دوران بازپرداخت ۳۶ ماهه (۱۵۰ فقره در ۶ ماه) از

طریق معاونت پشتیبانی در اختیار دفتر مسکن روستایی قرار بگیرد تا نسبت به توزیع استانی و هزینه کرد آن مطابق با عملکرد طرح خانه امید اقدام نماید.

۹- به منظور استفاده از ظرفیت بدهی شرکت‌های تابعه به حساب ۱۰۰ حضرت امام در طرح خانه امید، پیرو چارچوب تهیه شده چگونگی استفاده از ظرفیت شرکت‌های تابعه و هلدینگ نوسازی و عمران تهران، مقرر گردید در قراردادهای فی‌مابین بنیاد استان‌ها و شرکت‌های تابعه، سهم بدهی شرکت‌های تابعه مشخص شود و برنامه تأمین مالی مازاد بر سهم بدهی شرکت‌ها پیش‌بینی گردد.

۱۰- با توجه به گزارش ارائه شده از سوی مدیر کل دفتر حساب ۱۰۰ و مشارکت‌های مردمی در خصوص استفاده از ظرفیت خیرین، مقرر شد تا براساس ساختار ارائه شده توسط معاونت بازسازی و مسکن روستایی (هبه زمین، ساخت واحد مسکونی بصورت ملکی و یا استیجار، تأمین کمک‌های نقد و غیرنقدی)، دفتر حساب ۱۰۰ و مشارکت‌های مردمی نسبت به ارائه گزارش به تفکیک پروژه در هر استان اقدام نماید.

۱۱- دفتر روابط عمومی نسبت به ارائه گزارش در خصوص پخش کلیپ‌های کوتاه در رسانه ملی و پلتفرم شبکه‌های مجازی و انعکاس اخبار آن ارائه گزارش نماید.

۱۲- با توجه به ضرورت ترویج موضوع طرح خانه امید در محافل شهرستانی و استانی و پیگیری شیوه‌های تأمین مالی، پیشنهاد شده است تا از ظرفیت مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استان‌ها به منظور ترویج موضوع در نماز جمعه و همچنین جلسات شهرستانی و استانی استفاده گردد. به همین منظور در جلسات طرح خانه امید که با حضور مجازی استان‌ها تشکیل می‌گردد، از مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه استان‌ها نیز دعوت بعمل آید.

۱۳- مقرر گردید شیوه‌های ترویج طرح خانه امید و نیز جذب اعتبارات استانی و خیرین در استان‌ها به منظور استفاده و تعمیم در سایر استان‌ها، اطلاع‌رسانی شود.

۱۴- عملکرد استان خراسان جنوبی در خصوص تأمین مسکن خانه امید به شرح ذیل ارائه شده است:

- استفاده از ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند اداره آب و برق و گاز جهت ارائه تخفیف برای اشعابات متقاضیان خانه امید؛
- استفاده از ظرفیت فعالیت‌های داوطلبانه اعضای بسیج برای فعالیت‌های اجرایی در پروژه‌های طرح خانه امید؛
- استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و کامیون‌داران برای تخفیف در حمل مصالح پروژه‌های خانه امید؛
- استفاده از ظرفیت صنایع در خصوص تأمین منابع و حمایت مالی در طرح خانه امید؛

- ترویج موضوع طرح خانه امید و ترویج موضوع برای مردم از طریق نماز جمعه؛
- استفاده از ظرفیت ساخت مسکن استیجار از طریق فرمانداری‌ها و دهیاران در هر شهرستان و روستا؛
- ایجاد طرح‌های کوچک مقیاس در سطح شهرستان و روستا به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های خرد محلی از طریق هم‌افزایی نهادهای اجرایی و حمایتی؛

❑ وظایف معاونت بازسازی

✓ تأکید معاونت بازسازی و مسکن روستایی در مکاتبه با استان‌ها به ضرورت و اولویت واگـذاری زمـین در روستاهای واقع در حریم شهر بعنوان سرریز جمعیت شهری

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
شماره: ۱۰۵/۵۹۱۰۳/۶۸۸۳۸/د
پیوست: ندارد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حساب ۱۰۰ امام
دفتر مرکزی

"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"

مدیران کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها

موضوع : پیگیری و تأکید بر واگذاری زمین های روستایی با اولویت روستاهای داخل حریم شهر برای سرریز جمعیت شهرها

با سلام

احتراماً، پیرو بند (۱) مصوبه دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید و تفاهم‌نامه منعقد شده فی مابین معاونت بازسازی و مسکن روستایی و معاونت توسعه و عمران روستایی مبنی بر تأمین زمین رایگان برای ۲۰ هزار واحد مسکونی با اولویت روستاهای داخل حریم شهر، خواهشمند است تأکید فرمائید که هدف از تأمین اراضی مذکور تأمین زمین برای خانوارهای شهری فاقد مسکن می‌باشد که امکان تأمین زمین از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و یا سایر شیوه‌های تأمین زمین در شهرها میسّر نبوده و از طریق به عنوان سرریز جمعیت شهری، شرایط برای تأمین زمین رایگان ملکی برای خانوارهای نیازمند به خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ فراهم می‌گردد. لذا با عنایت به عملکرد ۱۰۰ درصدی در واگذاری ۲۰ هزار واحد مسکونی و افزایش سهمیه مصوب تا ۵۰ هزار واحد، شایسته است ضمن توجیه همکاران استانی و شهرستانی در این خصوص، نسبت به واگذاری زمین مطابق با سیاست‌های مطروحه اقدامات لازم صورت پذیرد. لازم به ذکر است که توزیع استانی سهمیه مازاد تأمین زمین تا ۵۰ هزار واحد مسکونی متعاقباً متناسب با نیاز مسکن خانوارهای دهک ۱ الی ۴ شهری و روستایی به آن استان اعلام می‌گردد.

مجید جودی
معاون بازسازی و مسکن روستایی

رونوشت :
جناب آقای بلدی معاون محترم توسعه و عمران روستایی، جهت استحضار.

2064779671

❑ وظایف معاونت بازسازی

✓ با توجه به گزارش معاونت توسعه و عمران روستایی مبنی بر عملکرد ۱۰۰ درصدی در تأمین زمین در قالب توافق‌نامه تأمین ۲۰هزار قطعه زمین در روستاهای حریم شهر با معاونت بازسازی و مسکن روستایی، مقرر گردید سقف تفاهم‌نامه به تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد افزایش یابد و توزیع استانی آن توسط معاونت بازسازی و مسکن روستایی تهیه شود و به معاونت توسعه و عمران روستایی جهت ابلاغ به استان‌ها ارائه شود.



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حساب ۱۰۰ امام
دفتر مرکزی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
شماره: ۱۴۰۵/۲۹۱۰۴/۷۲۹۶۶
پیوست: دارد

جناب آقای احمدی
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران
جناب آقای عسکری
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی
جناب آقای ذاکری زیارتی
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
جناب آقای رضایی
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان
جناب آقای نادریان زاده
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد
موضوع : توزیع استانی سهمیه تامین زمین برای ۵۰ هزار واحد مسکونی طرح خانه امید

سلام علیکم

احتراما در راستای اجرای طرح خانه امید وتسهیل در دسترسی متقاضیان مشمول به اراضی مناسب روستایی و بر اساس بند(۲) دوازدهمین مصوبه ستاد هماهنگی طرح خانه امید مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ به پیوست توزیع استانی سهمیه تامین زمین برای ۵۰ هزار واحد مسکونی، بر اساس نیاز به مسکن مبتنی بر دهک درآمدی و نیز عملکرد استانها در تامین ۲۰ هزار واحد مسکونی جهت بهره برداری ارسال می گردد.

داریوش بلدی
معاون توسعه و عمران روستایی

مجید جودی
معاون بازسازی و مسکن روستایی


تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد مسکونی

توزیع استانی براساس نیاز به مسکن
خانوارهای دهک ۱ تا ۴ شهری و روستایی

۳۸۰۰۰ واحد
در روستای حریم شهر

۱۲۰۰۰ واحد
در سایر روستای

❑ وظایف معاونت بازسازی

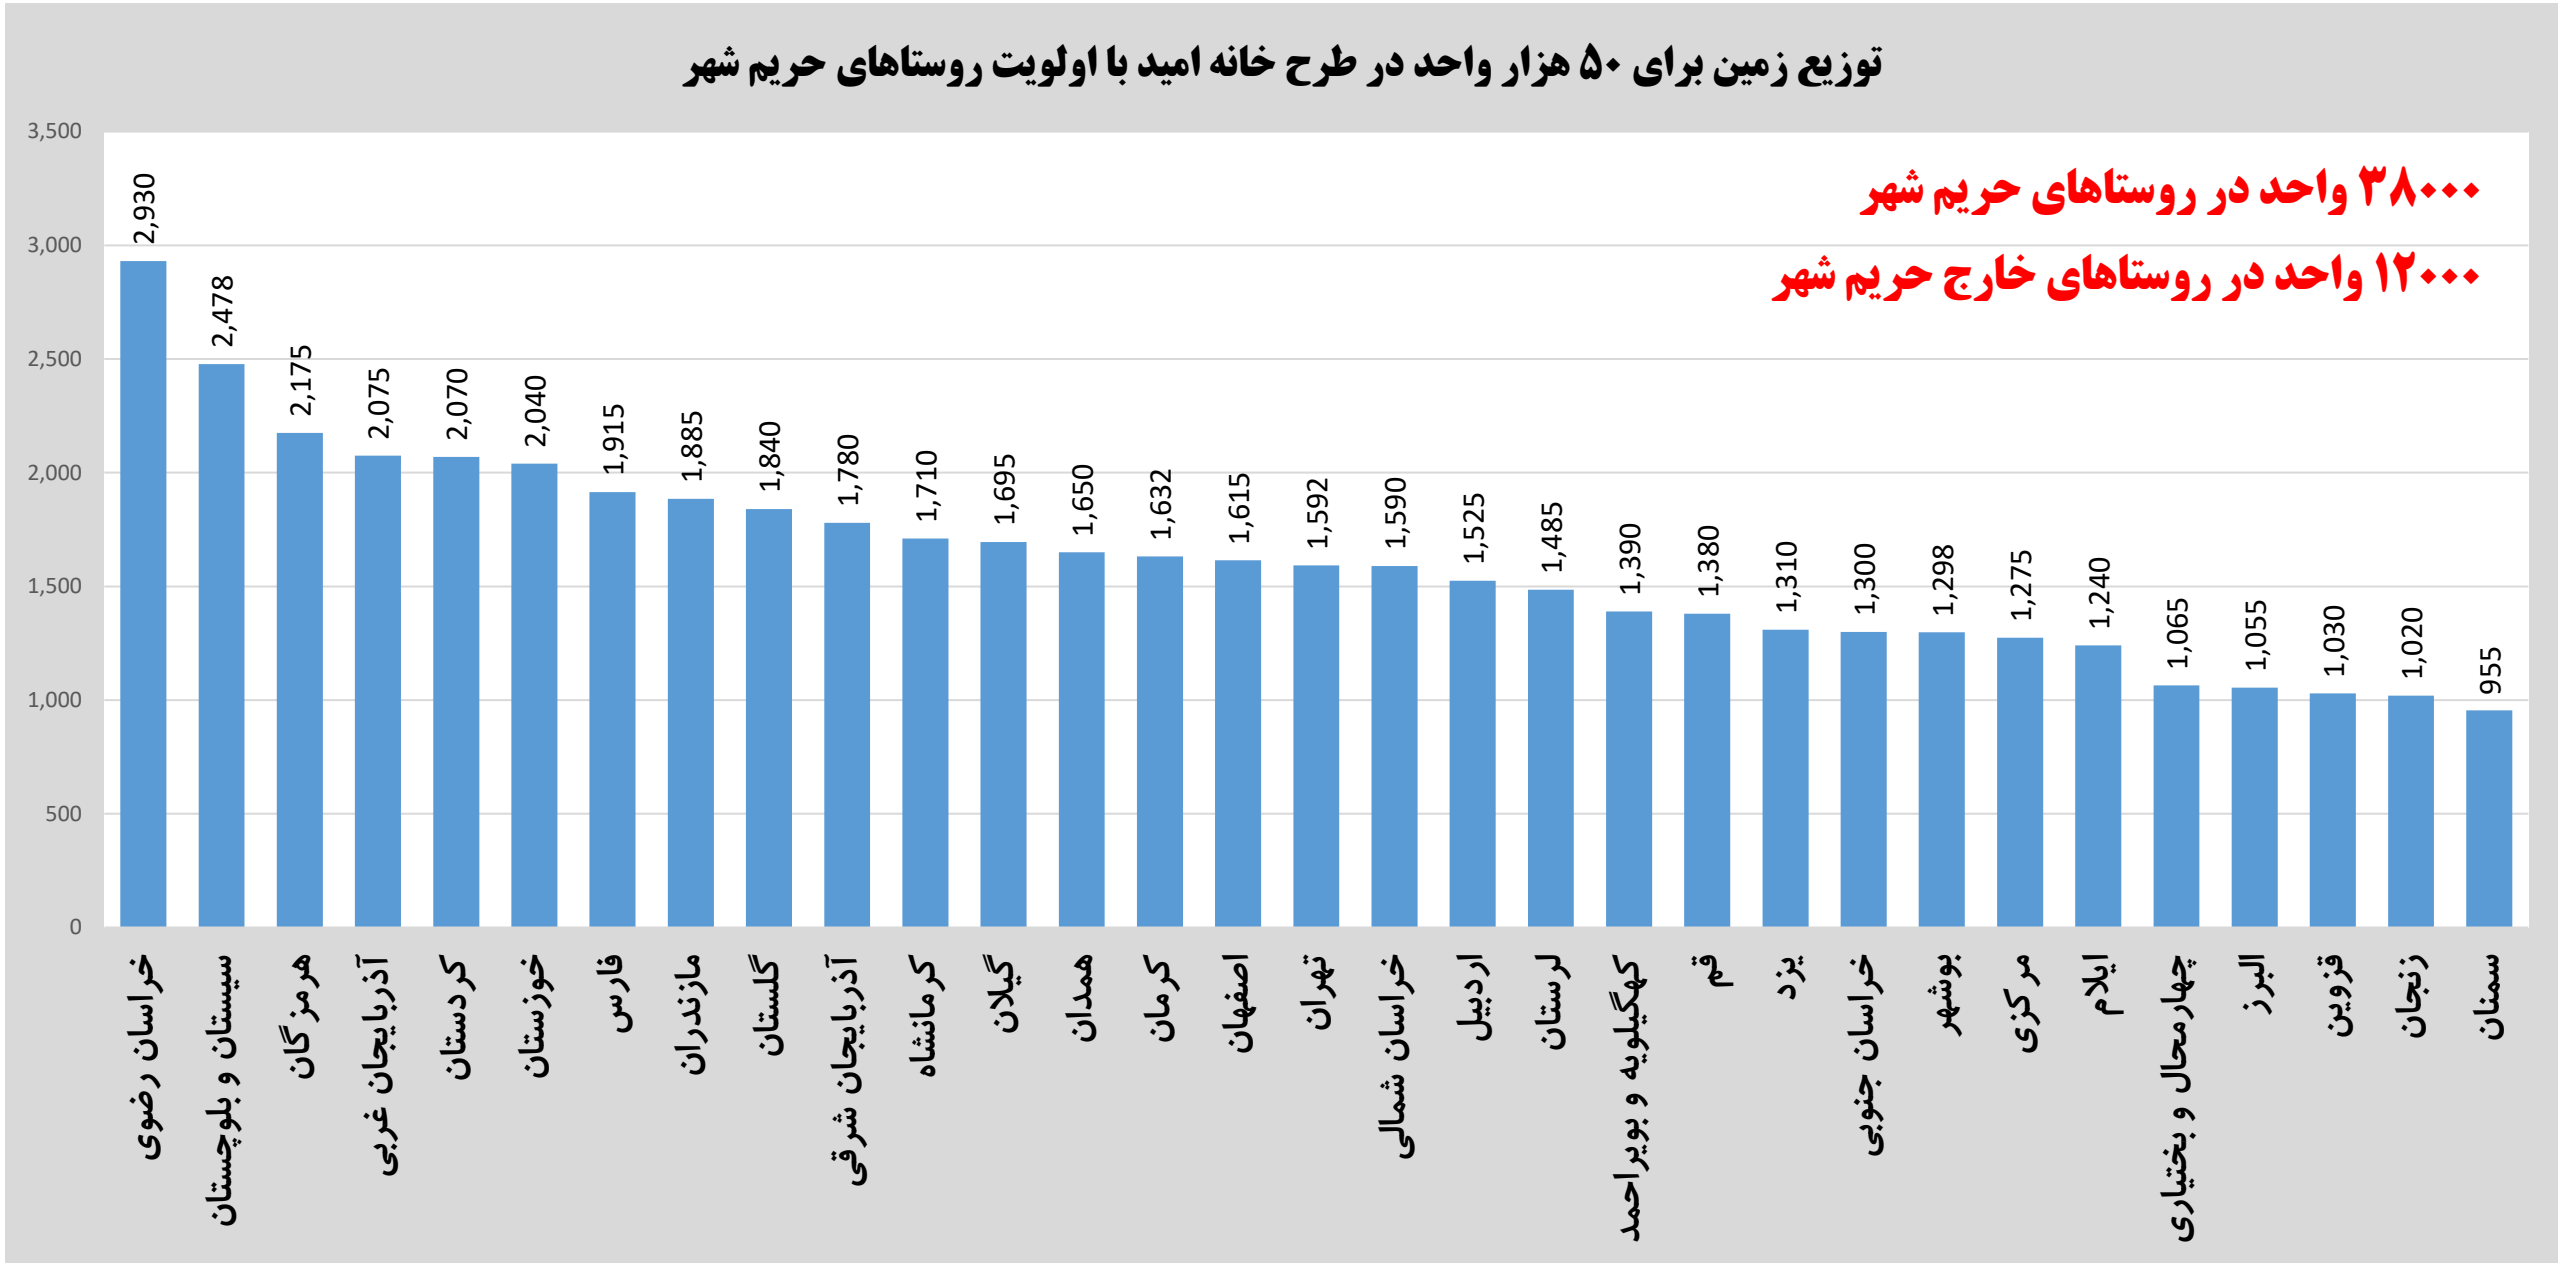


تعداد واحد در دست اجرای طرح خانه امید در سال ۱۴۰۵

		شرح	تعداد واحد در دست اجرا
روستایی	۱	طرح ویژه روستایی دهک های ۱ تا ۴	۴۳,۴۷۳
	۲	طرح تامین مسکن محرومین انتقالی سنوات قبل (غیر تحت پوشش)	۴,۰۴۲
	۳	تفاهم نامه ۸هزار واحدی روستایی کمیته امداد	۹۸۸
۷۸,۸۳۴	۴	مسکن محرومین روستایی بنیاد ساخت انتقالی	۱۰,۶۶۹
	۵	مسکن محرومین روستایی بنیاد ساخت جدید	۴,۱۵۳
	۶	تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین روستایی (در مرحله فروش اقساطی)	۵,۱۴۰
٪۷۰	۷	طرح تأمین مسکن محرومین در سال ۱۴۰۵ دارای کمک بلاعوض	۲۱۹
	۸	تفاهم نامه ۸ هزار با بهزیستی روستایی	۱,۷۴۱
	۹	پروژه های در دست اجرای طرح ویژه بهسازی سنوات گذشته در دهک ۱ تا ۴ (دارای مشارکت مدنی)	۸,۴۰۹
مجموع روستایی			۷۸,۸۳۴
شهری	۱۰	طرح ویژه شهری دهک ۱ تا ۴	۱۵,۴۱۱
	۱۱	پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین شهری (انتقالی)	۶,۳۰۰
	۱۲	تفاهم نامه ۳۰هزار واحدی شهر زیر ۲۵ هزار کمیته امداد	۱,۹۱۶
۳۳,۱۷۴	۱۳	تفاهم نامه ۸ هزار واحدی بهزیستی	۱,۳۲۲
	۱۴	مسکن استیجار	۲۴۸
٪۳۰	۱۵	پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی در انتظار معرفی به بانک	۲,۰۰۷
	۱۶	پروژه های در دست اجرای طرح ویژه بهسازی سنوات گذشته در دهک ۱ تا ۴ (دارای مشارکت مدنی)	۴,۳۳۵
	۱۷	واحدهای فاقد تسهیلات طرح ویژه مشمول کمک بلاعوض خانه امید	۱,۶۳۵
مجموع شهری			۳۳,۱۷۴
مجموع کل کشور			۱۱۲,۰۰۸

برنامه تا آبان ۱۴۰۵
۱۳۰۰۰۰ واحد

عملکرد تا آبان ۱۴۰۵
۸۶ درصد

واحدهای شروع شده بر اساس نوع ساخت

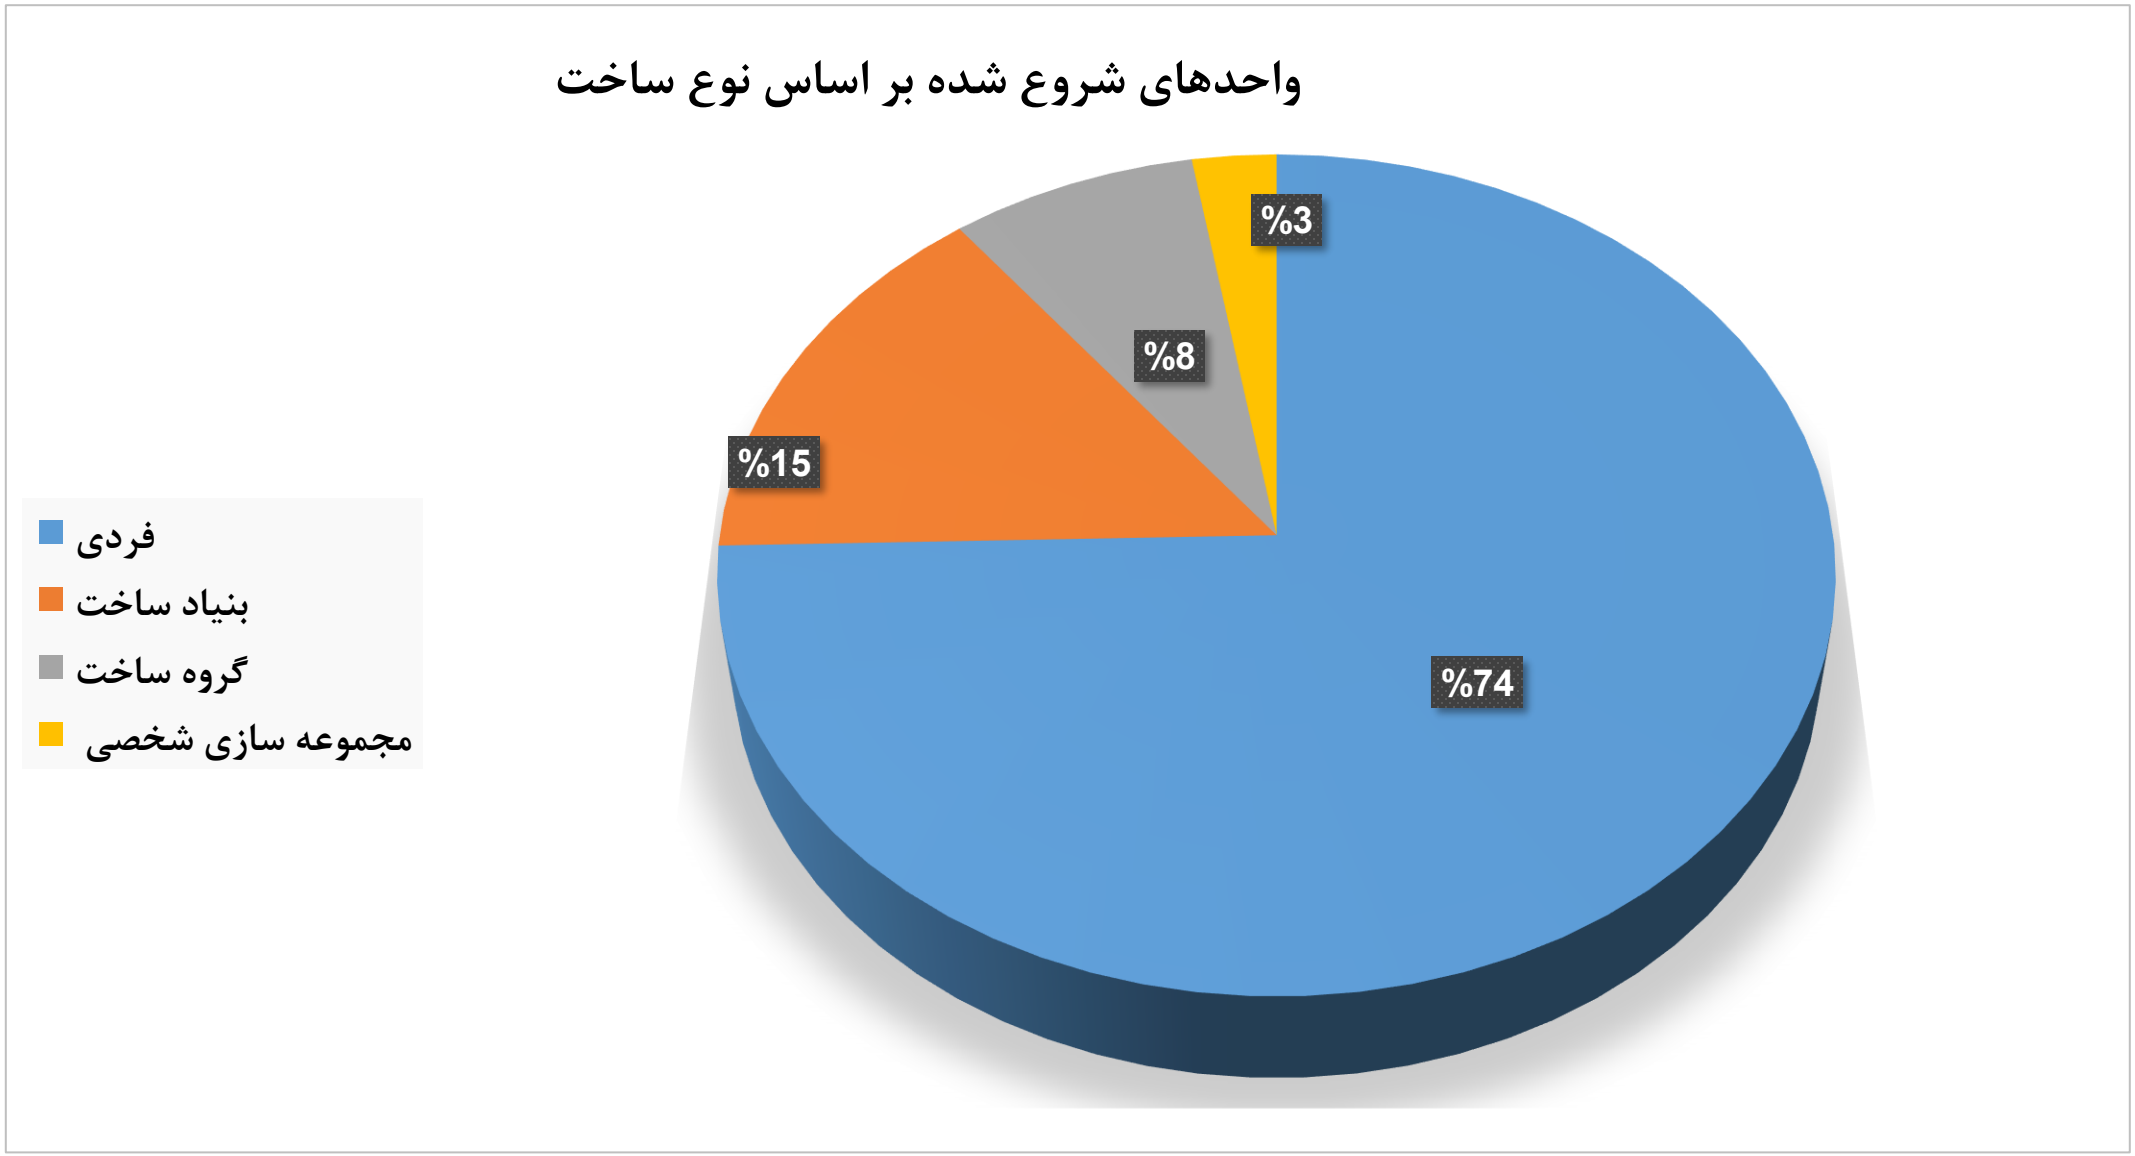

تعداد واحد در دست اجرای مسکن محرومین در سال ۱۴۰۵


		شرح	تعداد واحد در دست اجرا	معرفی به بانک	عقدقرارداد	پی‌کنی	درصد شروع عملیات اجرایی	فونداسیون	اسکلت	سقف	سفتکاری
روستایی	۱	طرح ویژه روستایی دهک های ۱ تا ۴	۴۳,۴۷۳	۴۳,۴۷۳	۱۶,۱۷۵	۴۱,۲۷۵	٪۹۵	۱۳,۱۹۴	۷,۶۳۵	۵,۵۹۷	۳,۱۲۴
	۲	طرح تامین مسکن محرومین انتقالی سنوات قبل (غیر تحت پوشش)	۴,۰۴۲	۳,۷۲۶	۳,۷۲۳	۳,۷۲۶	٪۹۲	۳,۷۱۵	۳,۶۱۱	۳,۴۴۱	۳,۳۲۰
	۳	تفاهم نامه ۸هزار واحدی روستایی کمیته امداد	۹۸۸	۹۴۲	۷۰۰	۹۷۱	٪۹۸	۸۰۹	۶۸۳	۴۶۵	۳۴۱
۷۸,۸۳۴	۴	مسکن محرومین روستایی بنیاد ساخت انتقالی	۱۰,۶۶۹	۵,۵۷۱	۴,۲۵۵	۷,۷۳۴	٪۷۲	۶,۹۷۰	۵,۹۲۴	۵,۲۰۰	۳,۱۴۱
	۵	مسکن محرومین روستایی بنیاد ساخت جدید	۴,۱۵۳	۱,۸۱۲	۹۲۵	۲,۵۰۴	٪۶۰	۱,۱۰۳	۶۴۸	۴۶۳	۷۸
	۶	تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین روستایی (در مرحله فروش اقساطی)	۵,۱۴۰	۵,۱۴۰	۵,۱۴۰	۵,۱۴۰	٪۱۰۰	۵,۱۴۰	۵,۱۴۰	۵,۱۴۰	۴,۹۲۸
٪۷۰	۷	طرح تأمین مسکن محرومین در سال ۱۴۰۵ دارای کمک بلاعوض	۲۱۹	۲۱۹	۲۱۹	۲۰۰	٪۹۱	۱۹۲	۱۴۵	۱۳۱	۹۸
	۸	تفاهم نامه ۸ هزار با بهزیستی روستایی	۱,۷۴۱	۱,۷۴۱	۱,۶۶۹	۱,۶۹۵	٪۹۷	۱,۶۷۴	۱,۶۱۳	۱,۵۳۲	۱,۴۵۱
	۹	پروژه های در دست اجرای طرح ویژه بهسازی سنوات گذشته در دهک ۱ تا ۴ (دارای مشارکت مدنی)	۸,۴۰۹	۸,۴۰۹	۸,۴۰۹	۸,۴۰۹	٪۱۰۰	۸,۰۶۸	۶,۸۴۳	۵,۲۳۴	۴,۹۲۷
مجموع روستایی			**۷۸,۸۳۴**	**۷۱,۰۳۳**	**۴۱,۲۱۵**	**۷۱,۶۵۴**	**٪۹۱**	**۴۰,۸۶۵**	**۳۲,۲۴۲**	**۲۷,۲۰۳**	**۲۱,۴۰۸**
شهری	۱۰	طرح ویژه شهری دهک ۱ تا ۴	۱۵,۴۱۱	۱۵,۴۱۱	۵,۱۷۸	۱۳,۲۵۱	٪۸۶	۵,۶۴۷	۳,۴۳۵	۲,۷۹۳	۱,۵۸۹
	۱۱	پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین شهری (انتقالی)	۶,۳۰۰	۴,۲۰۳	۵,۹۷۴	۶,۳۰۰	٪۱۰۰	۶,۱۰۱	۵,۵۰۰	۴,۹۰۷	۳,۷۵۱
	۱۲	تفاهم نامه ۳۰هزار واحدی شهر زیر ۲۵ هزار کمیته امداد	۱,۹۱۶	۱,۶۰۹	۱,۵۳۸	۱,۸۳۴	٪۹۶	۱,۷۱۹	۱,۶۰۵	۱,۴۹۷	۱,۴۳۸
۳۳,۱۷۴	۱۳	تفاهم نامه ۸ هزار واحدی بهزیستی	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	۱,۱۹۹	۱,۲۸۵	٪۹۷	۱,۲۴۸	۱,۱۳۷	۱,۰۶۲	۹۶۲
	۱۴	مسکن استیجار	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸	۲۰۰	٪۸۱	۲۴۸	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
٪۳۰	۱۵	پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی در انتظار معرفی به بانک	۲,۰۰۷	۲,۰۰۷	۲,۰۰۷	۲,۰۰۷	٪۱۰۰	۲,۰۰۷	۲,۰۰۷	۲,۰۰۷	۲,۰۰۷
	۱۶	پروژه های در دست اجرای طرح ویژه بهسازی سنوات گذشته در دهک ۱ تا ۴ (دارای مشارکت مدنی)	۴,۳۳۵	۴,۳۳۵	۴,۳۳۵	۴,۳۳۵	٪۱۰۰	۴,۲۰۵	۳,۵۵۹	۳,۰۵۷	۲,۹۲۳
	۱۷	واحدهای فاقد تسهیلات طرح ویژه مشمول کمک بلاعوض خانه امید	۱,۶۳۵	۰	۰	۱,۶۳۵	٪۱۰۰	۱,۶۳۵	۱,۶۳۵	۱,۶۳۵	۹۵۲
مجموع شهری			**۳۳,۱۷۴**	**۲۹,۱۳۵**	**۲۰,۴۷۹**	**۳۰,۸۴۷**	**۸**	**۲۲,۸۱۰**	**۱۹,۰۲۸**	**۱۷,۱۰۸**	**۱۳,۷۷۲**
مجموع کل کشور			**۱۱۲,۰۰۸**	**۱۰۰,۱۶۸**	**۶۱,۶۹۴**	**۱۰۲,۵۰۱**	**٪۹۲**	**۶۳,۶۷۵**	**۵۱,۲۷۰**	**۴۴,۳۱۱**	**۳۵,۱۸۰**

عملکرد بانک ها ازمحل اعتبارتخصیصی طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اعتبار سال ۱۴۰۴

ردیف	بانک عامل	تعداد سهمیه اختصاص یافته	تاریخ ابلاغ بانک	سهمیه ابلاغ شده از سوی بانک عامل		وضعیت معرفی به بانک		وضعیت انعقادقرارداد		مجموع جذب (میلیارد ریال)
				تعداد	درصد	تعداد	درصد از سهمیه ابلاغ شده	تعداد	درصد نسبت به معرفی	
۱	تجارت	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۸,۳۱۰	۷۶٪	۸,۳۷۲	۴۶٪	۱۶,۵۹۲
۲	رفاه	۱۲,۵۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲,۵۴۵	۱۰۰٪	۹,۶۶۳	۷۷٪	۴,۳۳۳	۴۵٪	۷,۲۶۶
۳	سپه	۵,۴۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵,۴۵۵	۱۰۰٪	۳,۶۹۱	۶۸٪	۱,۱۶۸	۳۲٪	۱,۴۴۲
٤	صادرات	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۷۴۰	۵۷٪	۵,۶۳۸	۴۱٪	۷,۲۴۷
۵	پست بانک	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۶,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۴۶۲	۴۱٪	۵۶۹	۲۳٪	۳۹۱
٦	ملت	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۷,۸۷۷	۳۳٪	۱,۰۷۱	۱۴٪	۱,۰۴۱
۷	ملی	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۲,۰۰۰	۵۰٪	۳,۱۴۴	۲۶٪	۲۰۳	۶٪	۱۲۵
	مجموع	۱۲۰,۰۰۰	–	۱۰۸,۰۰۰	۹۰٪	۵۸,۸۸۷	۵۵٪	۲۱,۳۵۴	۳۶٪	۳۴,۱۰۴

مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص اعتبار ۱۴۰۴ (تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
ابلاغ سهمیه بانک ها از تسهیلات بهسازی اعتبار ۱۴۰۴– توسط بانک م.ج.ا به بانک های عامل	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
صدور تضمین نامه از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور با شناسه یکتای ۹۹۱۶۳۱۷۷۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۷
صدور تضمین نامه از طرف صندوق ملی زمین و مسکن	۱۴۰۵/۰۵/۱۷

مجموع واحدهای جاری در طرح خانه امید

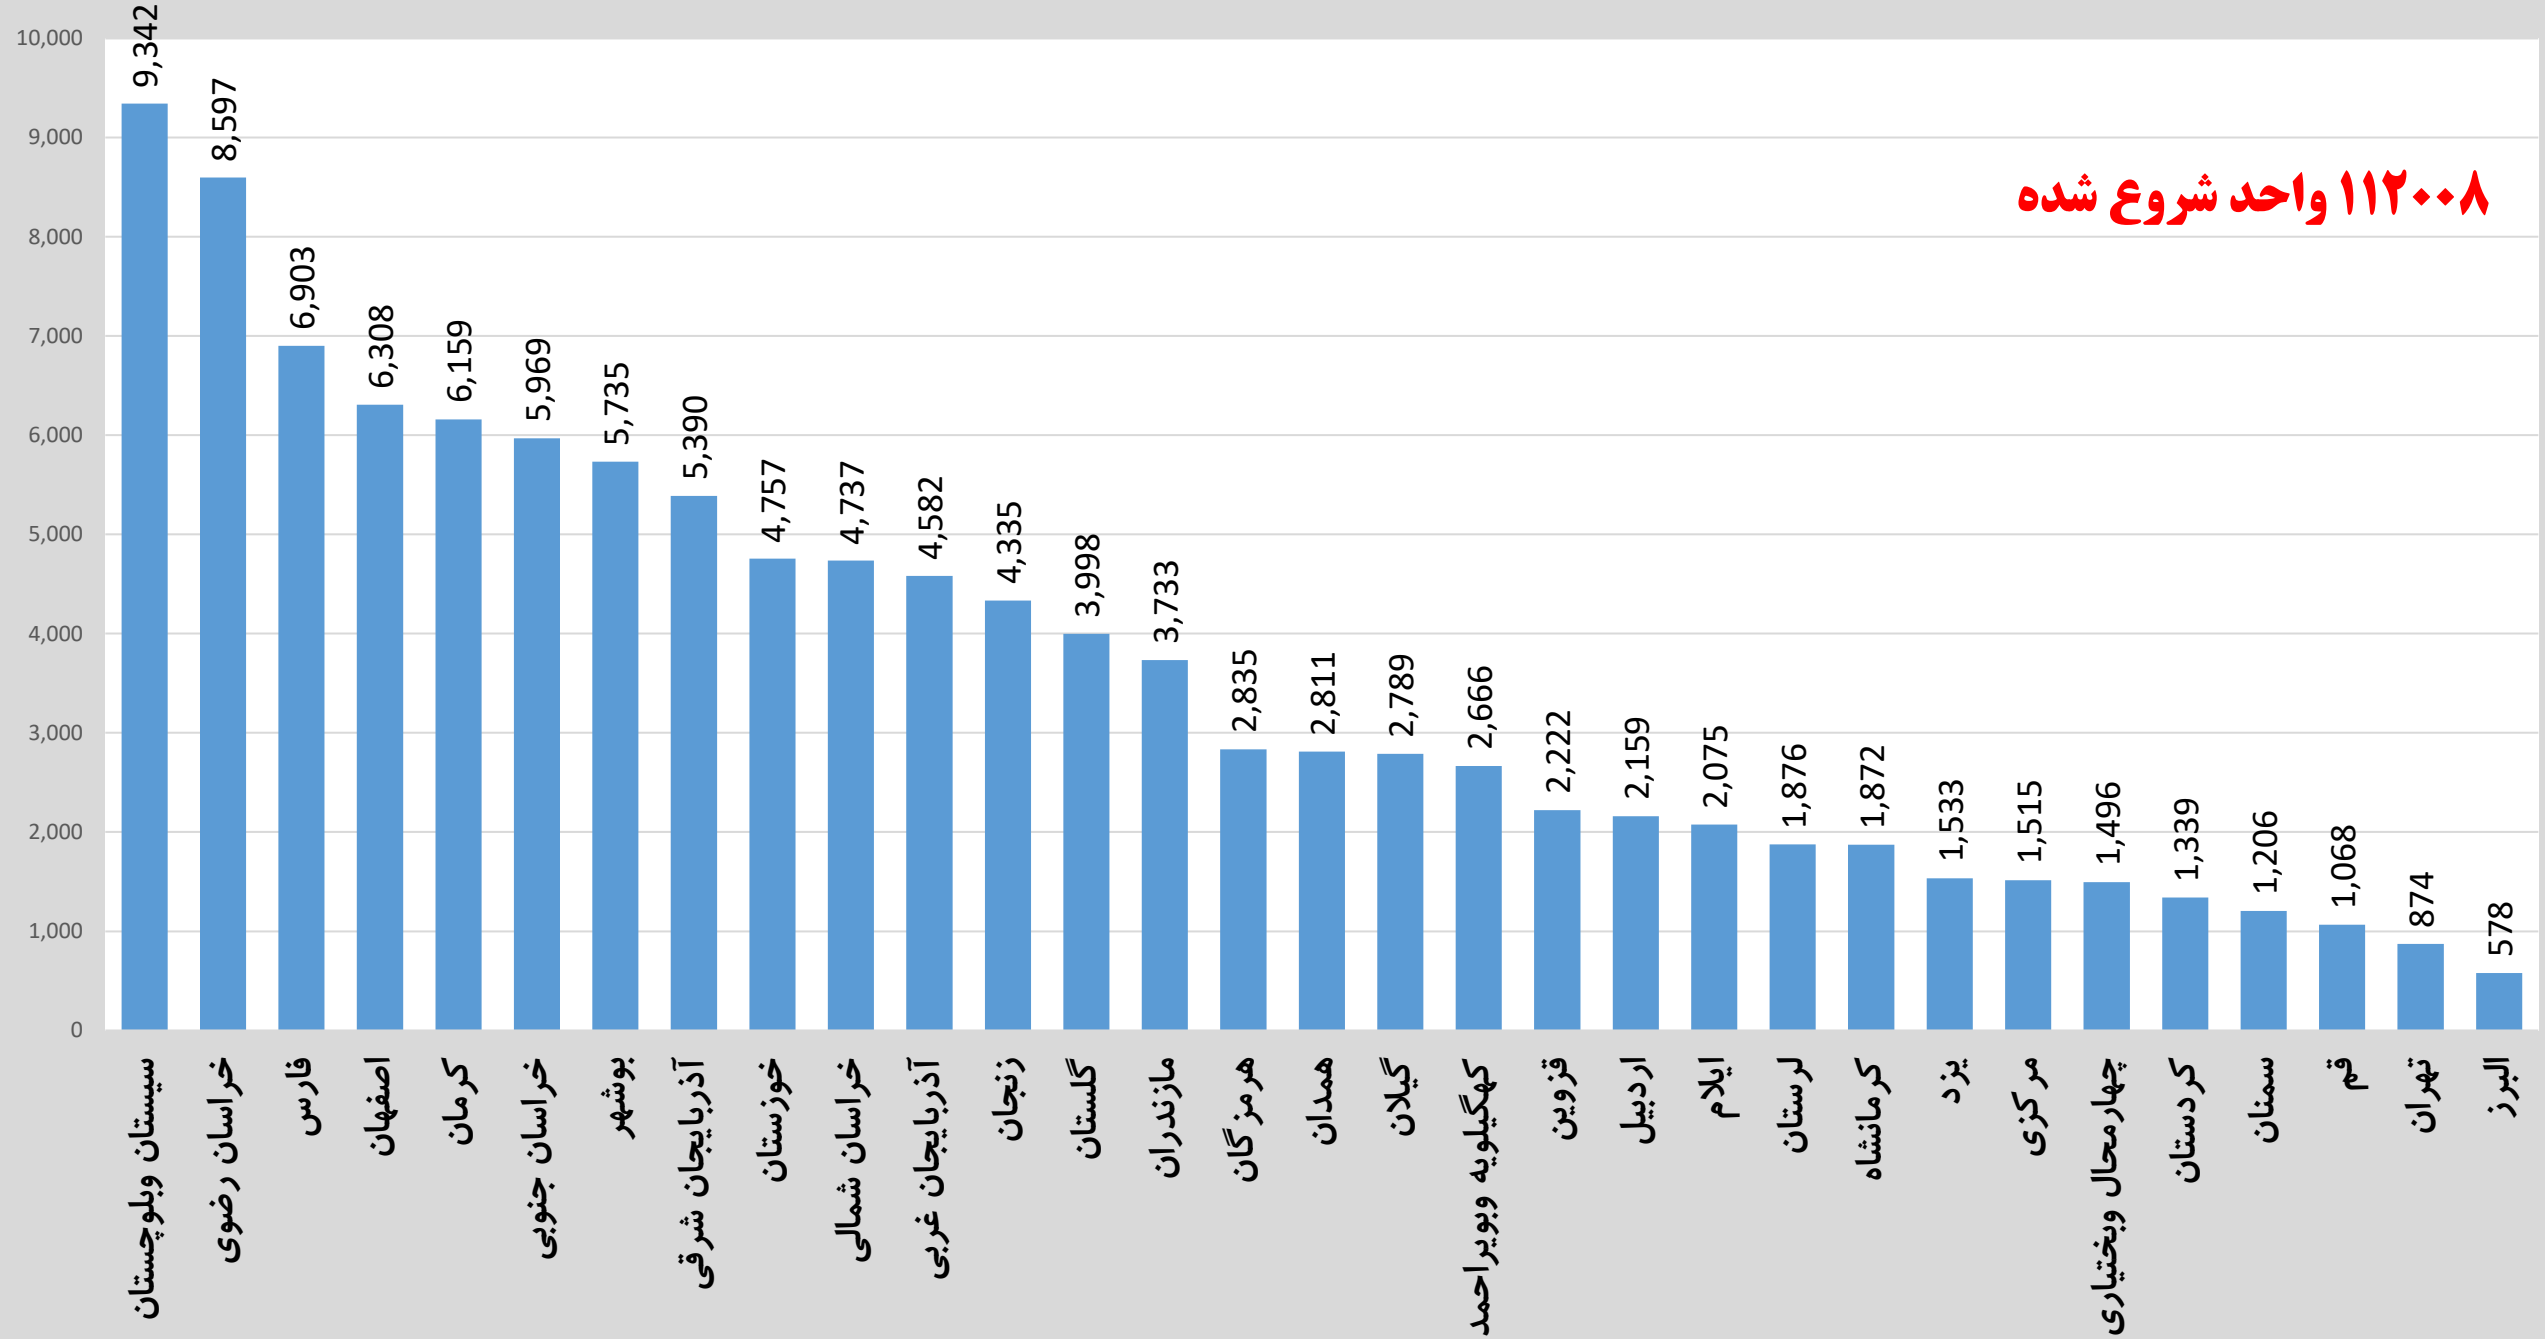

❑ وظایف معاونت بازسازی

✓ ارائه گزارش عملکرد به همراه مانده مطالبات از محل تفاهم‌نامه‌ها با کمیته امداد و سازمان بهزیستی

تفاهم نامه های مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

- **تامین ۸ هزار واحد مسکن روستایی** — تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان
- **تامین ۳۰ هزار واحد مسکن شهری** — تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان
- **تامین ۶ هزار واحد مسکن شهری بنیاد ساخت** — مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان

تفاهم نامه های مشترک سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

- **تکمیل و احداث ۴۱۰۰ واحد مسکن شهری** — تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
- **تکمیل و احداث ۳۹۰۰ واحد مسکن روستایی** — تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

تفاهم نامه های مشترک بنیاد ایران پیشرفته و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای صنعتی‌ساز و استفاده از فناوری های نوین

- **تامین ۲۰ هزار واحد مسکن برای دهک درآمدی ۱ تا ۴** — تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان

تفاهم با نهادهای حمایتی به منظور هم‌افزایی در تأمین ۵۲ هزار واحد مسکونی

❑ تفاهم نامه های مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

تفاهم نامه تامین ۸ هزار واحد مسکن روستایی

تعداد پرونده تایید شده ۷۸۰۸

	پرونده تایید شده	معرفی به بانک	انعقاد قرارداد	پی کنی	فونداسیون	اسکلت	گچ و خاک، نصب در و پنجره
عملکرد کلی	۷۸۰۸	۷۵۰۱	۷۲۲۴	۷۴۹۷	۷۳۱۷	۷۱۹۱	۶۷۶۴
عملکرد سال ۱۴۰۵	۱۲۹۹	۹۹۱	۷۱۳	۹۸۸	۸۱۲	۶۸۳	۳۲۶

اعتبار مورد نیاز بر اساس پیشرفت (میلیارد ریال)	مبلغ تامین شده توسط نهاد	مانده تعهد نهاد	مبلغ تخصیصی به استان	هزینه شده توسط استان
۱۲۷۸۰	۹۸۵۱	۲۹۲۹	۹۵۲۹	۸۸۲۳

کمک به ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن شهری
سهمیه شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر : ۲۵۰۰ واحد

تعداد پرونده تایید شده ۱۹۰۵

	پرونده تایید شده	معرفی به بانک	انعقاد قرارداد	پی کنی	فونداسیون	اسکلت	گچ و خاک، نصب در و پنجره
عملکرد کلی	۱۹۱۶	۱۶۳۰	۱۵۳۸	۱۸۳۴	۱۷۱۹	۱۶۰۵	۱۴۹۷

اعتبار مورد نیاز بر اساس پیشرفت (میلیارد ریال)	مبلغ تامین شده توسط نهاد	مانده تعهد نهاد	مبلغ تخصیصی به استان	هزینه شده توسط استان
۳۸۰۵	۲۴۰۹	۱۳۹۶	۲۰۰۵	۱۸۱۵

❑ تفاهم نامه ۶۰۰۰ واحد کمیته امداد برای پروژه های بنیاد ساخت شهری

واحدهای بنیاد ساخت شهری با سرانه بلاعوض ۴۰۰ میلیون تومان کمیته امداد

- تا مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ تعداد ۳۹۵۲ واحد صورتجلسه شده می‌باشد.

پی کنی	فونداسیون	اسکلت	سقف	سفتکاری
۳۰۰۶	۱۹۷۸	۱۶۴۳	۱۱۳۰	۱۰۳۱

اعتبار مورد نیاز بر اساس پیشرفت (میلیارد ریال)	مبلغ تامین شده توسط نهاد	مانده تعهد نهاد	مبلغ تخصیصی به استان	هزینه شده توسط استان
۴۳۵۰	۰	۴۳۵۰	۰	۰

❑عملکرد تفاهم نامه ۸۰۰۰ واحد بهزیستی (۴۹۰۰ سهمیه شهری و ۳۱۰۰ سهمیه روستایی)

	معرفی به بانک	عقدقرارداد	پی کنی	فونداسیون	اسکلت	سقف	سفتکاری
شهری	۱۳۲۲	۱۱۹۹	۱۲۸۵	۱۲۴۸	۱۱۳۷	۱۰۶۲	۹۶۲
روستایی	۱۷۴۱	۱۶۶۹	۱۶۹۵	۱۶۷۴	۱۵۳۲	۱۵۳۲	۱۴۵۱
مجموع	۳۰۶۳	۲۸۶۸	۲۹۸۰	۲۹۲۲	۲۷۵۰	۲۵۹۴	۲۴۱۳

اعتبار مورد نیاز بر اساس پیشرفت (میلیارد ریال)	مبلغ تامین شده توسط نهاد	مانده تعهد نهاد	مبلغ تخصیصی به استان	هزینه شده توسط استان
۵۷۵۰	۷۳۰	۵۰۲۰	۷۳۰	۰

❑ دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰

✓ عملکرد دفتر مشارکت‌های مردمی

تعداد قطعه زمین هبه شده		مساحت زمین هبه شده شهری (مترمربع)	مساحت زمین هبه شده روستایی (مترمربع)	واحد مسکونی در دست اجرا	
شهری	روستایی			شهری	روستایی
۵	۴۴	۱۹۷۳۱	۲۵۹۰۳	۸۷۱	۷۱۸

✓ عملکرد خیرین مسکن ساز

تعداد واحد	پروانه ساختمانی	زمین			تسهیلات			
		دولتی	هبه	بنیاد مسکن	نهضت ملی	مسکن روستایی	خانه امید	فاقد تسهیلات
۴,۳۳۲	۴,۳۳۲	۳,۹۱۲	۱۲۸	۱۹۸	۲,۴۳۰	۸۲۱	۰	۸۵۷

❑ میزان کمک بلاعوض پرداختی به استان‌ها (از محل موافقتنامه ۱۴۰۴)

شرح	ابلاغ ماده ۷۵		حساب ۱۰۰		مجموع (میلیارد ریال)
	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۵	
روستایی	–	–	۴۰۰	۶۹۲.۰	۱,۹۴۸
				۸۵۶	
	۰	۰	۴۰۰	۱,۵۴۸	
شهری	۲,۵۱۱	۱,۰۴۱	–	۱,۰۰۰	۵,۲۵۲
				۵۰۰	
				۲۳۰	
	۲,۵۱۱	۱,۰۴۱	۰	۱,۷۰۰	
کل کشور	۲,۵۱۱	۱,۰۴۱	۴۰۰	۳,۲۴۸	۷,۲۳۰

باقیمانده از ۷۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص موافقتنامه سال ۱۴۰۴، ۲۷۰ میلیارد ریال بعنوان خرید مصالح هزینه گردید.


از مجموع اعتبارات مذکور ۹۷۳۰ خانوار (۶۱۵۸ خانوار روستایی و ۳۵۷۲ خانوار شهری) منتفع شده اند که به طور متوسط هر خانوار ۷۷ میلیون تومان می باشد.

کمک بلاعوض تخصیص داده شده به استان‌ها (میلیارد تومان) از محل موافقتنامه ۱۴۰۴ و سایر منابع پرداختی


موافقتنامه دولتی- ملی روستایی سال ۱۴۰۴	۱۹۵	۷۵۰
موافقتنامه دولتی- ملی شهری سال ۱۴۰۴	۵۵۵	
نیم درصد بانکها	۳.۳	۲۲۹
عواید فروش زمین	۱۷۷	
کمک نقدی خیرین	۳۳	
معادل یک برابر بنیاد	۱۰	
عواید حاصل از تخصیص قیر	۲۳.۸	
سفر مقام معظم رهبری به کردستان	۲.۰	
تفامنامه ۸ هزار واحد کمیته امداد	۳۲+۴۸+ ۱۰۲	۲۸۳
تفاهم‌نامه ۳۰ هزار واحد کمیته امداد	۳۳+۴۰	
طرح تامین ۸ هزار واحد محرومین حساب ۱۰۰	۹۹.۸	
مجموع		**۱,۲۸۲**

- مبلغ ۴۸ میلیارد تومان در انتظار پرداخت می باشد.
- مبلغ ۷۲ میلیارد تومان پرداخت نشده می باشد.

کمک بلاعوض تخصیص داده شده به استان‌ها (میلیارد تومان)

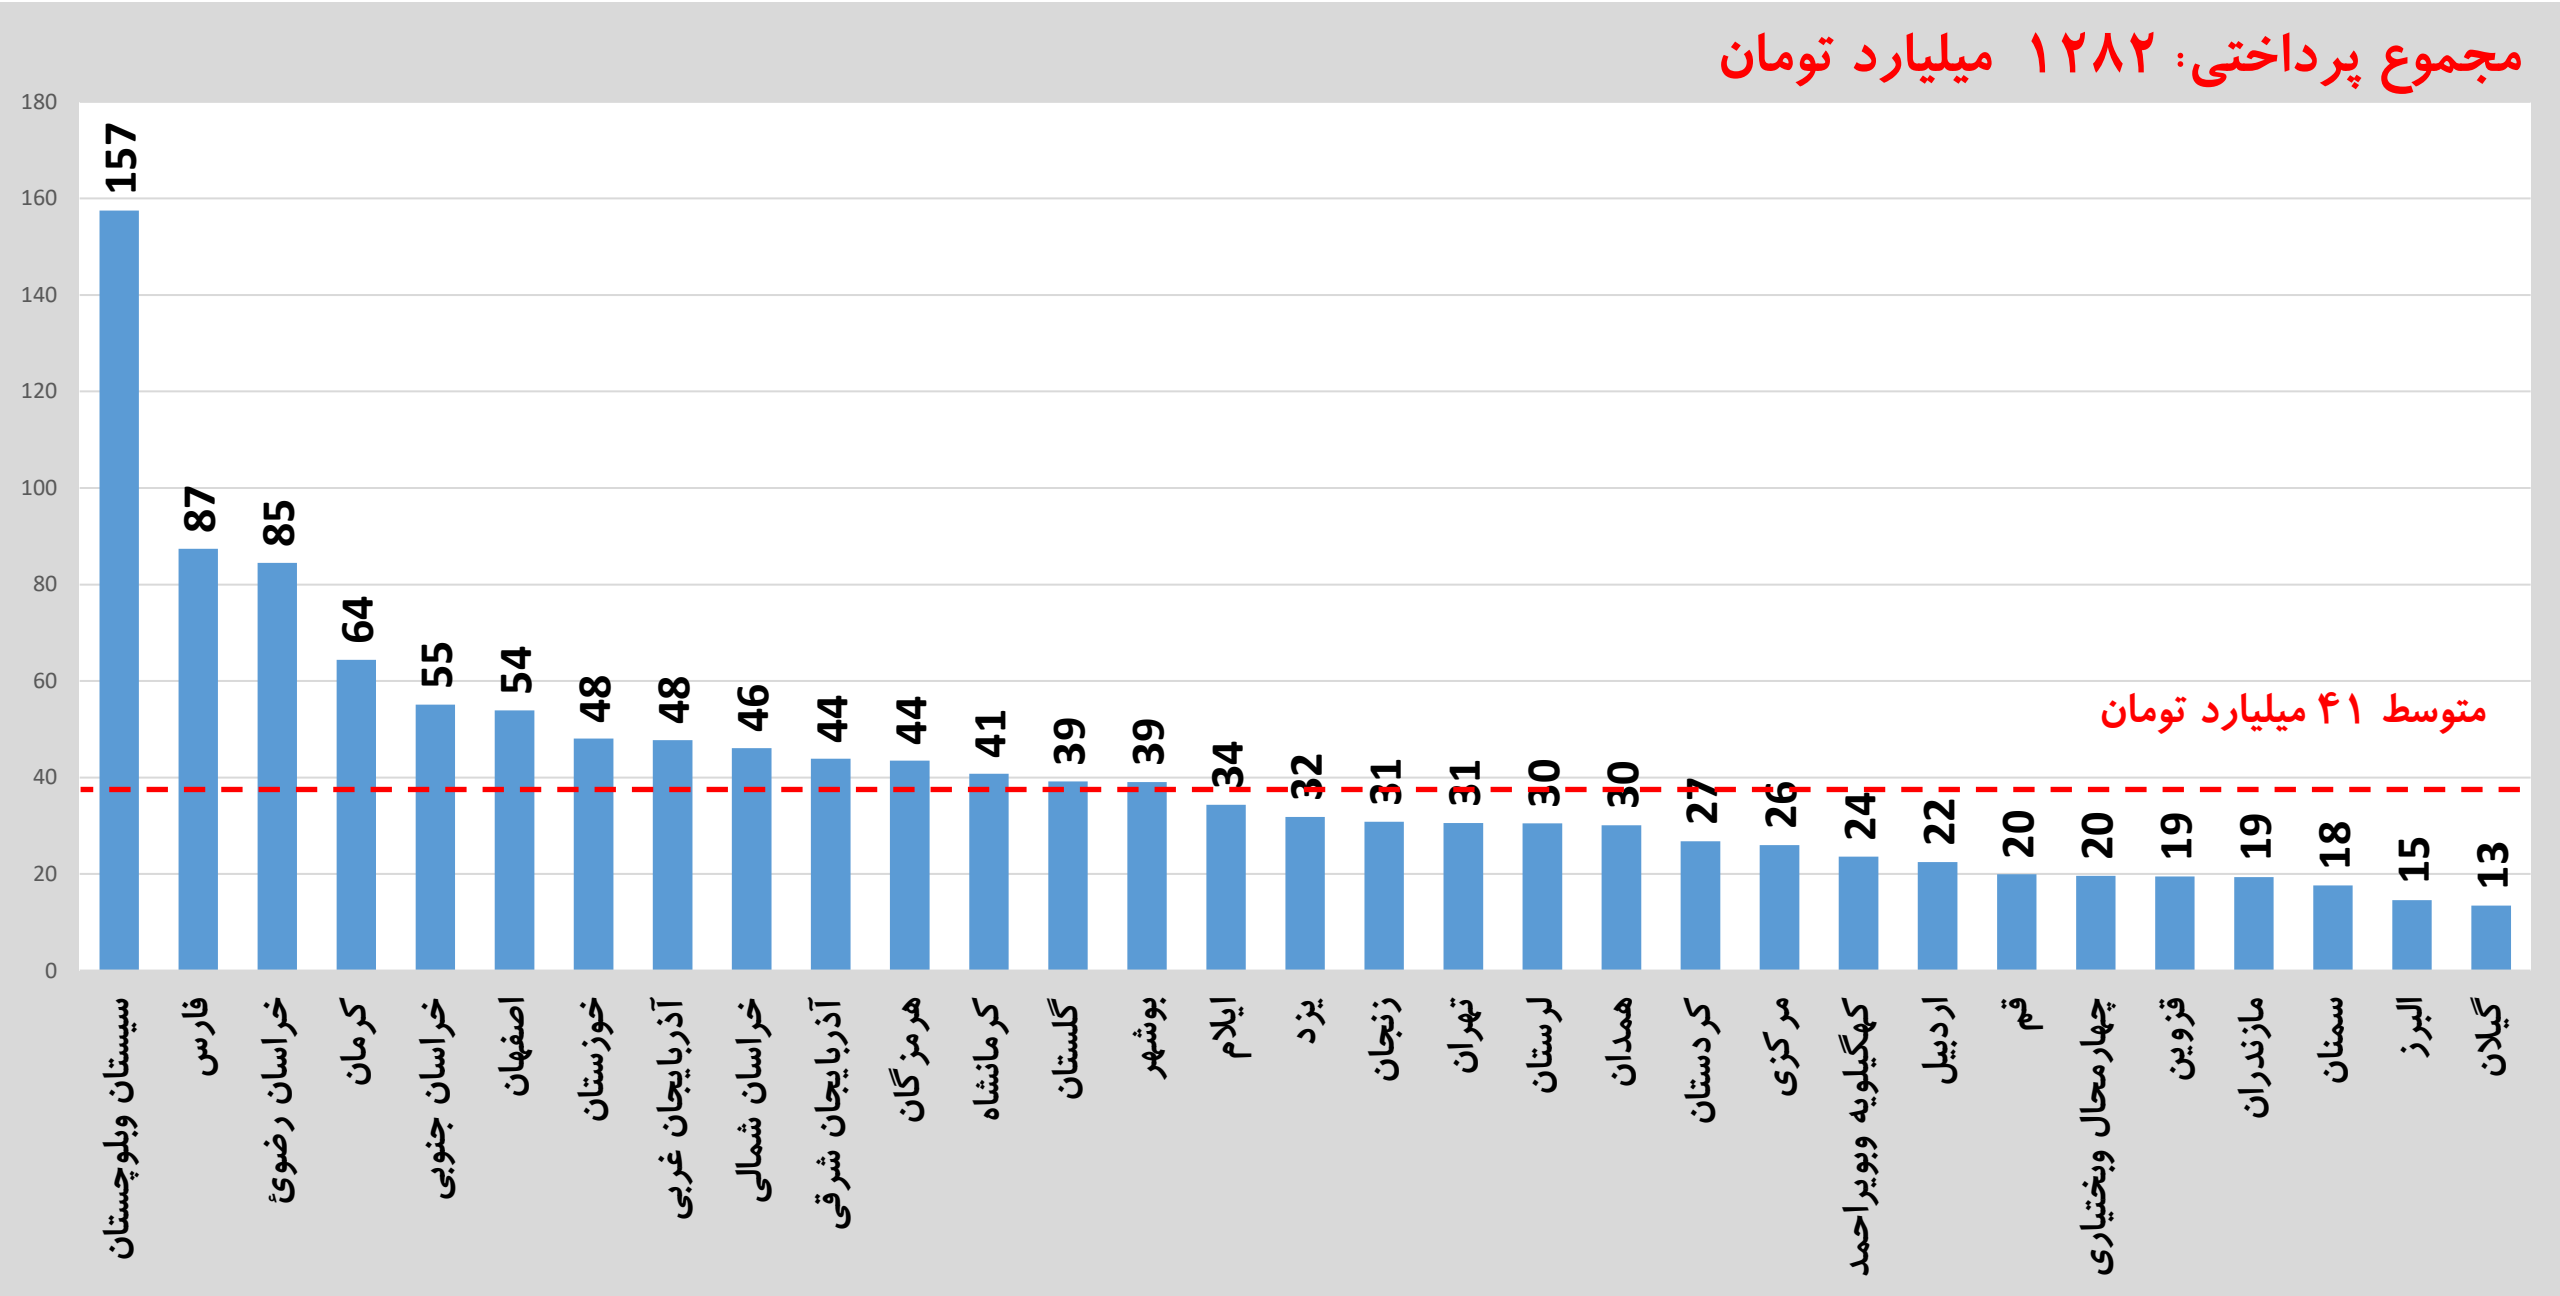

کل سهمیه، موجودی قابل برداشت و کمبود حساب هر استان (میلیارد ریال)

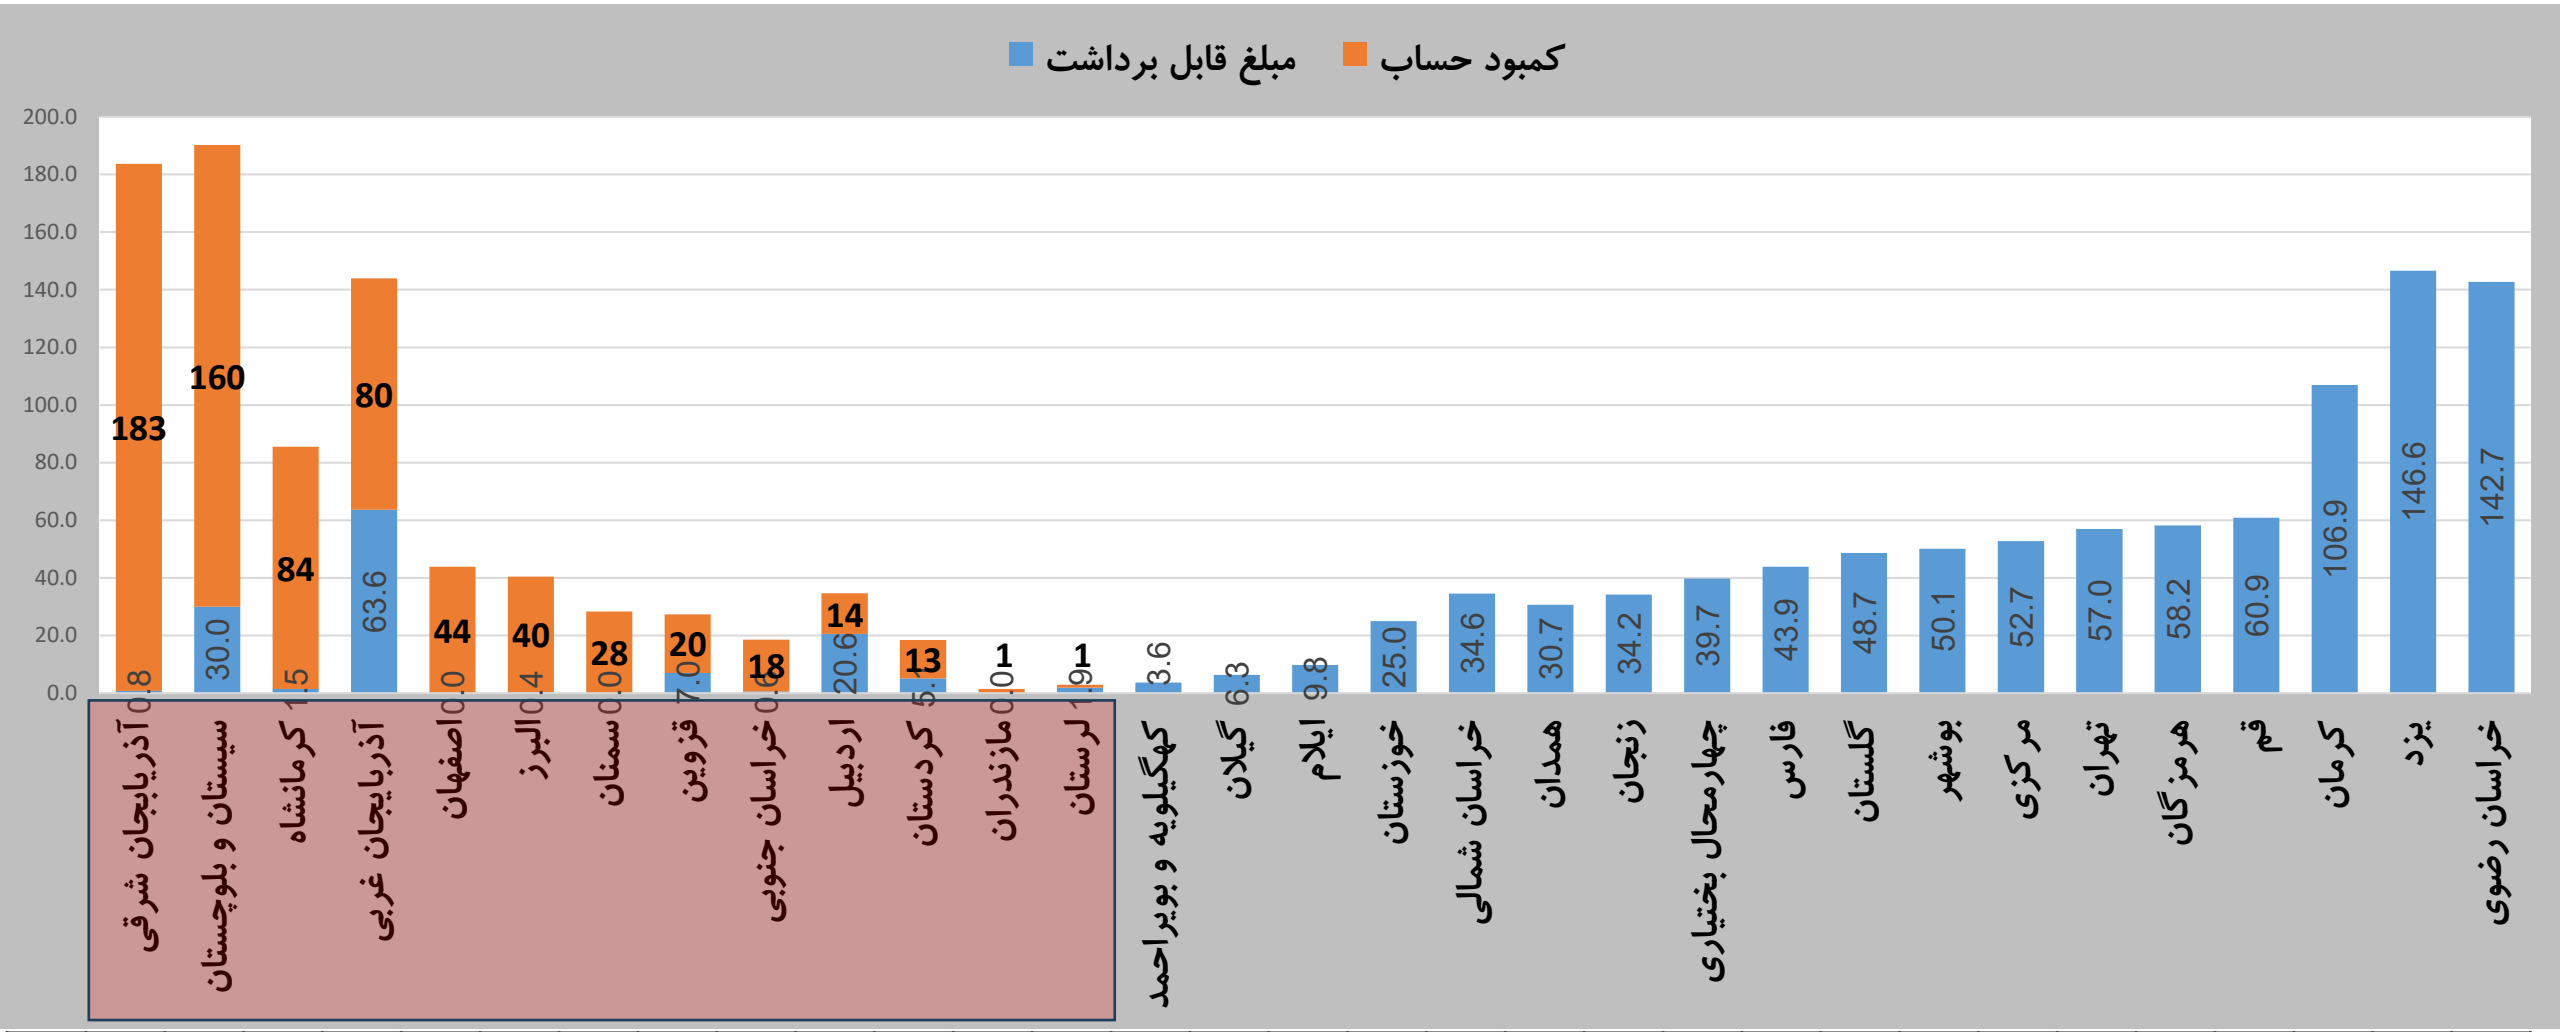

سهمیه	۱۸۴	۱۹۰	۸۶	۱۴۴	۴۴	۴۰	۲۸	۲۷	۱۹	۳۵	۱۸	۱	۳	۴	۶	۱۰	۲۵	۳۵	۳۱	۳۴	۴۰	۴۴	۴۹	۵۰	۵۳	۵۷	۵۸	۶۱	۱۰۷	۱۴۷	۱۴۳
هزینه کرد				۱۲														۳۵										۶۰			۱۲۸

برنامه تأمین و واگذاری زمین رایگان در طرح خانه امید

تفاهم‌نامه تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد مسکونی با سازمان ملی زمین و مسکن	شناسایی ۵۲۶ قطعه زمین برای ۳۱ هزار واحد	صورتجلسه تحویل ۲۷ هزار واحد	قراردادواگذاری ۲۱ هزار واحد	پروانه ساختمانی ۱۲۶۵۰ واحد	شروع عملیات اجرایی ۱۰۷۲۵ واحد
تفاهم‌نامه تأمین زمین برای ۲۵ هزار واحد مسکونی با شرکت عمران شهرهای جدید	صورت جلسه تحویل برای ۵۰۶۸ واحد مسکونی در ۱۱ شهر جدید	قرارداد واگذاری ۳۳۵۲ واحد (۱۰۴۹ واحد در مرحله صدور پروانه) آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، سمنان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، فارس، تهران، مرکزی، بوشهر			
تأمین زمین رایگان برای ۲۰ هزار واحد مسکونی متعلق به بنیاد در روستاهای حریم شهر	واگذاری حریم و خارج از حریم ۲۱۴۸۰ واحد				
بارگذاری زمین برای ۳۳ هزار قطعه زمین در سامانه سماع و تم	واگذاری حدود ۳۶ هزار قطعه به متقاضیان سرریز شهرها در سامانه تم				
اراضی هبه شده از سوی خیرین	هبه زمین برای احداث حدود ۴ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۵				

اراضی در اختیار شهرداری‌ها (براساس وظیفه شهرداری ها در تأمین مسکن ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها)/ اراضی متعلق به کارخانجات و صنایع بزرگ/ اراضی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام)/ اراضی منابع ملی که توسط شورای مسکن استان‌ها شناسایی و تخصیص می‌یابد.

برنامه تأمین زمین برای ۱۳۲ هزار واحد زمین مسکونی

شناسایی و تخصیص زمین برای : ۹۲ هزار واحد مسکونی


❑ وظایف معاونت توسعه و عمران روستایی

✓ با توجه به گزارش ارائه شده در زمینه عملکرد تفاهم واگذاری ۲۰ هزار قطعه زمین در روستاهای واقع در حریم شهر، مقرر شد ضمن تسریع در شناسایی اراضی مناسب و صورتجلسه انتقال در استان، نسبت به ارائه گزارش متناسب با تعداد قطعه واگذاری براساس تفاهم‌نامه فی مابین معاونت بازسازی و مسکن روستایی و معاونت توسعه و عمران روستایی اقدام شود.

عملکرد واگذاری ۲۰ هزار قطعه زمین در روستاها						
برنامه	عملکرد قطعه زمین در حریم شهر	عملکرد واحد در حریم شهر	عملکرد قطعه زمین خارج از حریم شهر	عملکرد واحد در خارج از حریم شهر	مجموع کل عملکرد قطعه زمین	مجموع کل عملکرد واحد	تحقق
۲۰۰۰۰	۱۰۵۱۷	۱۵۶۱۳	۵۰۲۱	۵۸۶۷	۱۵۵۳۸	۲۱۴۸۰	۱۰۷ درصد

❑ وظایف معاونت توسعه و عمران روستایی

- ✓ کل سهمیه: ۲۰ هزار قعطه روستایی در حریم شهر
- ✓ تعداد قطعه واگذار شده به معاونت بازسازی : ۱۰۵۱۷ قطعه زمین برای ۱۰۶۱۳ واحد
- ✓ شناسایی اراضی روستایی خارج از حریم شهر: ۵۰۲۱ قطعه زمین برای ۵۸۶۷ واحد
- ✓ مجموع اراضی شناسایی و واگذار شده به معاونت بازسازی: ۲۱۴۸۰ واحد

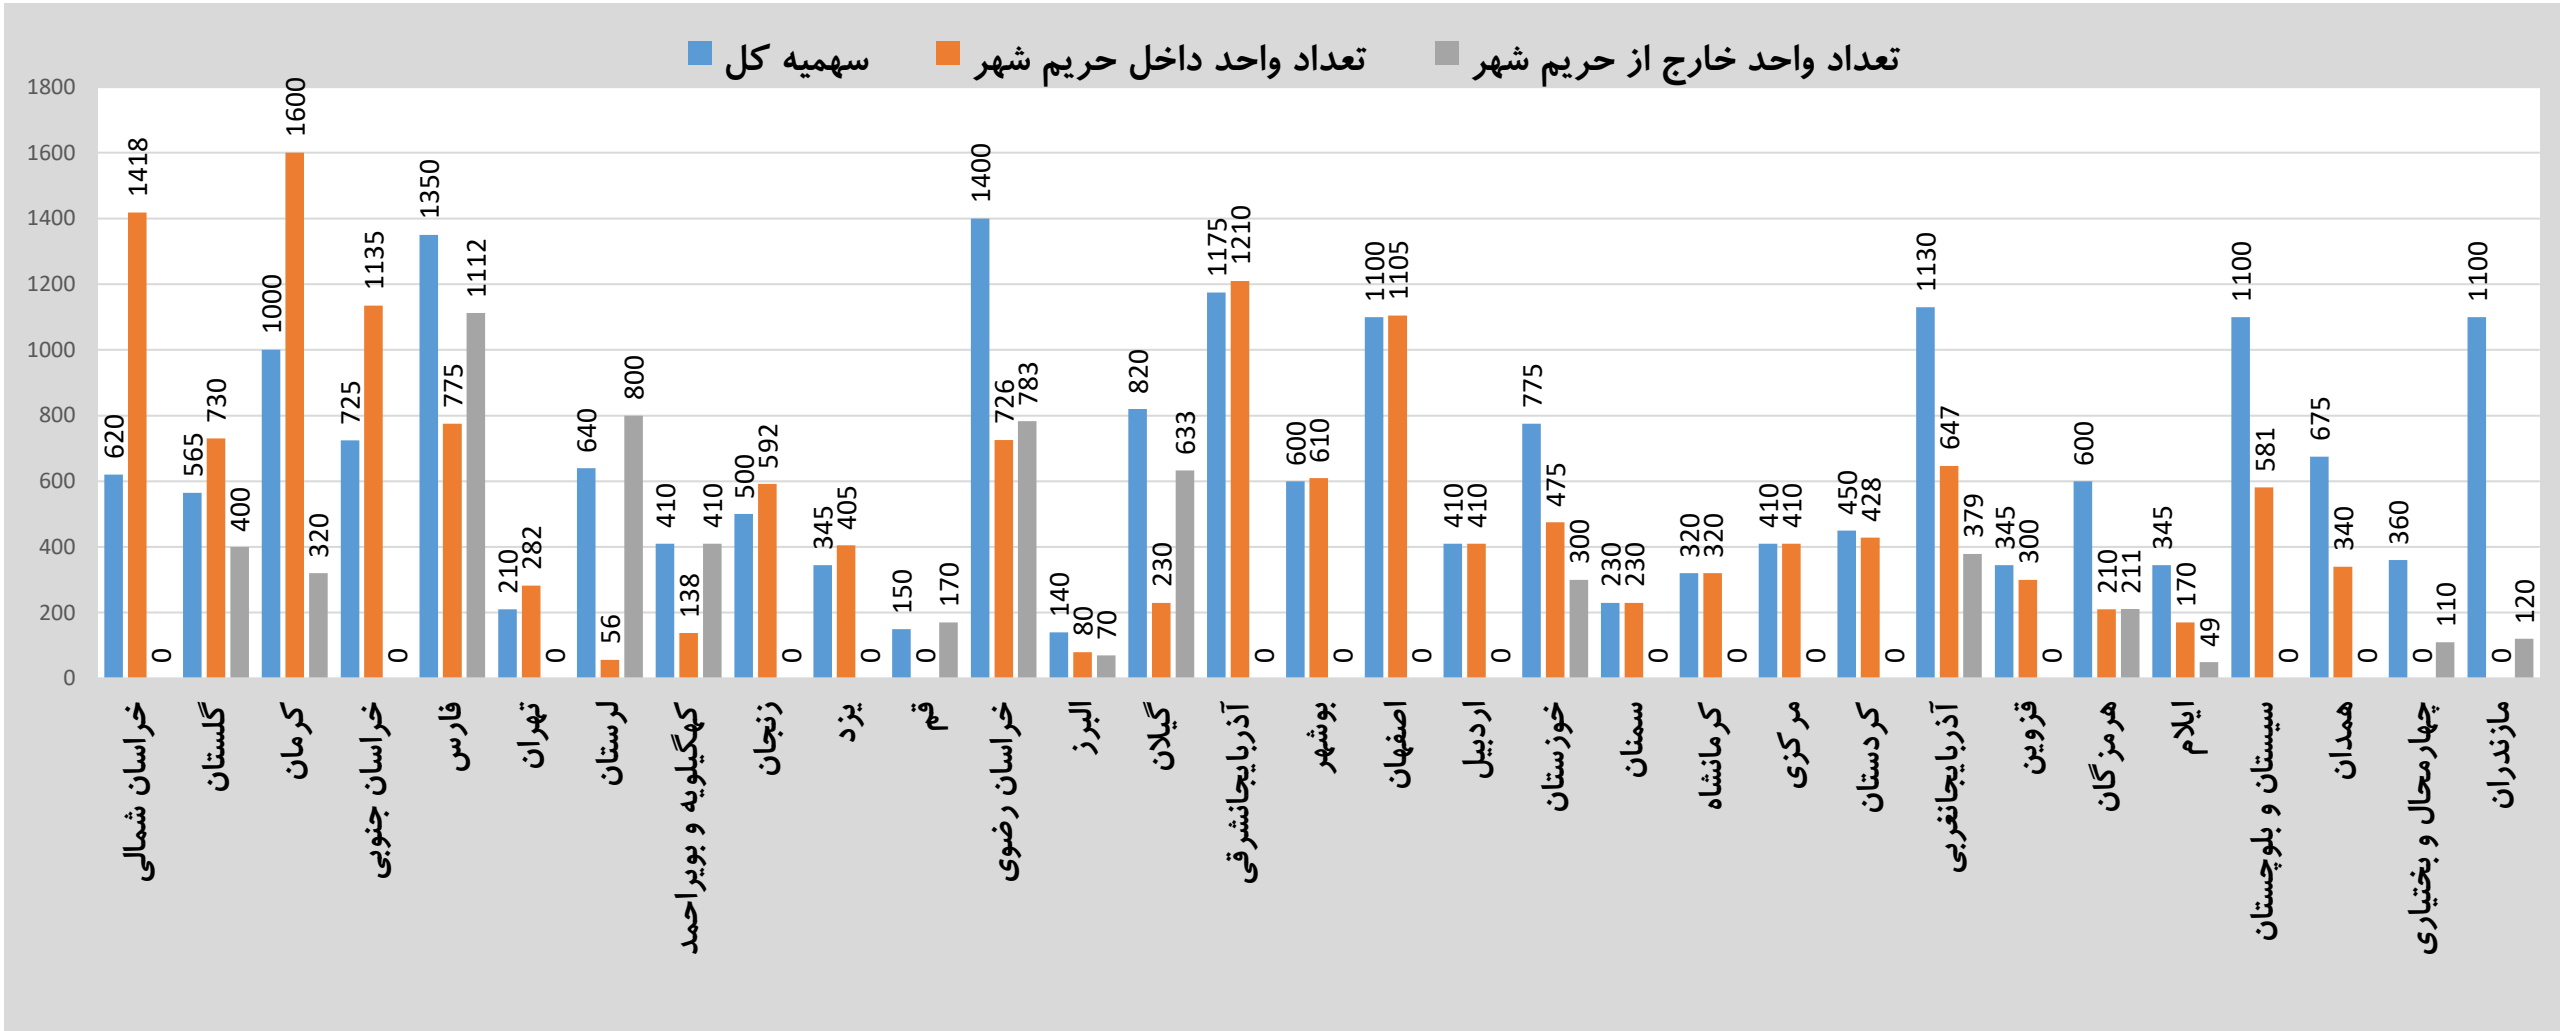

	خراسان شمالی	گلستان	کرمان	خراسان جنوبی	فارس	تهران	لرستان	کهگیلویه و بویراحمد	زنجان	یزد	قم	خراسان رضوی	البرز	گیلان	آذربایجانشرقی	بوشهر	اصفهان	اردبیل	خوزستان	سمنان	کرمانشاه	مرکزی	کردستان	آذربایجانغربی	قزوین	هرمزگان	ایلام	سیستان و بلوچستان	همدان	چهارمحال و بختیاری	مازندران
سهمیه کل	620	565	1000	725	1350	210	640	410	500	345	150	1400	140	820	1175	600	1100	410	775	230	320	410	450	1130	345	600	345	1100	675	360	1100
تعداد واحد داخل حریم شهر	1418	730	1600	1135	775	282	56	138	592	405	0	726	80	230	1210	610	1105	410	475	230	320	410	428	647	300	210	170	581	340	0	0	0
تعداد واحد خارج از حریم شهر	0	400	320	0	1112	0	800	410	0	0	170	783	70	633	0	0	0	0	300	0	0	0	0	379	0	211	49	0	0	110	120
درصد تحقق	%229	%200	%192	%157	%140	%134	%134	%134	%118	%117	%113	%108	%107	%105	%103	%102	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%95	%91	%87	%70	%63	%53	%50	%31	%11

❑ وظایف معاونت بازسازی و مسکن روستایی

تعداد کل قطعه زمین تحویل گرفته شده توسط معاونت بازسازی استان	۱۵۵۳۸ قطعه
تعداد کل واحد – زمین تحویل گرفته شده توسط معاونت بازسازی استان	۲۱۴۸۰ واحد
تعداد کل واحد مسکونی تحویل داده شده به متقاضیان	۱۰۶۳۸ واحد مسکونی

❑ وظایف معاونت برنامه‌ریزی

تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل پیوست یک / اسناد خزانه اسلامی - / اخزا ۵۰۲

مبالغ به میلیون ریال

شماره	عنوان	افزایش تخصیص	توضیحات
۱۳۳۷۰۰ - ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۳۰۱۵۰۶۰۰۰۲	طرح جامع بهسازی مسکن روستایی	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۳۰۱۵۰۶۰۰۰۵	کمک به مسکن گروه های کم درآمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۴۰۱۵۲۶۰۰۰۵	ایمن سازی ۳۰٪ روستاهای در معرض خطر حوادث	۲,۲۰۰,۰۰۰	-
۱۴۴۰۱۵۲۶۰۰۱۹	ساماندهی و بهسازی بافت های ناکارآمد شهری و روستایی محدوده و حریم شهری بافت های فرسوده در معرض خطر	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۴۰۱۵۲۶۰۰۲۷	بهسازی بافت با ارزش روستایی	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع		۱۶,۲۰۰,۰۰۰	

یک همت اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا ۵۰۲)
سه ساله (سررسید ۱۴۰۸)

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۳۷۲۰۲۴
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
پیوست: دارد

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر اکرمی
خزانه دار محترم کل کشور

باسلام و احترام؛

به استناد بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، بدینوسیله افزایش تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی ذی ربط از محل اعتبارات «عمومی» پیوست شماره یک (۱) قانون مزبور به صورت اسناد خزانه اسلامی به شرح جدول پیوست تعیین می گردد. رعایت بند(ب) ماده (۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در اجرا و تأمین اعتبار طرح ها و پروژه های این ابلاغیه تخصیص برای دستگاه اجرایی الزامی است. ضمناً، چنانچه منابع تأمین اعتبار طرح های موضوع این ابلاغیه بر اساس عنوان طرح یا مجوزهای صادره، از محل سایر منابع (خارج از بودجه عمومی) پیش بینی شده باشد، هزینه کرد اعتبارات موضوع این ابلاغیه منوط به رعایت نسبت(های) عملکرد منابع عمومی به سایر منابع است که در عنوان یا مجوزهای طرح تصریح شده است.

با احترام مجدد

سید حمید پورمحمدی

- جناب آقای عدل مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست وهماهنگی دستگاه های‌وابسته
- جناب آقای قاسمی معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه
- جناب آقای امانی همدانی معاون محترم فنی، زیربنایی و تولیدی
- جناب آقای سیدعلایی، معاون محترم توسعه مدیریت و امور مجلس
- سرکار خانم خانلو ساوجلاقی رئیس محترم امور تلفیق و هماهنگی بودجه
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

❑ وظایف معاونت برنامه‌ریزی

پیگیری معرفی شرکت‌های معتبر صنعتی سازی در راستای تفاهم نامه با بنیاد ایران پیشرفته

بسمه تعالی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حساب ۱۰۰ امام
دفتر مرکزی

"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
شماره: ۰۵/۵۹۱۰۳/۴۴۵۶۲/ص
پیوست: دارد

جناب آقای ملک زاده
مدیرعامل محترم بنیاد آینده ایران

با سلام

احتراماً، پیرو تفاهم‌نامه شماره ۲۴۹۷/ص مورخ ۱۴۰۵/۵/۱۲ فی مابین این بنیاد و بنیاد ایران پیشرفته با موضوع ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساخت، خواهشمند است دستور فرمائید براساس بند (۱) ماده (۴) تفاهم‌نام مذکور نسبت به معرفی شرکت معتبر صنعتی‌سازی ساختمان، جهت انعقاد قرارداد با متقاضیان طرح خانه امید اقدام گردد. همچنین با توجه به هماهنگی صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۷/۵ مبنی بر اینکه بخشی از مبلغ قرارداد از محل تسهیلات و کمک بلاعوض متقاضیان در قالب پیش‌پرداخت هزینه می گردد، مراتب لازم در خصوص اخذ تضامین معتبر حسن انجام تعهدات شرکت‌های معرفی شده صورت پذیرد و نتیجه به این بنیاد اعلام گردد.

محمدحسین رحمانی خلیلی
معاون برنامه ریزی

2064779671



❑ وظایف معاونت برنامه‌ریزی

- ✓ در خصوص طراحی تندیس و لوح یادبود طرح خانه امید، مقرر گردید موضوع از طریق برگزاری مسابقه پیگیری و نتیجه آن در جلسه آتی ستاد هماهنگی ارائه گردد.

- ✓ پیشنهاد استان آذربایجان غربی:

طراحی، تولید و توزیع برچسب اختصاصی با عنوان «حامی خانه امید» جهت نصب بر روی شیشه مغازه ها، کارخانجات و شرکت های همکار


❑ وظایف معاونت برنامه‌ریزی

اعتبارات دولتی– استانی (میلیارد تومان)			
برنامه تا پایان سال	برنامه تا پایان آذر ۱۴۰۵	مصوب استانی	تخصیص
۸۶۴	۲۵۹	۷۵	۰


اعتبارات مسئولیت اجتماعی / مالیات‌های نشانه‌دار/بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه (میلیارد تومان)			
برنامه تا پایان سال	برنامه تا پایان آذر ۱۴۰۵	مصوب	تخصیص
۲۲۵۳	۹۰۰	۸۴۱	۲۰۶

مجموع (میلیارد تومان)			
برنامه تا پایان سال	برنامه تا پایان آذر ۱۴۰۵	مصوب	تخصیص
۳۷۴۹	۱۱۵۹	۹۱۶	۲۰۶

❑ وظایف معاونت برنامه‌ریزی

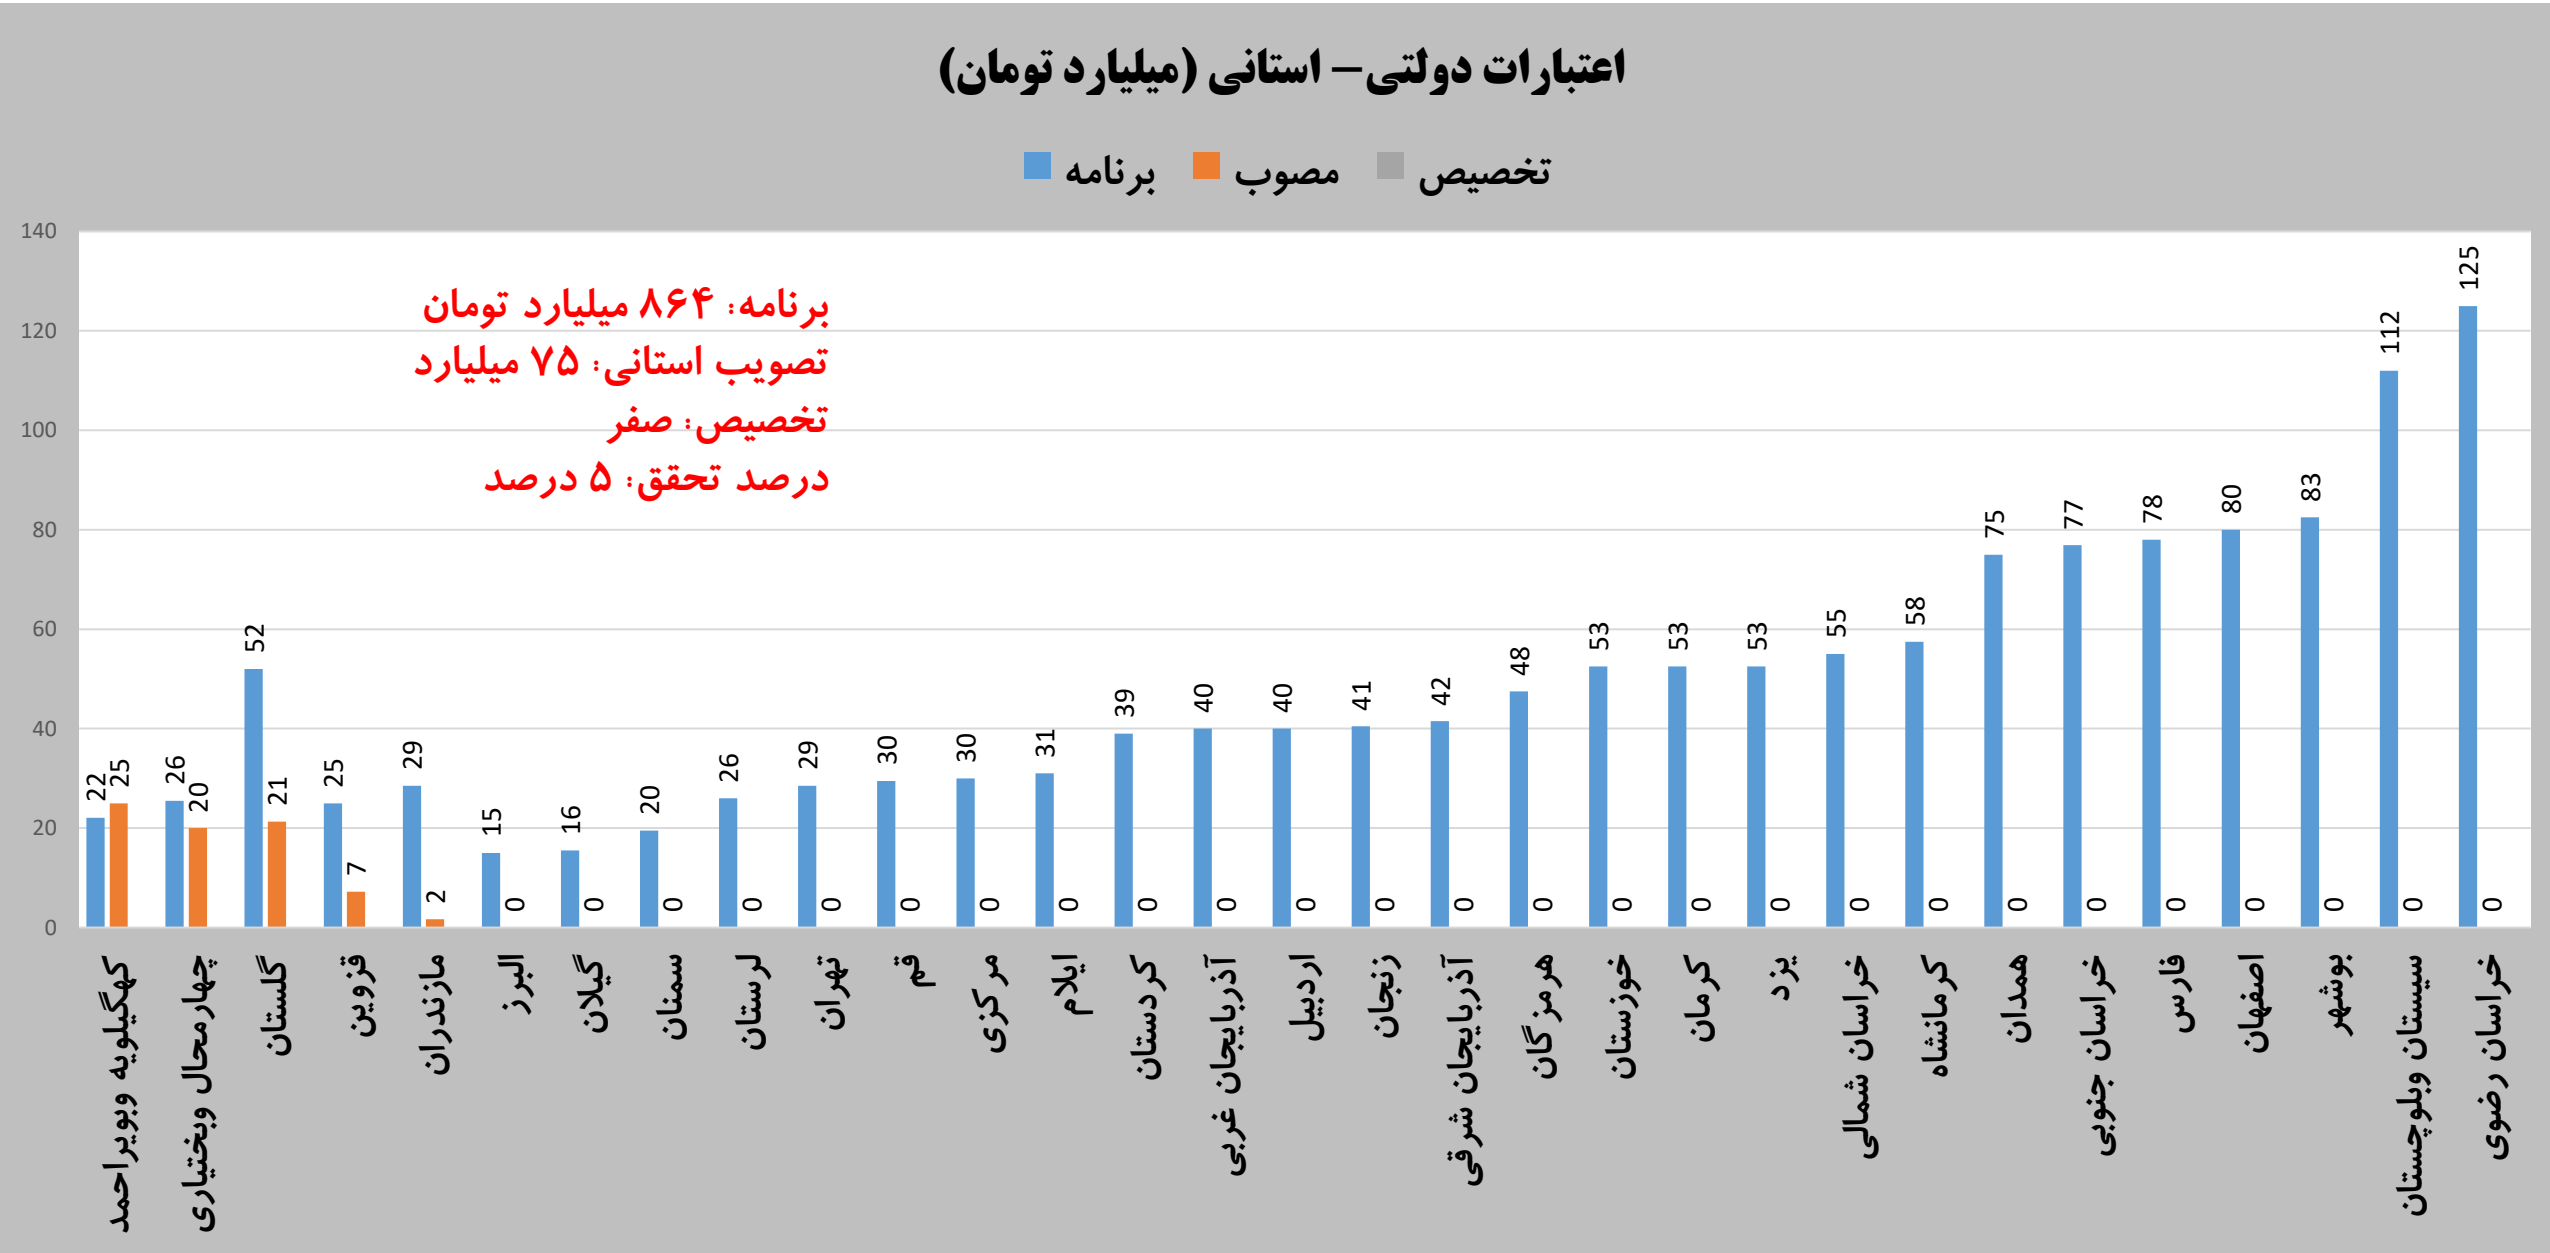

❑ وظایف معاونت برنامه‌ریزی

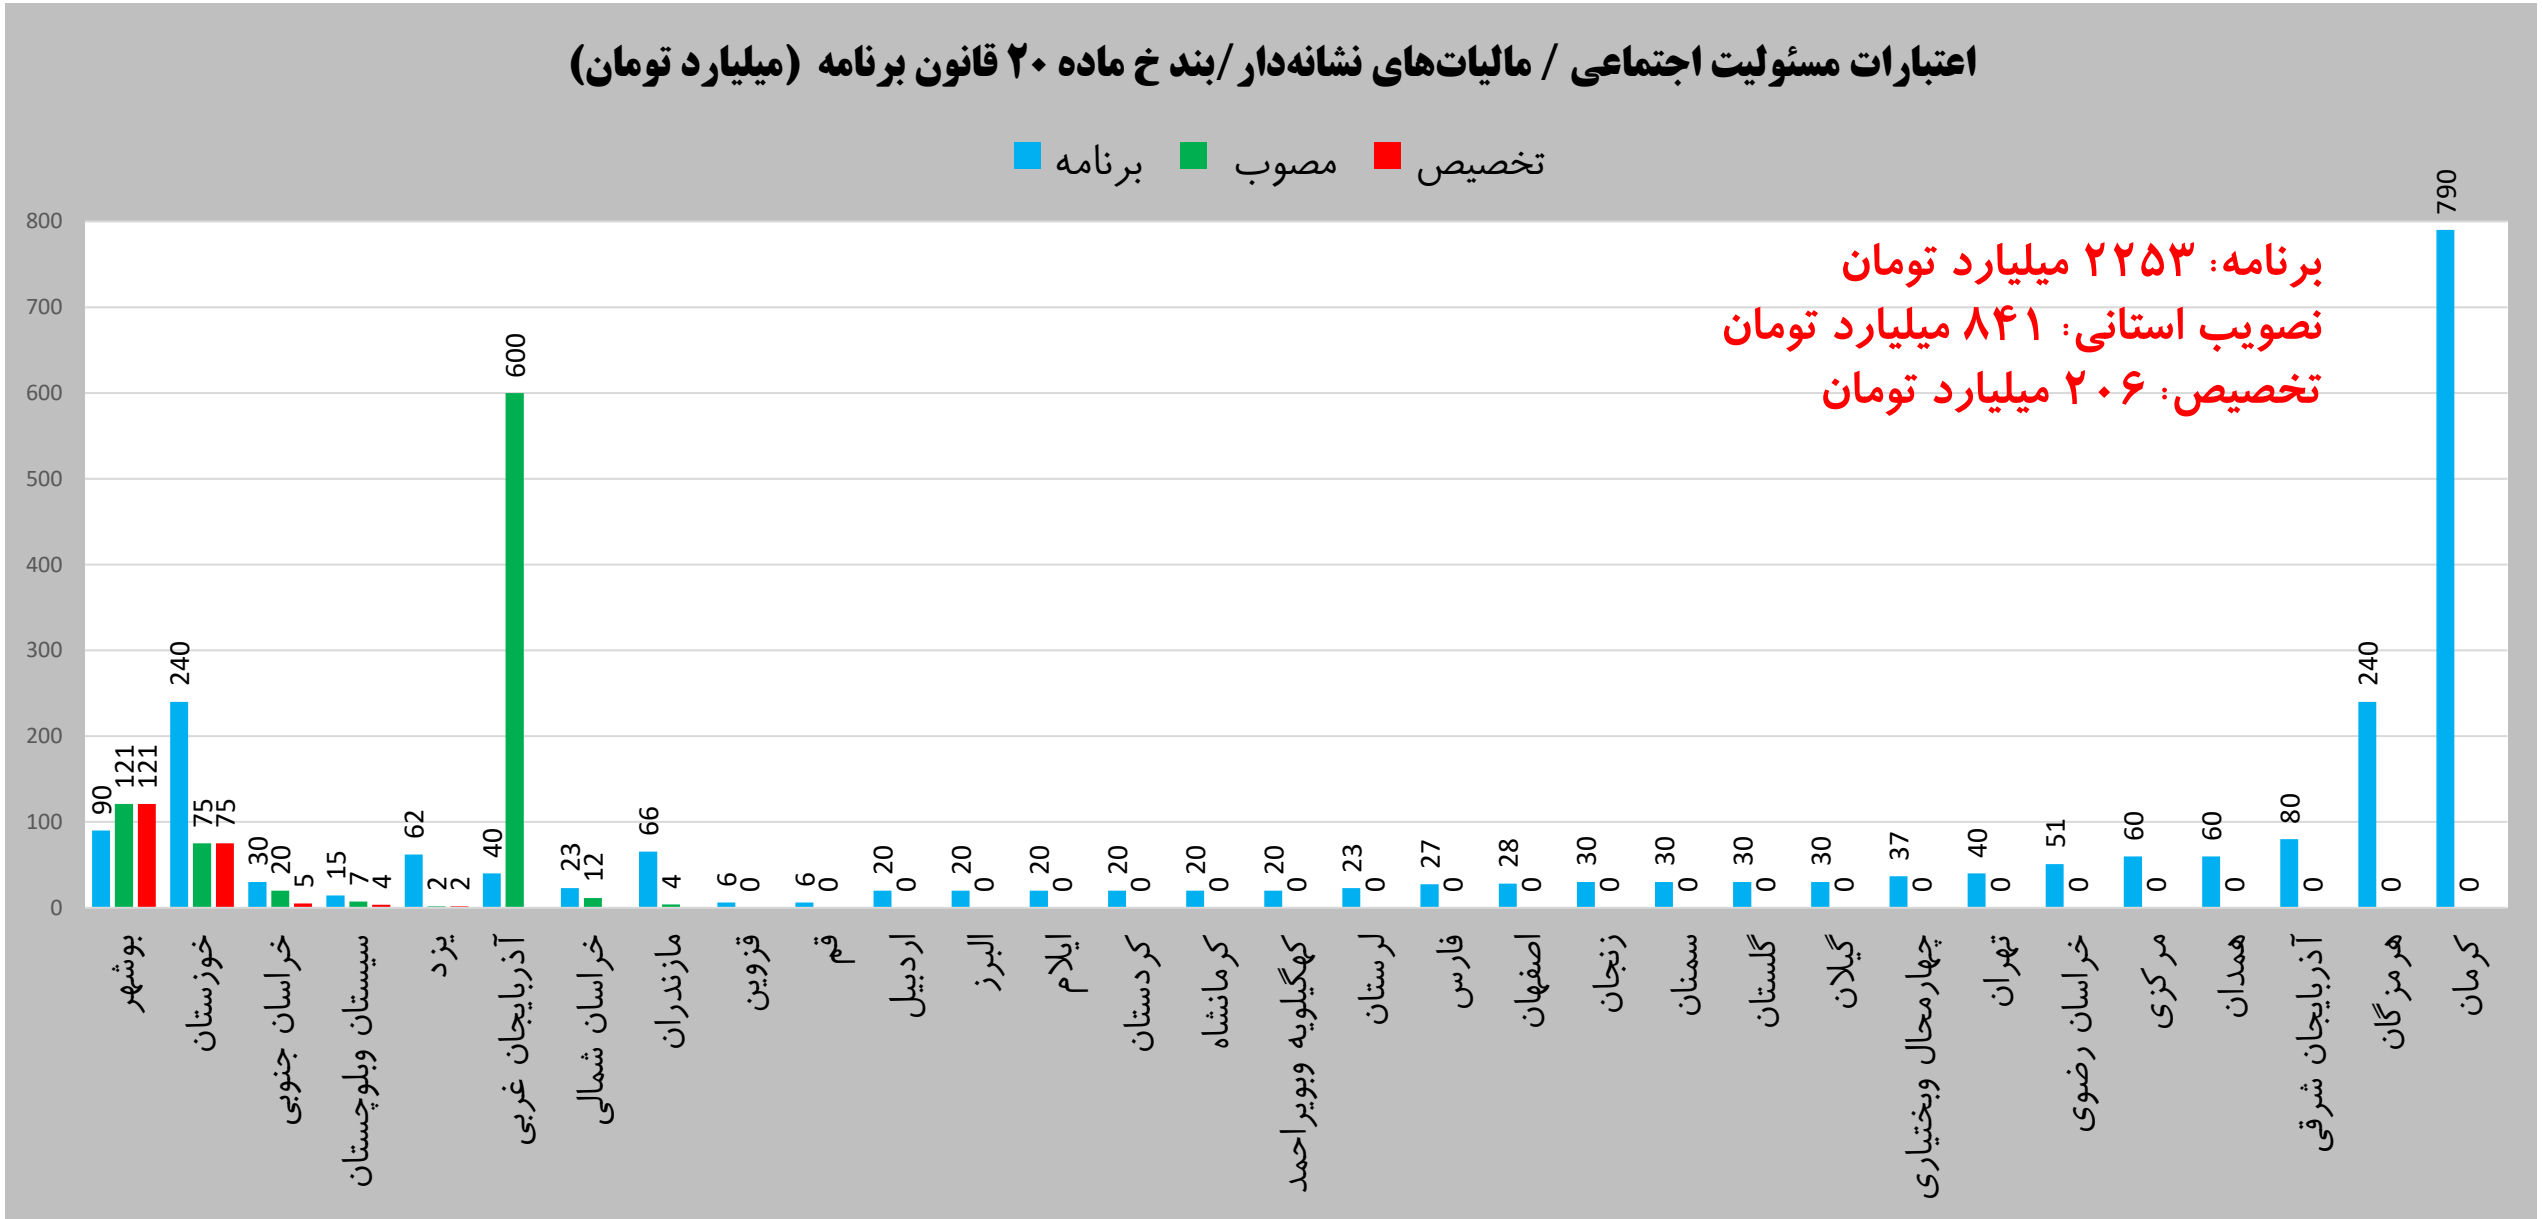

❑ وظایف معاونت امور پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی



بسمه تعالی

(تفاهم‌نامه)

در راستای احیا و توسعه سنت الهی و پسندیده قرض‌الحسنه و به منظور ارائه وام قرض‌الحسنه این تفاهم‌نامه فی‌مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی و کد اقتصادی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲ به نمایندگی آقای منوچهرخواجه دلویی به سمت رئیس که در این تفاهم‌نامه "بنیاد" نامیده می‌شود از یک طرف و بانک قرض‌الحسنه رسالت به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۴۵۱۵۵۴۳ به مدیرعاملی آقای محمدحسین حسین‌زاده که در این تفاهم‌نامه "بانک" نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح ذیل تنظیم و مبادله گردید.

ماده ۱) موضوع تفاهم‌نامه

افتتاح حساب توسط بنیاد نزد بانک و ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای وام قرض‌الحسنه به افراد معرفی شده از طرف بنیاد بر اساس مفاد تفاهم‌نامه و ضوابط و مقررات بانک.

ماده ۲) مدت تفاهم‌نامه

اعتبار این تفاهم‌نامه یک سال شمسی از تاریخ امضای آن می‌باشد که با توافق طرفین برای سال‌های بعد قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳) شرایط تفاهم‌نامه

۳-۱) بنیاد نسبت به افتتاح حساب و تمرکز بخشی از منابع مالی خود نزد بانک اقدام می‌نماید.

۳-۲) بانک طبق ضوابط و مقررات خود نسبت به ارائه تمامی خدمات بانکی اعم از افتتاح حساب جاری یا پس‌انداز، صدور کارت بانکی عضو شتاب و ... به بنیاد و جامعه هدف آن اقدام می‌نماید.

۳-۳) بنیاد نسبت به ترغیب و تشویق کارکنان و جامعه هدف خود جهت تمرکز حساب ایشان در بانک اقدام می‌نماید.

۳-۴) بنیاد حتی‌الامکان نسبت به واریز حقوق کارکنان خود نزد بانک اقدام می‌نماید.

۳-۵) بانک طبق ضوابط و مقررات خود در خصوص سقف مبلغ و مدت می‌تواند در هر ماه حدوداً معادل ۲۰٪ میانگین مانده حساب‌های (جاری یا پس‌انداز) ماه قبل بنیاد را به افراد معرفی شده از سوی بنیاد، وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت دوازده ماهه اقساطی پرداخت نماید.

۳-۵-۱) مبلغ و یا مدت زمان وام‌های قرض‌الحسنه بر اساس نظر بنیاد به تناسب قابل تغییر می‌باشد.

- ۱ -

- ✓ با امضای تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده در روز دوشنبه مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۵ با بانک قرض‌الحسنه رسالت، ماهانه مبلغ ۱۰ میلیارد تومان امتیاز قرض‌الحسنه به طرح خانه امید اختصاص داده شود.
- ✓ به منظور افزایش ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه، مقرر گردید عواید ناشی از فروش زمین در حساب‌های بانک رسالت مشترک بین دفتر مرکزی و بنیاد استان، واریز شود تا جهت پیشبرد عملیات اجرایی طرح خانه امید استفاده گردد.

«دستورالعمل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۵»

موضوع تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک قرض الحسنه رسالت

در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک قرض الحسنه رسالت و با هدف کمک به احداث و تکمیل واحدهای مسکونی مشمول "طرح خانه امید" از طریق پرداخت تسهیلات با استفاده از منابع مالی حساب ۱۰۰ امام(ره) و بانک قرض الحسنه رسالت دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات اعتبار سال ۱۴۰۵، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

ماده ۱ – محدوده مشمول پرداخت تسهیلات :

در کلیه روستاها و شهرها با اولویت ساکنین در مناطق مرزی و کم برخوردارتر.

ماده ۲ –مبلغ و دوره بازپرداخت تسهیلات :

۱-۲- سقف فردی تسهیلات حدکثر تا مبلغ ۲ میلیارد ریال است که پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط آنان توسط شعب بنیاد مسکن، مبلغ تسهیلات تعیین می‌گردد.

تبصره ۱: با عنایت به محدودیت منابع و با رعایت سقف اعتبار تخصیصی، بنیاد مسکن استان در گزینش افراد و تعیین سقف فردی تسهیلات، برنامه ریزی لازم را به نحوی بعمل خواهد آورد تا تعداد بیشتری از افراد حائز شرایط، تحت پوشش تسهیلات مذکور قرار گیرند.

تبصره ۲: شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط، برعهده شعب بنیاد مسکن می‌باشد.

۲-۲- دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۳۶ ماه تعیین می گردد.

ماده ۳ – مشمولین استفاده کننده از تسهیلات :

آن دسته از متقاضیانی که علی رغم استفاده از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و یا بازسازی واحد مسکونی، اقدام به ساخت واحد مسکونی در قالب "طرح خانه امید" نموده و به دلیل مشکلات مالی قادر به **تکمیل و بهره برداری** از آن نمی‌باشند.

تبصره ۳: متقاضیان پس از انجام عملیات سفت کاری و دریافت مرحله سوم تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

تبصره ۴: برای کمک به تکمیل هر واحد مسکونی، فقط ۱ فقره تسهیلات، قابل پرداخت است.

توزیع اعتبار استانی پرداخت تسهیلات تکمیلی به "مشمولین طرح خانه امید"
از طریق بانک رسالت (تا پایان سال ۱۴۰۵)

ردیف	نام استان	اعتبار تخصیصی (میلیون ریال)
	مجموع	۵۰۰,۰۰۰
۱	آذربایجان شرقی	۲۰,۰۰۰
۲	آذربایجان غربی	۲۰,۰۰۰
۳	اردبیل	۱۰,۰۰۰
۴	اصفهان	۲۰,۰۰۰
۵	البرز	۱۰,۰۰۰
۶	ایلام	۱۰,۰۰۰
۷	بوشهر	۲۰,۰۰۰
۸	تهران	۱۰,۰۰۰
۹	چهارمحال وبختیاری	۲۰,۰۰۰
۱۰	خراسان جنوبی	۲۰,۰۰۰
۱۱	خراسان رضوی	۲۰,۰۰۰
۱۲	خراسان شمالی	۲۰,۰۰۰
۱۳	خوزستان	۲۰,۰۰۰
۱۴	زنجان	۲۰,۰۰۰
۱۵	سمنان	۱۰,۰۰۰
۱۶	سیستان وبلوچستان	۲۰,۰۰۰
۱۷	فارس	۲۰,۰۰۰
۱۸	قزوین	۲۰,۰۰۰
۱۹	قم	۱۰,۰۰۰
۲۰	کردستان	۱۰,۰۰۰
۲۱	کرمان	۲۰,۰۰۰
۲۲	کرمانشاه	۱۰,۰۰۰
۲۳	کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰
۲۴	گلستان	۲۰,۰۰۰
۲۵	گیلان	۲۰,۰۰۰
۲۶	لرستان	۱۰,۰۰۰
۲۷	مازندران	۲۰,۰۰۰
۲۸	مرکزی	۱۰,۰۰۰
۲۹	هرمزگان	۲۰,۰۰۰
۳۰	همدان	۲۰,۰۰۰
۳۱	یزد	۱۰,۰۰۰

❑ وظایف معاونت امور پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
شماره: ۰۵/۵۹۱۰۳/۳۹۹۴۰/ص
پیوست: دارد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حساب ۱۰۰/۱ام
دفتر مرکزی

"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"

جناب آقای مقصودی
رئیس محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه فاطمی ۳۰۱۵

با سلام

احتراماً ضمن قدردانی از تعامل ارزنده جنابعالی و همکاران محترم در راستای نیل به اهداف تبیین شده در تفاهم نامه های همکاری مشترک فی مابین طی سنوات گذشته، با عنایت به نامه شماره ۰۵/۴۹۱۰۱/۵۴۰۳۷/د مورخه ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ و شماره ۱۶۶۱/م/د مورخه ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ مدیرکل محترم امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیرو هماهنگی اخیر بعمل آمده با هدف کمک به تکمیل و بهره برداری از واحدهای مسکونی در قالب تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات قرض الحسنه با دوران بازپرداخت ۳۶ ماهه، به پیوست دستورالعمل پرداخت تسهیلات مذکور در ۴ ماده و ۸ تبصره به همراه ۱ برگ توزیع اعتبار استانی، جهت استحضار، هرگونه هماهنگی و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

شایان ذکر است :

الف-اطلاعات مشمولین متعاقباً از طریق وب سرویس دفتر مسکن روستایی، ارسال خواهد گردید.

ب- پس از واریز تسهیلات توسط آن شعبه به حساب بانکی مشمولین، آزادسازی مراحل تسهیلات در قالب صدور معرفی نامه توسط شعب شهرستانی بنیاد مسکن، صورت خواهد پذیرفت.

سید رضا حمیدی
مدیر کل مسکن روستایی

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
شماره: د/م/۱۶۶۱
پیوست: .....

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حساب ۱۰۰/۱ام

رئیس محترم بانک قرض الحسنه مهرایران شعبه فاطمی ۳۰۱۵

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۰۵/۴۹۱۰۱/۵۴۰۳۷/د مورخه ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ به دفتر مسکن روستایی، به استحضار می رساند ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به آن دفتر، مازاد بر تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ و از محل امتیاز دفتر مرکزی بنیاد مسکن نزد آن بانک می باشد.

شایان ذکر است اطلاعات مشمولین نیز متعاقباً توسط همان دفتر و از طریق وب سرویس به بانک ارسال خواهد گردید.

عباس بوربور جام بزرگی
مدیرکل امور مالی

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
شماره: ۰۵/۴۹۱۰۱/۵۴۰۳۷/د
پیوست: ندارد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حساب ۱۰۰/۱ام
دفتر مرکزی

"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"

جناب آقای حمیدی
مدیرکل محترم دفتر مسکن روستایی
موضوع : تخصیص تسهیلات قرض الحسنه مربوط به طرح خانه امید

با سلام و احترام

با عنایت به دستور ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی طرح خانه امید (مفاد بند ۱۱) به استحضار می‌رساند؛ تخصیص مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات قرض الحسنه مهر ایران با مهلت بازپرداخت ۳۶ ماهه جهت استفاده افراد واجدالشرایط طرح خانه امید از محل گردش و اعتبار حساب‌های بانکی برنامه‌ریزی گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم صورت پذیرد.

عباس بوربور جام بزرگی
مدیرکل امور مالی

❑ وظایف معاونت بازسازی و مسکن روستایی

توزیع اعتبار استانی پرداخت تسهیلات تکمیلی به "مشمولین طرح خانه امید" از طریق بانک قرض الحسنه مهرایران (اعتبار سال ۱۴۰۵)		
ردیف	نام استان	اعتبار تخصیصی (میلیون ریال)
	مجموع	**۵۰۰,۰۰۰**
۱	آذربایجان شرقی	۲۰,۰۰۰
۲	آذربایجان غربی	۴۰,۰۰۰
۳	اردبیل	۱۵,۰۰۰
۴	اصفهان	۱۵,۰۰۰
۵	البرز	۱۰,۰۰۰
۶	ایلام	۱۵,۰۰۰
۷	بوشهر	۱۵,۰۰۰
۸	تهران	۱۰,۰۰۰
۹	چهارمحال وبختیاری	۱۵,۰۰۰
۱۰	خراسان جنوبی	۲۰,۰۰۰
۱۱	خراسان رضوی	۲۰,۰۰۰
۱۲	خراسان شمالی	۲۰,۰۰۰
۱۳	خوزستان	۲۰,۰۰۰
۱۴	زنجان	۱۵,۰۰۰
۱۵	سمنان	۱۰,۰۰۰
۱۶	سیستان وبلوچستان	۲۰,۰۰۰
۱۷	فارس	۲۰,۰۰۰
۱۸	قزوین	۱۵,۰۰۰
۱۹	قم	۱۰,۰۰۰
۲۰	کردستان	۱۵,۰۰۰
۲۱	کرمان	۲۰,۰۰۰
۲۲	کرمانشاه	۱۵,۰۰۰
۲۳	کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰
۲۴	گلستان	۱۵,۰۰۰
۲۵	گیلان	۱۵,۰۰۰
۲۶	لرستان	۱۰,۰۰۰
۲۷	مازندران	۱۵,۰۰۰
۲۸	مرکزی	۱۵,۰۰۰
۲۹	هرمزگان	۱۵,۰۰۰
۳۰	همدان	۱۵,۰۰۰
۳۱	یزد	۱۵,۰۰۰

بسمه تعالی

«دستورالعمل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۵»
موضوع تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک قرض الحسنه مهر ایران

در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک قرض‌الحسنه مهرایران و با هدف کمک به احداث و تکمیل واحدهای مسکونی مشمول "طرح خانه امید" از طریق پرداخت تسهیلات با استفاده از منابع مالی حساب ۱۰۰ امام (ره) و بانک قرض‌الحسنه مهرایران دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات اعتبار سال ۱۴۰۵، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

ماده ۱ – ممدوده مشمول پرداخت تسهیلات :

این تسهیلات در کلیه روستاها و شهرها با اولویت ساکنین در مناطق مرزی و کم برخوردارتر، قابل پرداخت است.

ماده ۲ – شرایط، سقف تسهیلات و دوره بازپرداخت :

۲-۱- سقف فردی تسهیلات مبلغ ۱ میلیارد ریال است که پس از بررسی درخواست متقاضیان توسط شعب بنیاد مسکن و احراز شرایط نامبردگان، میزان آن تعیین و به بانک اعلام می‌گردد.

تبصره ۱: با عنایت به محدودیت منابع و با رعایت سقف اعتبار تخصیصی، بنیاد مسکن استان در گزینش افراد و تعیین سقف فردی تسهیلات، برنامه ریزی لازم را به نحوی بعمل خواهد آورد تا تعداد بیشتری از افراد حائز شرایط، تحت پوشش تسهیلات مذکور قرار گیرند.

تبصره ۲: شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط، صرفاً برعهده شعب بنیاد مسکن می‌باشد.

۲-۲- دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۳۶ ماه و با اعلام شعب بنیاد مسکن تعیین می گردد.

تبصره ۳: همزمان با واریز تسهیلات به حساب متقاضیان، بانک نسبت به فروش اقساطی تسهیلات اقدام می نماید.

ماده ۳ – مشمولین استفاده کننده از تسهیلات قرض‌المسنه :

آن دسته از متقاضیانی که علی رغم استفاده از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و یا بازسازی واحد مسکونی، اقدام به ساخت واحد مسکونی در قالب "طرح خانه امید" نموده و به دلیل مشکلات مالی و ... قادر به **تکمیل و بهره برداری** از آن نمی‌باشند.

❑ وظایف معاونت امور پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی

سرفصل اعتبار بلاعوض	میزان (میلیارد تومان)
نیم درصد عواید حاصل از فروش زمین	۱۷۷= ۱۰۸+۶۹
عواید حاصل از تخصیص قیر یارانه‌دار	۳۰۰ = ۲۷۶+۲۴
سهم حساب ۱۰۰ از درآمدهای سال ۱۴۰۴ شرکتهای تابعه	۱۰۶۹ = ۵۷۲+۴۹۷
معادل یک برابر آورده نقدی خیرین	۳۲۱ =۲۶۷ +۱۰+۴۴
مانده تفاهم‌نامه‌های سازمان برنامه	۱۲۰ = ۲۰.۲+۵۶.۸+۴۳
نیم درصد حاصل از سود بانک‌ها	۳.۳
باقیمانده موافقتنامه روستایی سال ۱۴۰۴ نزد پشتیبانی (و انتقالی از ذیحسابی)	۱۹۵
باقیمانده موافقتنامه شهری سال ۱۴۰۴ نزد شرکت سرمایه‌گذاری	۱۷۳
	۲۷ مصالح
مجموع	**۲۳۳۴.۳**


رنگ سبز: اعتبارات پرداخت شده
رنگ آبی: اعتبارات در انتظار پرداخت
رنگ قرمز: اعتبارات پرداخت نشده

❑ وظایف معاونت امور پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی


مبالغ به میلیارد تومان

ماه	پیشرفت فیزیکی طرح (تعداد واحد شهری غیر تحت پوشش)	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت تجمعی فیزیکی طرح	درصد جذب	برنامه تجمعی کل اعتبار مورد نیاز	برنامه اعتبار مورد نیاز	برنامه تجمعی اعتبار مورد نیاز از محل حساب ۱۰۰	تخصیص اعتبار توسط معاونت پشتیبانی	تخصیص تجمعی اعتبار توسط معاونت پشتیبانی
خرداد	۹۱۴	٪۲	٪۲	٪۴	۹۳۸	۹۳	۹۳	۰.۰	۰
تیر	۲۷۴۱	٪۶	٪۸	٪۱۲	۳,۷۵۱	۲۸۰	۳۷۳	۱۵۶.۸	۱۵۷
مرداد	۲۷۴۱	٪۶	٪۱۴	٪۱۲	۶,۵۶۴	۲۸۰	۶۵۴	۲۴۰.۲	۳۹۷
شهریور	۲۷۴۱	٪۶	٪۲۰	٪۱۲	۹,۳۷۶	۲۸۰	۹۳۴	۱۶۲	۵۵۹
مهر	۲۷۴۱	٪۶	٪۲۶	٪۱۲	۱۲,۱۸۹	۲۸۰	۱,۲۱۴	۵۶۵.۹	۱۱۲۴.۶
آبان	۲۷۴۱	٪۶	٪۳۲	٪۱۲	۱۵,۰۰۲	۲۸۰	۱,۴۹۴		
آذر	۲۷۴۱	٪۶	٪۳۸	٪۱۲	۱۷,۸۱۵	۲۸۰	۱,۷۷۴		
دی	۱۸۲۷	٪۴	٪۴۲	٪۸	۱۹,۶۹۱	۱۸۷	۱,۹۶۱		
بهمن	۱۸۲۷	٪۴	٪۴۶	٪۸	۲۱,۵۶۶	۱۸۷	۲,۱۴۸		
اسفند	۱۸۲۷	٪۴	٪۵۰	٪۸	۲۳,۴۴۱	۱۸۷	۲,۳۳۴		
مجموع	۲۲۸۴۰			٪۱۰۰	-	۲۳۳۴	-	۱۱۲۵	-

برنامه زمانبندی کل اعتبارات مورد نیاز

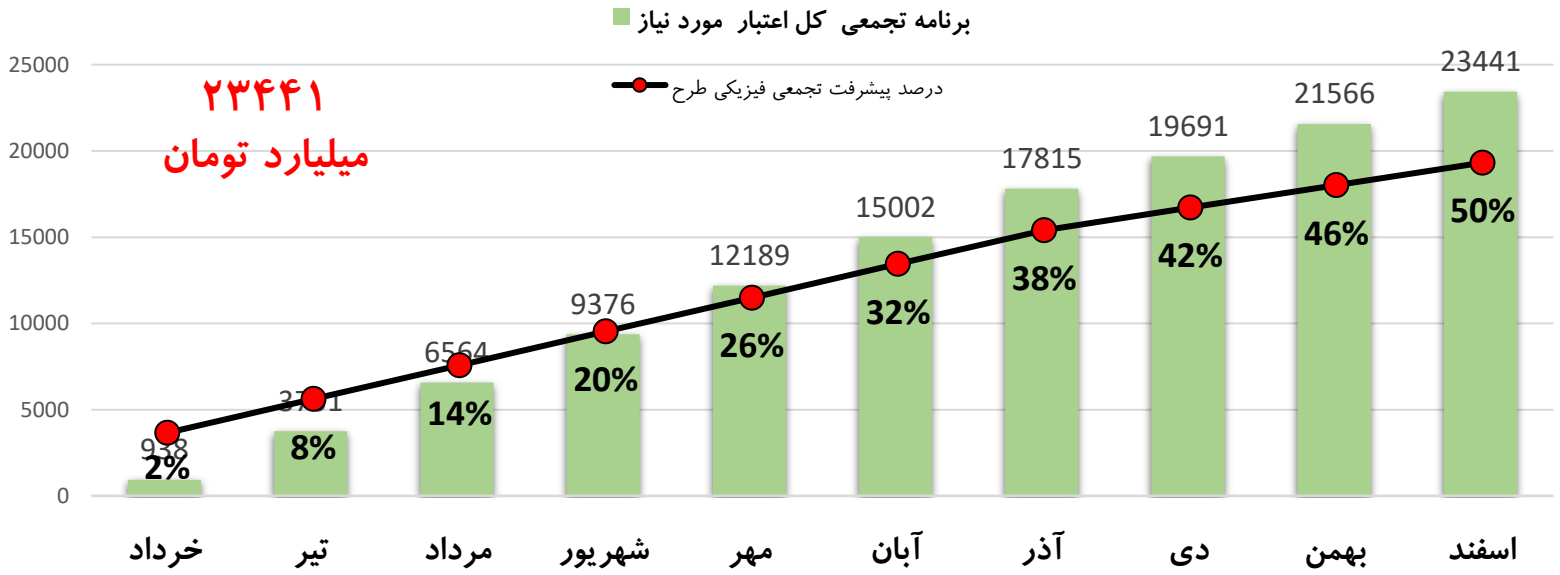

برنامه زمانبندی منابع مالی مورد نیاز از محل حساب ۱۰۰ و تخصیص

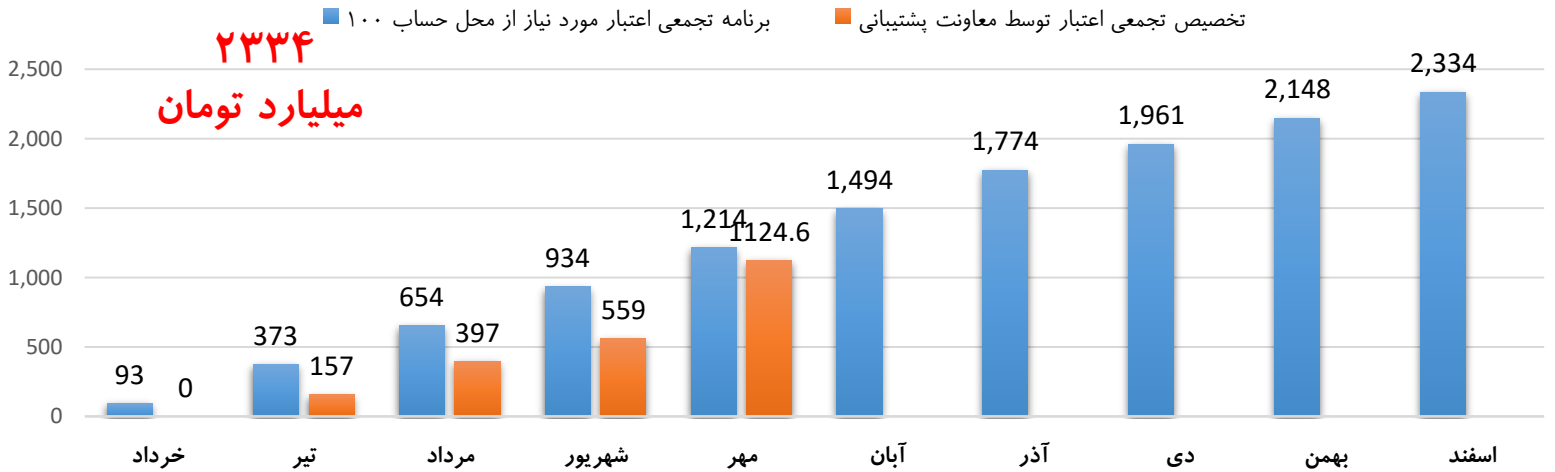

❑ وظایف دفتر امور شرکتها و مجامع

✓ به منظور استفاده از ظرفیت بدهی شرکت‌های تابعه به حساب ۱۰۰ حضرت امام در طرح خانه امید، پیرو چارچوب تهیه شده چگونگی استفاده از ظرفیت شرکت‌های تابعه و هلدینگ نوسازی و عمران تهران، مقرر گردید در قراردادهای فی‌مابین بنیاد استان‌ها و شرکت‌های تابعه، سهم بدهی شرکت‌های تابعه مشخص شود و برنامه تأمین مالی مازاد بر سهم بدهی شرکت‌ها پیش‌بینی گردد.

استان	نام پروژه	شرکت طرف قرارداد	سهم شرکت (میلیون ریال)		تعداد واحد
مجموع			۴,۹۶۸,۹۴۸		۴,۴۵۳
قم	۱۲۰ واحدی آفرینش ۱	ایجاد محیط (تجهیز محیط)	۳۹۳,۶۵۹	۸۴۹,۹۵۹	۱۲۰
قم	۱۴۰ واحدی زیتون ۱۱	ایجاد محیط (تجهیز محیط)	۴۵۶,۳۰۰		۱۴۰
فارس	۹۲ واحدی شیراز	توسعه مسکن	۲۷۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۹۱	۹۲
کرمانشاه	۶۴ واحدی ماهیدشت	توسعه مسکن	۵۲,۰۰۰		۶۴
خراسان رضوی	۵۰ واحدی اسماعیل آباد	توسعه مسکن	۵۱۸,۷۹۱		۵۰
اصفهان	پروژه های خانه امید	سیمان شهرکرد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰
چهارمحال و بختیاری					۶۵۰
خوزستان					۹۰۰
فارس					۵۰۰
کهگیلویه و بویراحمد					۲۵۰
لرستان					۲۰۰
مرکزی					۵۵۰
البرز	۹۷ واحدی نظرآباد	نوسازی و عمران تهران (سامان محیط)	۷۱۸,۱۹۸	۱,۷۷۸,۱۹۸	۹۷
همدان	۱۴۰واحدی شورین	نوسازی و عمران تهران (سامان محیط)	۱,۰۶۰,۰۰۰		۱۴۰

❑ وظایف دفتر امور شرکتها و مجامع

✓ از پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵ تسهیلات قرض‌الحسنه از محل رسوب اعتبار شرکتهای تابعه، در مرحله نخست ماهانه ۲۵ فقره تسهیلات با سقف فردی تا ۲۰۰ میلیون تومان با دوران بازپرداخت ۳۶ ماهه (۱۵۰ فقره در ۶ ماه) از طریق معاونت پشتیبانی در اختیار دفتر مسکن روستایی قرار بگیرد تا نسبت به توزیع استانی و هزینه کرد آن مطابق با عملکرد طرح خانه امید اقدام نماید.



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای قلی نواز
مدیر عامل محترم شرکت سازمان توسعه مسکن ایران

جناب آقای کمائی
مدیر عامل محترم شرکت بنیاد بتن ایران

مدیرعامل محترم شرکت ایجادمحیط

موضوع: تخصیص تسهیلات قرض الحسنه مربوط به طرح خانه امید

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به دستور ریاست محترم بنیاد مسکن و همچنین مصوبه دهمین جلسه هماهنگی طرح خانه امید (مفاد بند ۱۰) در خصوص الزام به تخصیص ماهانه تسهیلات قرض الحسنه ۲ میلیارد ریالی با بازپرداخت سه ساله جهت استفاده افراد واجد شرایط طرح خانه امید از محل گردش و اعتبار حسابهای بانکی آن شرکت مقرر شد از مهرماه سال جاری تا انتهای سال هر ماه ۴ فقره تسهیلات با مشخصات فوق الذکر را برنامه ریزی و در اختیار این اداره کل جهت اختصاص به متقاضیان مربوط به طرح خانه امید قرار دهید.

لذا مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

سعید سافیان
مشاور رئیس و مدیرکل امور شرکتها و مجامع

رونوشت:
- جناب آقای مهندس خواجه دلویی؛ رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت استحضار



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای حیدری ابیانه
مدیرعامل محترم شرکت نوسازی و عمران تهران

جناب آقای میکائیل وند
مدیرعامل محترم شرکت صنایع سیمان شهر کرد

موضوع: تخصیص تسهیلات قرض الحسنه مربوط به طرح خانه امید

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به دستور ریاست محترم بنیاد مسکن و همچنین مصوبه دهمین جلسه هماهنگی طرح خانه امید (مفاد بند ۱۰) در خصوص الزام به تخصیص ماهانه تسهیلات قرض الحسنه ۲ میلیارد ریالی با بازپرداخت سه ساله جهت استفاده افراد واجد شرایط طرح خانه امید از محل گردش و اعتبار حسابهای بانکی آن شرکت مقرر شد از مهرماه سال جاری تا انتهای سال هر ماه ۵ فقره تسهیلات با مشخصات فوق الذکر را برنامه ریزی و در اختیار این اداره کل جهت اختصاص به متقاضیان مربوط به طرح خانه امید قرار دهید.

لذا مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

سعید سافیان
مشاور رئیس و مدیرکل امور شرکتها و مجامع



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای انصاری
مدیرعامل محترم شرکت آزاد راه اهواز–بندر امام(ره)

جناب آقای زنگانه
مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

موضوع: تخصیص تسهیلات قرض الحسنه مربوط به طرح خانه امید

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به دستور ریاست محترم بنیاد مسکن و همچنین مصوبه دهمین جلسه هماهنگی طرح خانه امید (مفاد بند ۱۰) در خصوص الزام به تخصیص ماهانه تسهیلات قرض الحسنه ۲ میلیارد ریالی با بازپرداخت سه ساله جهت استفاده افراد واجد شرایط طرح خانه امید از محل گردش و اعتبار حسابهای بانکی آن شرکت مقرر شد از مهرماه سال جاری تا انتهای سال هر ماه ۲ فقره تسهیلات با مشخصات فوق الذکر را برنامه ریزی و در اختیار این اداره کل جهت اختصاص به متقاضیان مربوط به طرح خانه امید قرار دهید.

لذا مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

سعید سافیان
مشاور رئیس و مدیرکل امور شرکتها و مجامع

رونوشت:
- جناب آقای مهندس خواجه دلویی؛ رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت استحضار

❑ وظایف دفتر امور شرکتها و مجامع

صنایع سیمان شهرکرد
(شرکت سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

شماره : ۱۴۰۵/۱۸۰۷۴/ت
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
پیوست : دارد

جناب آقای بوربور
مدیرکل محترم امورمالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره ۶۱۷۲۶ /۰۵/۵۹۱۰۳/ د مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ به پیوست یک فقره قبض واریزی به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) به شماره کد پیگیری ۱۴۰۵۰۸۰۲۰۱۲۱۰۰۹۱۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ثبت در حسابهای فی مابین اقدام نمایند.

شهرام میکائیل وند
مدیرعامل

بسمه تعالی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حساب ۱۰۰ امام
دفتر مرکزی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
شماره: ۰۵/۵۹۱۰۳/۶۱۷۲۶/د
پیوست: ندارد

"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"

جناب آقای میکائیل وند
مدیرعامل محترم شرکت صنایع سیمان شهر کرد

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۰۵/۱۷۷۹۲/ت مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ درخصوص اعلام مانده بدهی آن شرکت به حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره)، با عنایت به توافقات صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ در محل شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به واریز مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) (شماره حساب ۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۵ نزد بانک ملی ایران) اقدام و نتیجه را به این دفتر منعکس نمایند.

مجید جودی
معاون بازسازی و مسکن روستایی

2064779671

❑ وظایف هلدینگ عمران و نوسازی تهران

پروژه طرح خانه امید در هشتگرد و تخصیص زمین در شهر جدید مهستان استان البرز به مساحت تقریبی ۳.۳ هکتار با ظرفیت ساخت حدوداً ۲۴۰ واحد مسکونی.

به منظور بهینه‌سازی استفاده از زمین، از طریق شرکت مشاور در حال بازطراحی قطعات متناسب با طرح خانه امید و همچنین پلان معماری است.

کاربری	مساحت هکتار	تعداد قطعه
مجموع	۳.۳	۲۴
مسکونی	۱.۵	۲۲
تجاری	۰.۱۳	۲
فضای سبز	۱.۱	–
معابر	۰.۶	–

متوسط مساحت هر قطعه زمین ۶۸۰ مترمربع



طرح پیشنهادی	تعداد طبقه	تعداد واحد در هر طبقه	تعداد واحد در هر قطعه	میانگین متراژ واحد ها	مساحت سطح اشغال	کل زیر بنا(متر مربع)	تعداد واحد ها در کل قطعات	توضیحات
طرح شماره ۱	۳	۴	۱۲	۶۳	۲۷۹	۸۳۷	۲۴۰	
طرح شماره ۲	۲	۴	۸	۶۳	۲۷۹	۵۵۸	۱۶۰	
طرح شماره ۳	۳	۲	۶	۵۸	۱۴۵.۵	۴۳۶.۵	۲۴۰	با توجه به عرض ۲۱ متر زمین می توان زمین را به دو قسمت در جهت عرض تقسیم و در حین اجرا نسبت به اصلاح سند قطعه اقدام کرد و از مزایای ان با توجه به برنامه اجرا یی بصورت گروه ساخت نهایتا درهر قسمت ۶ متقاضی تخیص می یابد

❑ وظایف هلدینگ نوسازی و عمران تهران

پیرو تبصره بند ۷ چارچوب استفاده از ظرفیت هلدینگ نوسازی و عمران تهران به منظور تعیین قیمت روز زمین ۳.۳ هکتاری هشتگرد، کمیته‌ای ۲ نفره متشکل از نماینده هلدینگ نوسازی و عمران تهران و نماینده معاونت بازسازی و مسکن روستایی جهت تعیین قیمت روز زمین علاوه بر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد.

شماره: ۱۴۰۵/ص/۴۳۱
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
پیوست: ندارد

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۷۴۵۰۶

شرکت نوسازی و عمران تهران

جناب آقای مهندس جودی
معاون محترم امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوع: ارزشگذاری زمین در طرح خانه امید

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۵/۷/۲۶ مورخ ۰۵/۵۹۱۰۳/۶۷۵۸۱/د پیشنهاد می گردد ارزشگذاری املاک در حال واگذاری جهت طرح خانه امید در چارچوب کمیته ای دو نفره از نمایندگان این شرکت و معاونت جنابعالی و بر مبنای گزارش کارشناسی دادگستری استخراج و ملاک عمل قرار گیرد. لذا در صورت موافقت ضمن درخواست معرفی نماینده آن معاونت محترم، جناب آقای محمد مهجوری به عنوان نماینده شرکت معرفی می گردد.

محمدرضا حیدری ابیانه
مدیرعامل

2064779671

❑ دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰


✓ **مانده مطالبات دفتر مشارکت های مردمی نزد پشتیبانی (مجموعاً ۸۲۰ میلیارد ریال)**

واریزی نقدی خیرین به حساب ۱۰۰	۷۰۸ میلیارد ریال
واریزی به حساب استانها	۳۲۶ میلیارد ریال
مانده	**۳۸۲ میلیارد ریال**

تعهد بنیاد مسکن در ازای کمک خیرین	۵۴۰ میلیارد ریال
واریزی به حساب استانها	۱۰۱ میلیارد ریال
مانده	**۴۳۹ میلیارد ریال**


❑ دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰

✓ گزارش در خصوص میزان اعتبار جذب شده کمک‌های نقدی (میلیارد ریال)

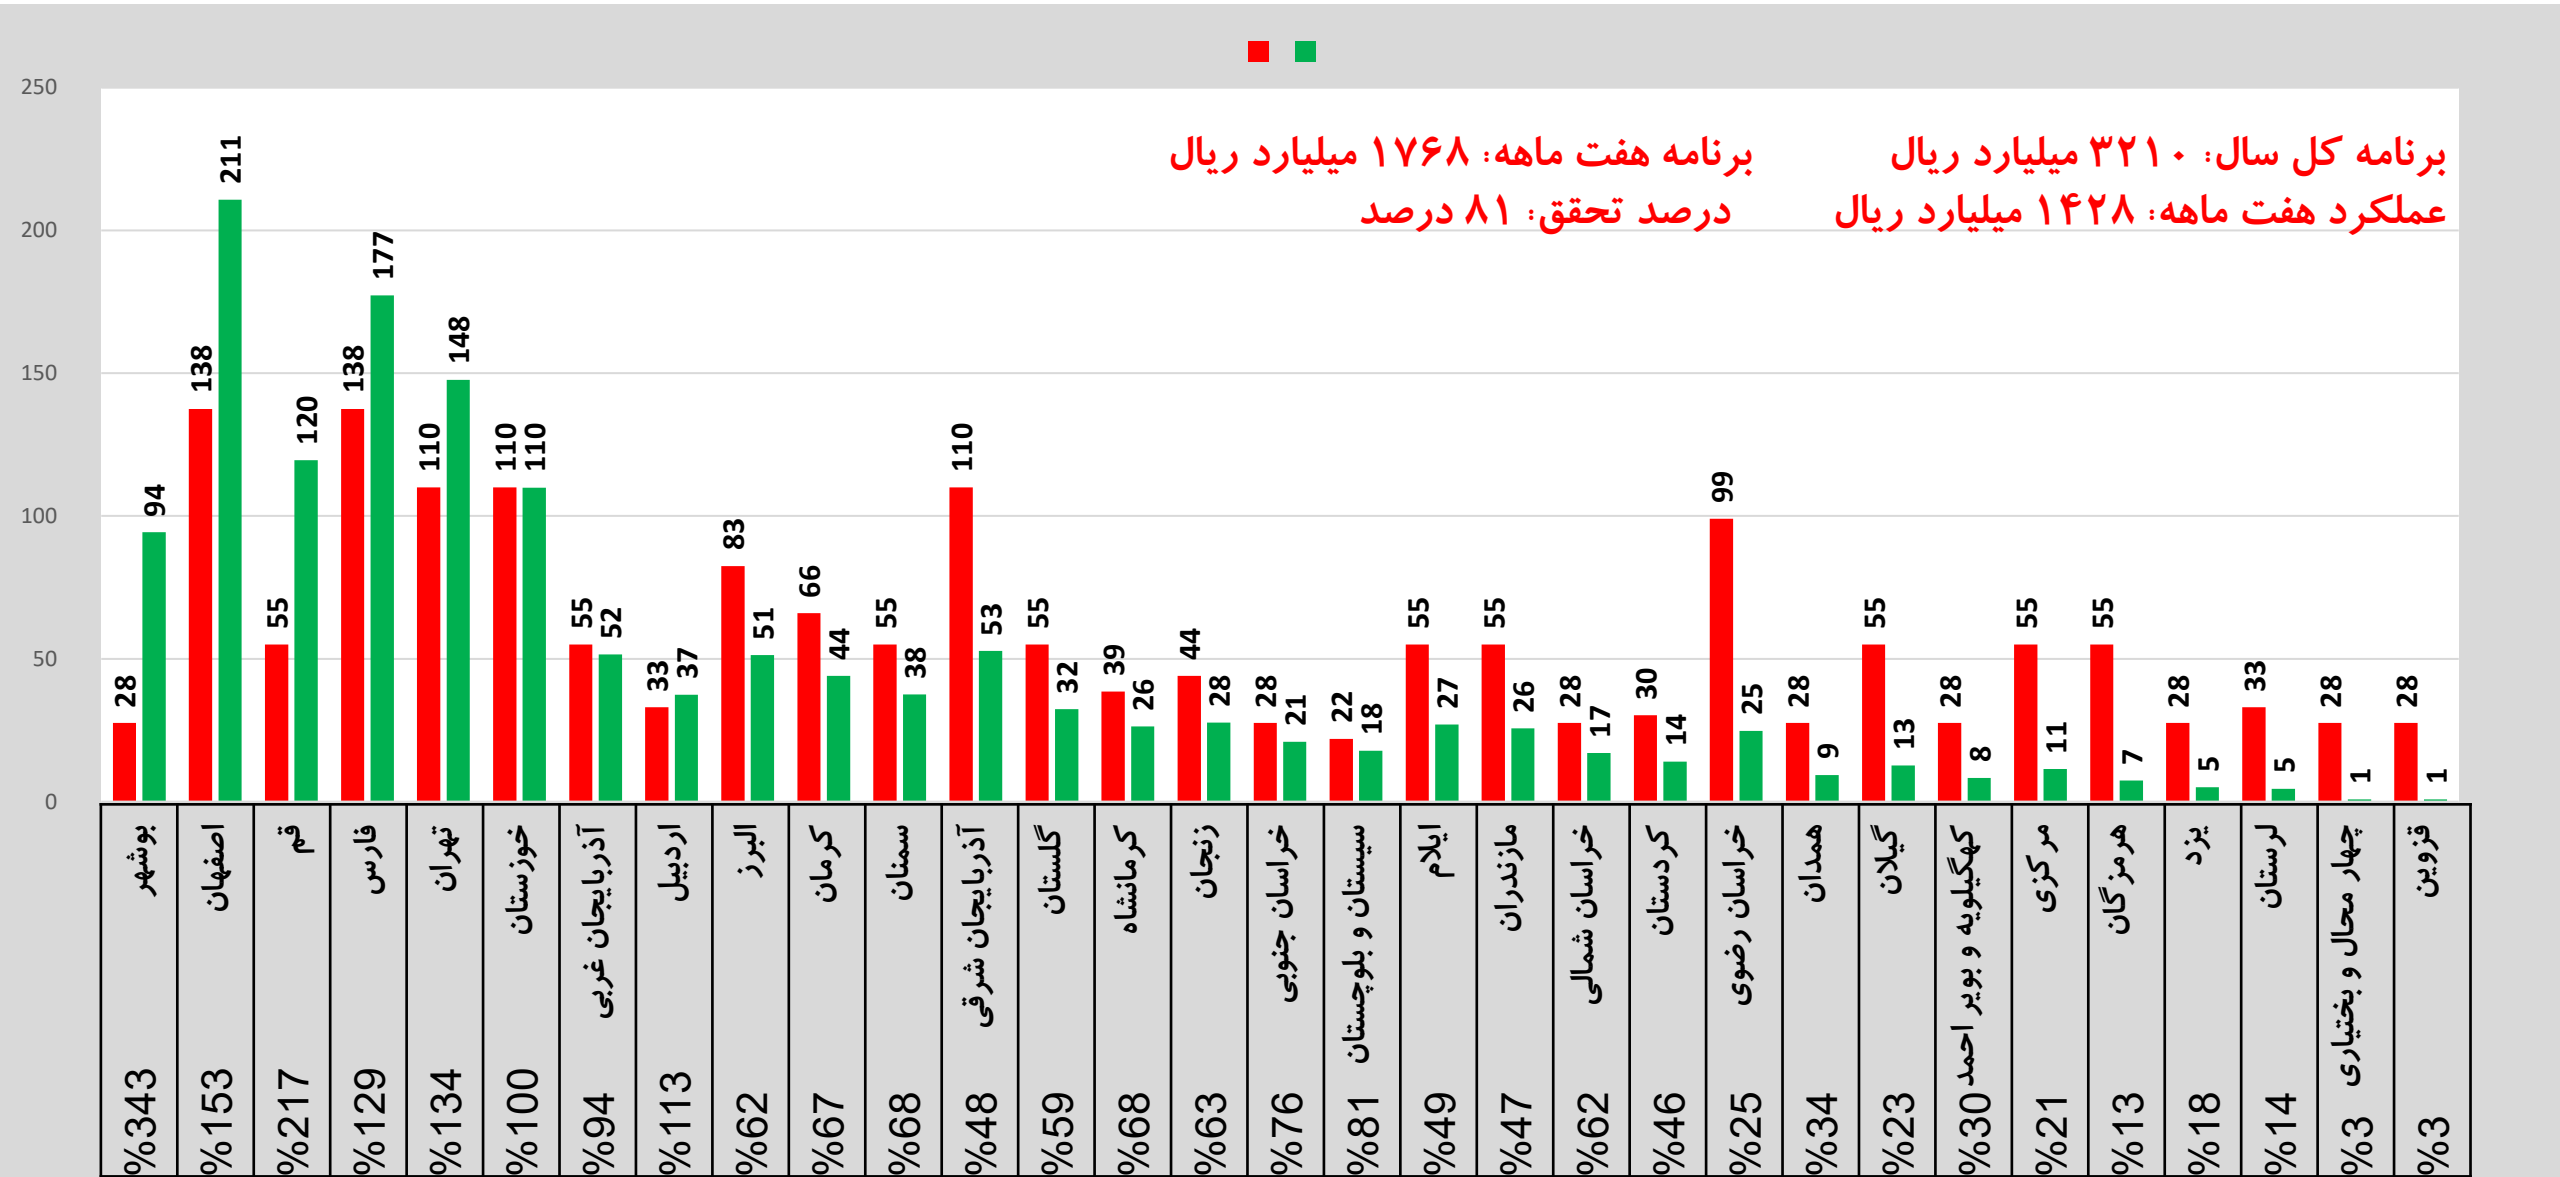

❑ دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰

✓ گزارش در خصوص میزان اعتبار جذب شده کمک‌های غیرنقدی (میلیارد ریال)

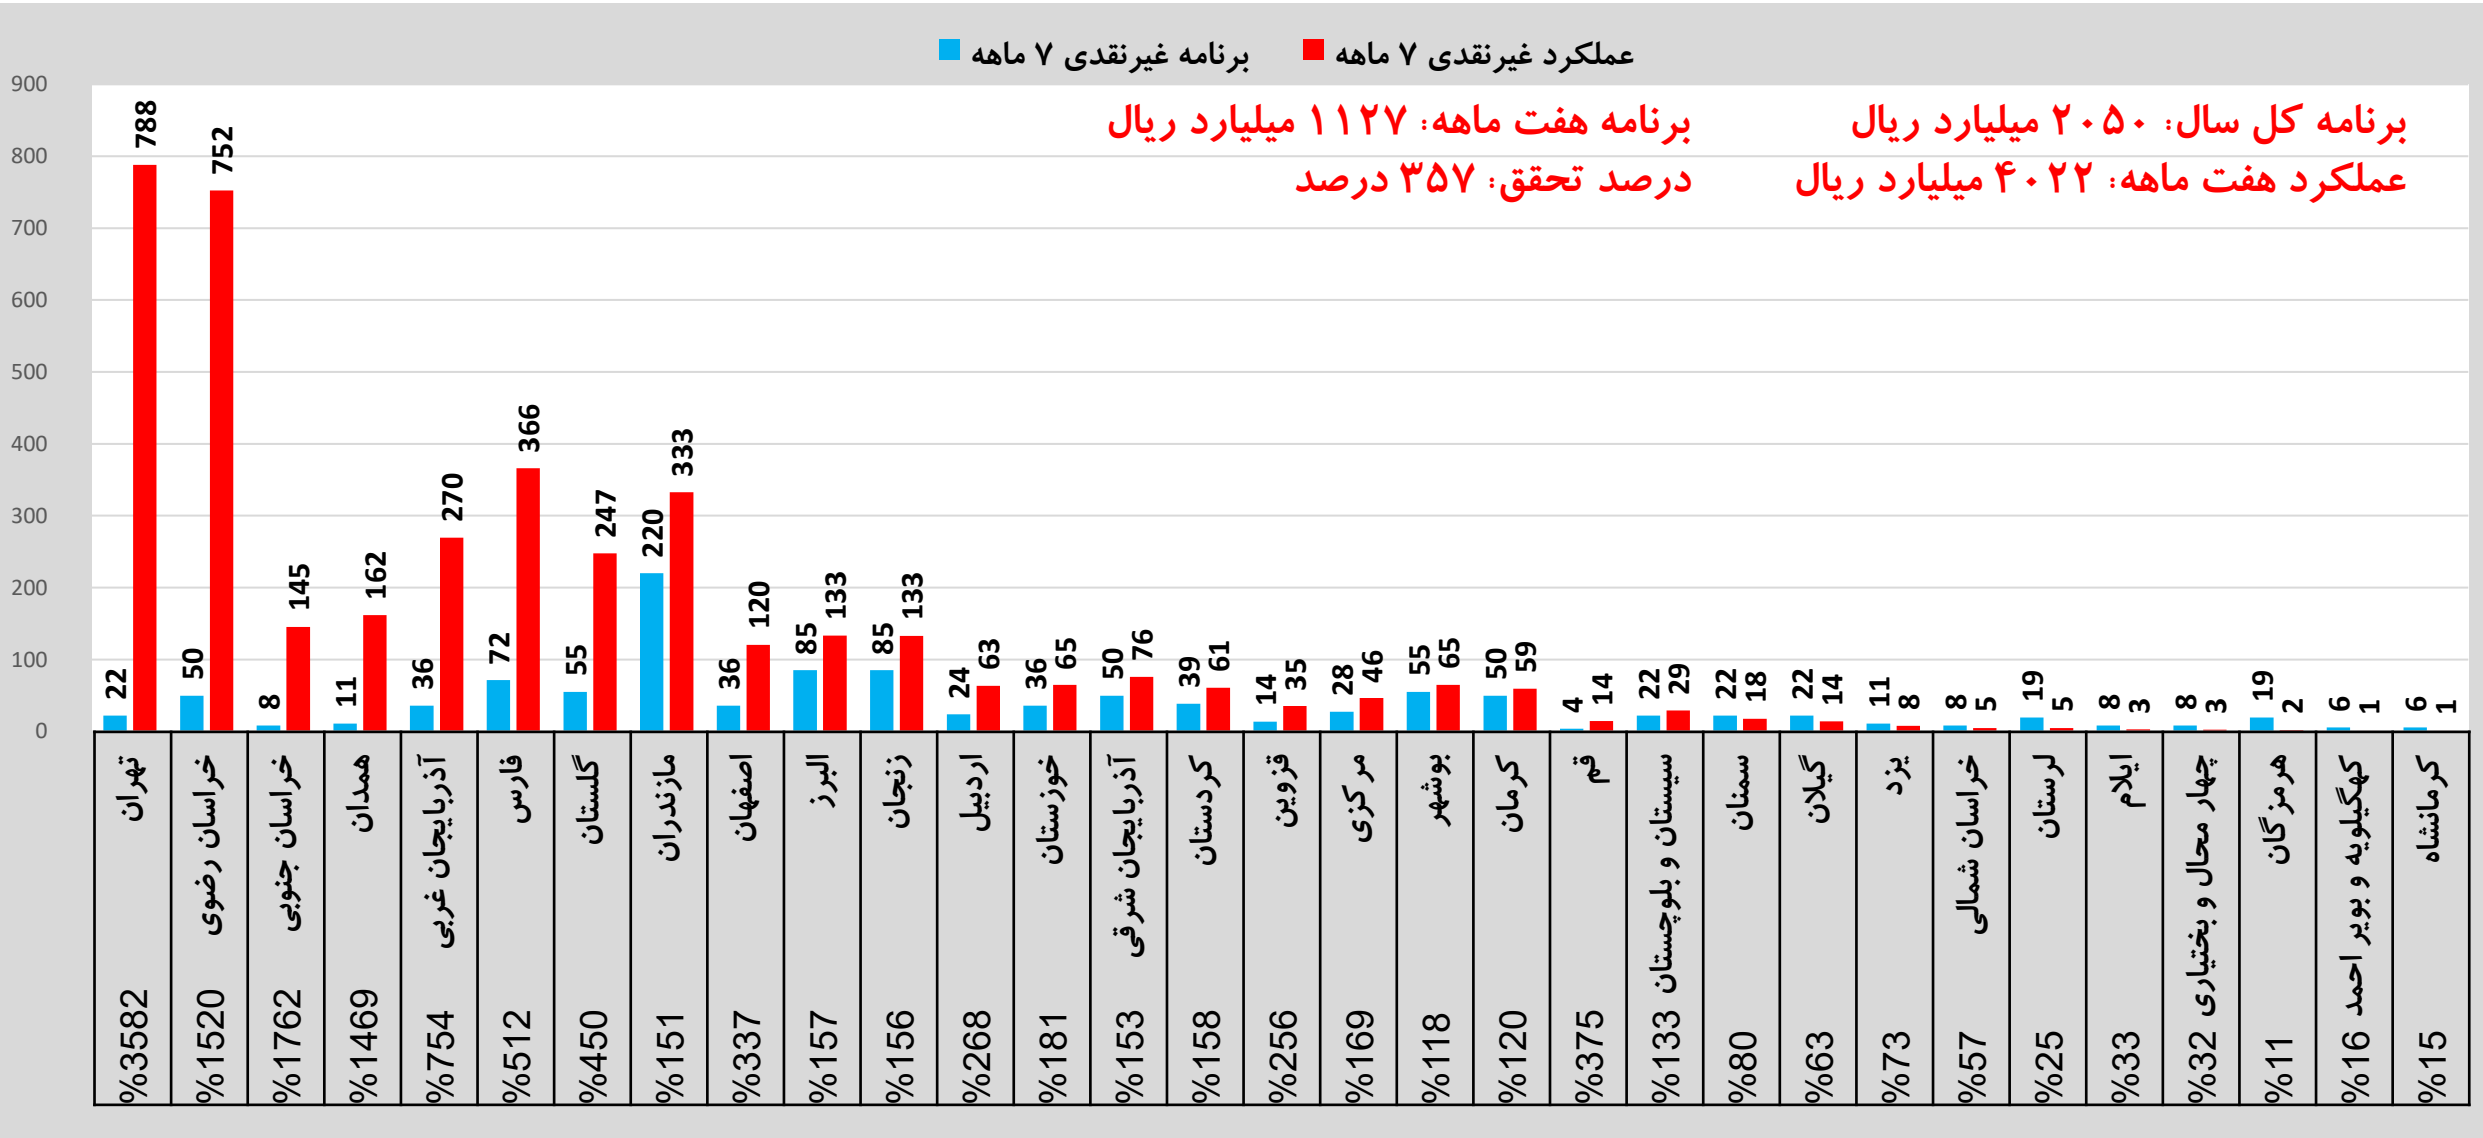

❑ دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰

✓ تأکید بر کمک به ساخت مسکن استیجار از طریق انجمن های خیرین مسکن ساز

بسمه تعالی

تاریخ: _تاریخ_

شماره: _شماره_

پیوست: _پیوست_

انجمن خیرین مسکن ساز ایران

ثبت : ۱۶۶۸۴

کلیه مدیران عامل محترم انجمن خیرین مسکن ساز استان

با سلام و احترام

به پیوست دستورالعمل اجرایی ساخت و یا عرضه مسکن استیجار در طرح خانه امید ابلاغی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارسال می گردد. مقتضی است از دستورالعمل مذکور حداکثر بهره برداری جهت ایجاد هم افزایی در پروژه های انجمن خیرین مسکن ساز استان بعمل آورید.

فرهاد خاکی پور

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن سازایران

2064779671

❑ روابط عمومی

✓ دفتر روابط عمومی نسبت به ارائه گزارش در خصوص پخش کلیپ‌های کوتاه در رسانه ملی و پلتفرم شبکه‌های مجازی و انعکاس اخبار آن ارائه گزارش نماید.

با تشکر از توجه شما
