
گزارش تحلیلی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن با عاملیت بنیاد مسکن (بنیادساخت و انبوه ساز)


کل کشور


۱۴۰۵\۰۷\۱۵

وضعیت کلی پروژه‌ها

تعداد واحدهای تعریف شده	۷۸,۸۰۹ پروژه
شروع عملیات اجرایی تاکنون	۷۸,۶۲۴ واحد
پروژه‌های پایان‌یافته تا ابتدای سال	۱۴,۵۳۴ واحد
پروژه‌های در دست اجرا سال جاری	۶۴,۰۹۰ واحد
متوسط پیشرفت پروژه‌ها	۶۸% درصد
هزینه کرد به ازای ۱% پیشرفت در هر واحد	۱۴ میلیون ت

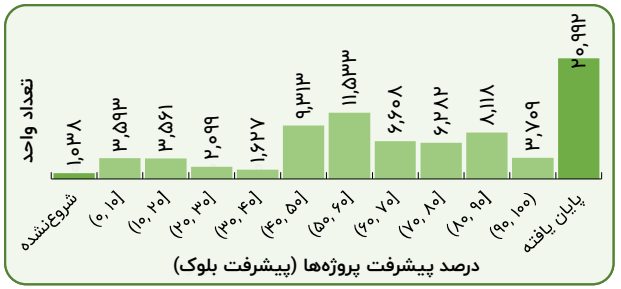







وضعیت متقاضیان

تعداد کل متقاضیان	۷۵,۸۹۲ نفر
تعداد متقاضیان تخصیص‌یافته	۷۶,۹۸۰ نفر
میانگین آورده تقاضیان	۶۳۷ میلیون تومان

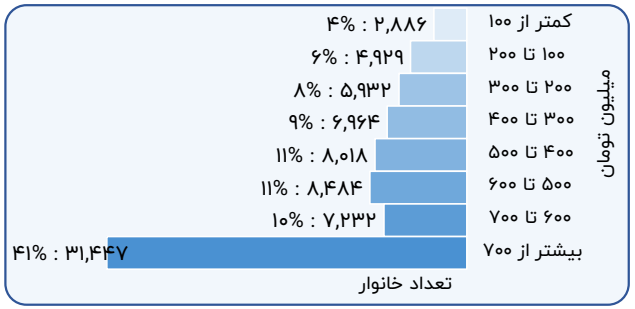


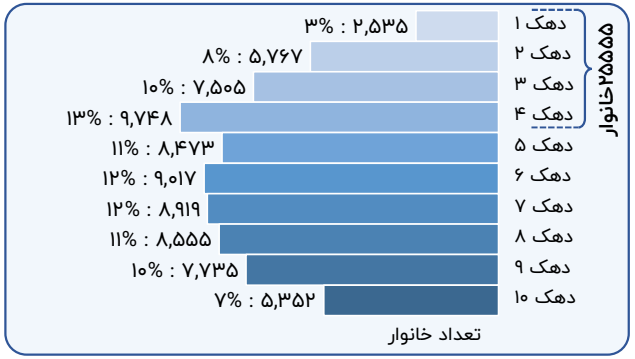




وضعیت مالی

تعداد واحدهای دارای عقد قرارداد	۷۷,۰۳۸ واحد
تعداد پروژه‌های سررسید شده	۱۶۱ پروژه
تعداد واحدهای سررسید شده	۱۱,۹۹۷ واحد
بیشترین روز سررسید شده	۷۶۳ روز



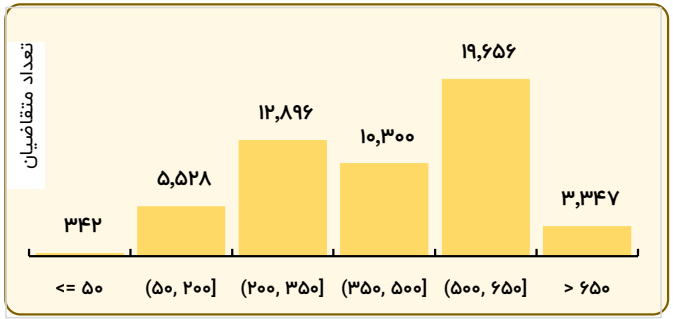


میزان پیشرفت فیزیکی (براساس پیشرفت بلوک‌ها)	تعداد واحد	متقاضی موثر (براساس آورده متقاضی)	میزان اختلاف (تعداد واحد با تعداد متقاضی)
کمتر از ۲۰ درصد	۸,۱۹۲	۶,۵۹۰	۱,۶۰۲
بین ۲۰ تا ۴۰ درصد	۳,۷۲۶	۹,۷۷۴	-۶,۰۴۸
بین ۴۰ تا ۶۰ درصد	۲۰,۸۴۶	۱۳,۱۴۳	۷,۷۰۳
بین ۶۰ تا ۸۰ درصد	۱۲,۸۹۰	۱۴,۳۳۹	-۱,۴۴۹
بیشتر از ۸۰ درصد	۳۲,۸۱۹	۳۱,۶۷۳	۱,۱۴۶


گزارش تحلیلی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن با عاملیت بنیاد مسکن (بنیادساخت و انبوه ساز)

کل کشور


۱۴۰۵\۰۷\۱۵


تعداد کل متقاضیان ۷۵,۸۹۲ نفر

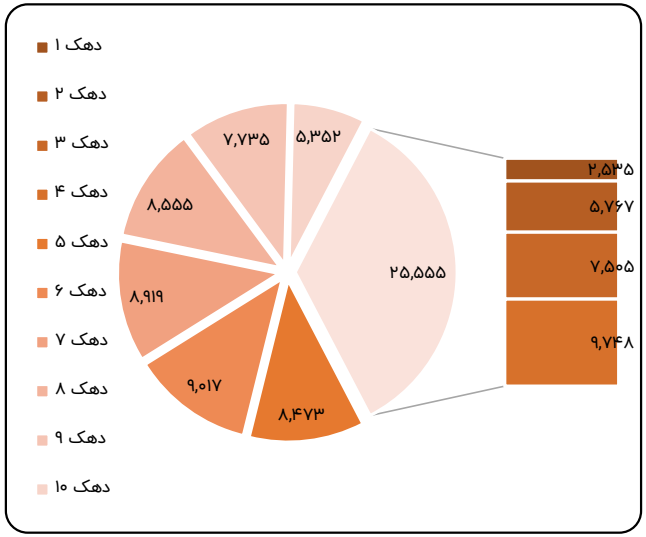


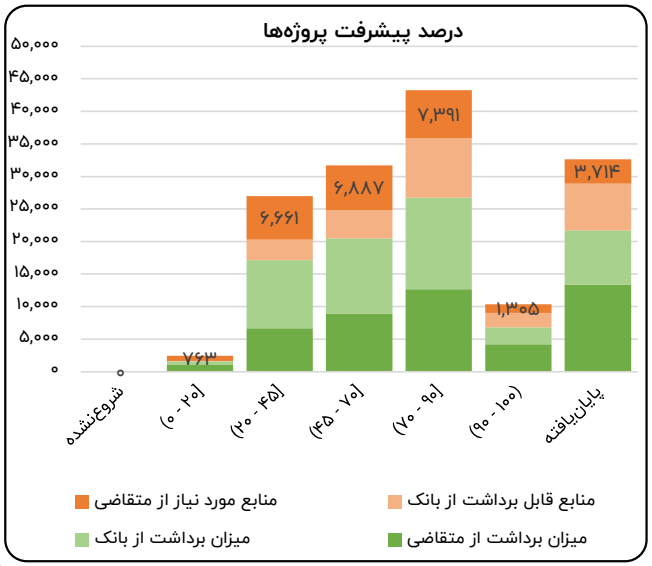



میانگین آورده تقاضیان ۶۳۷ میلیون تومان

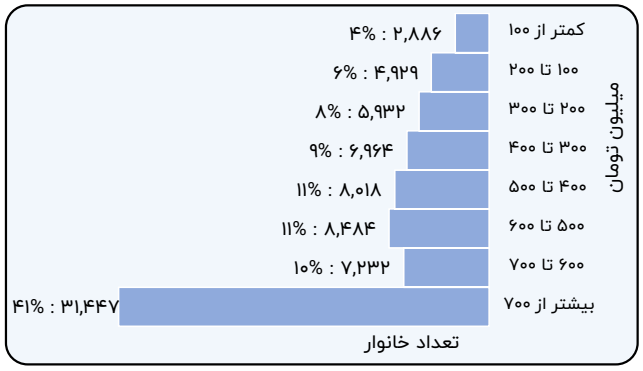


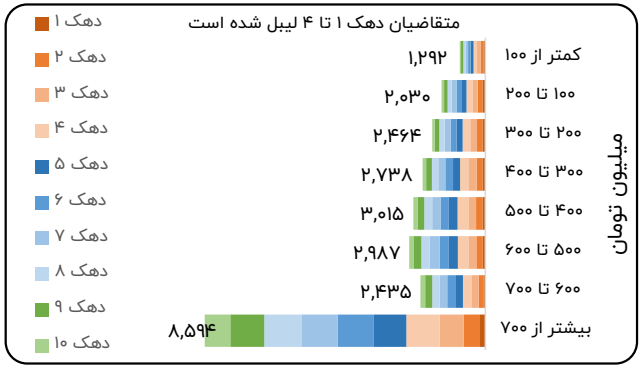

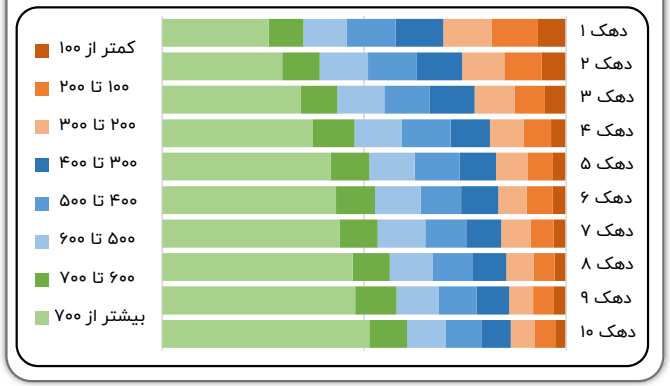

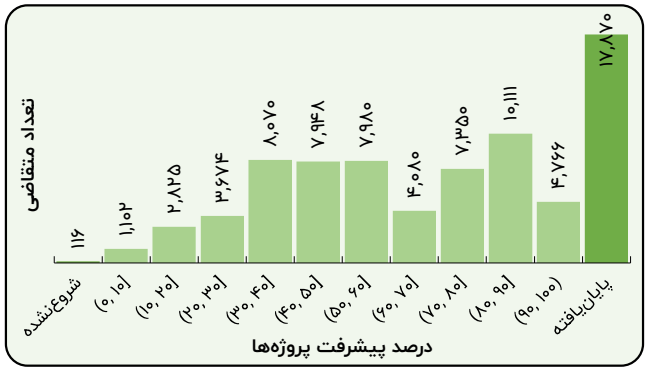


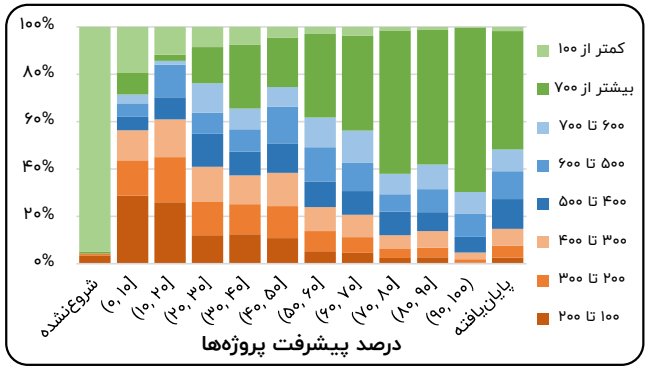

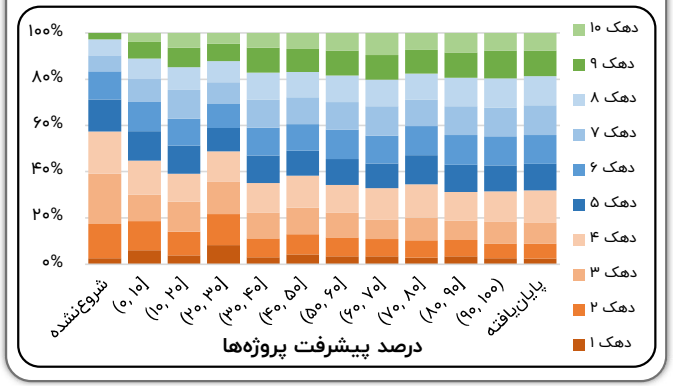


نمودار مقایسه اي نسبت شاخص تعداد واحد تخصیصی به شاخص تعداد واحد بلوک تا تاریخ ۱۴۰۵\۰۷\۱۵

تعداد واحد تخصیصی کل کشور: ۲۲۲,۳۵۱
تعداد واحد بلوک کل کشور: ۲۳۳,۴۲۰
میانگین کشوري: ۹۷%

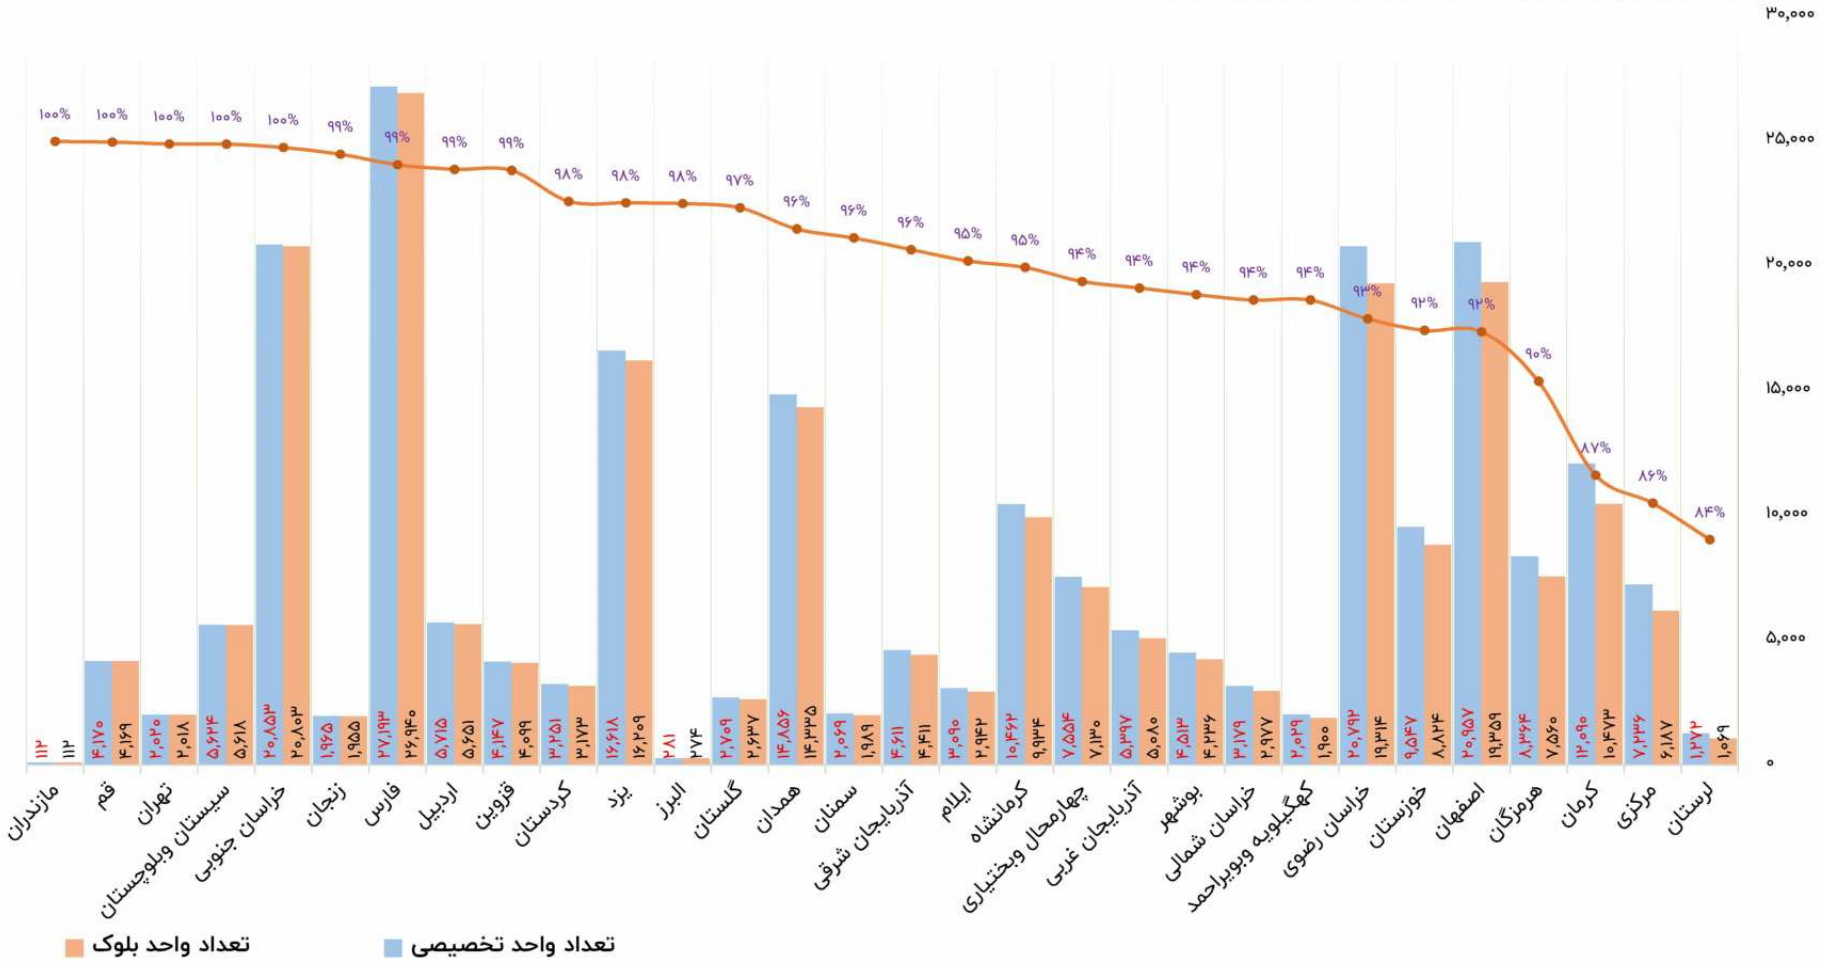


نمودار مقایسه اي نسبت شاخص تعداد واحد تخصیصی به شاخص فونداسیون تا تاریخ ۱۴۰۵\۰۷\۱۵

تعداد واحد تخصیصی کل کشور: ۲۲۲,۳۵۱
فونداسیون کل کشور: ۱۵۸,۰۲۸
میانگین کشوري: ۱۵۲%

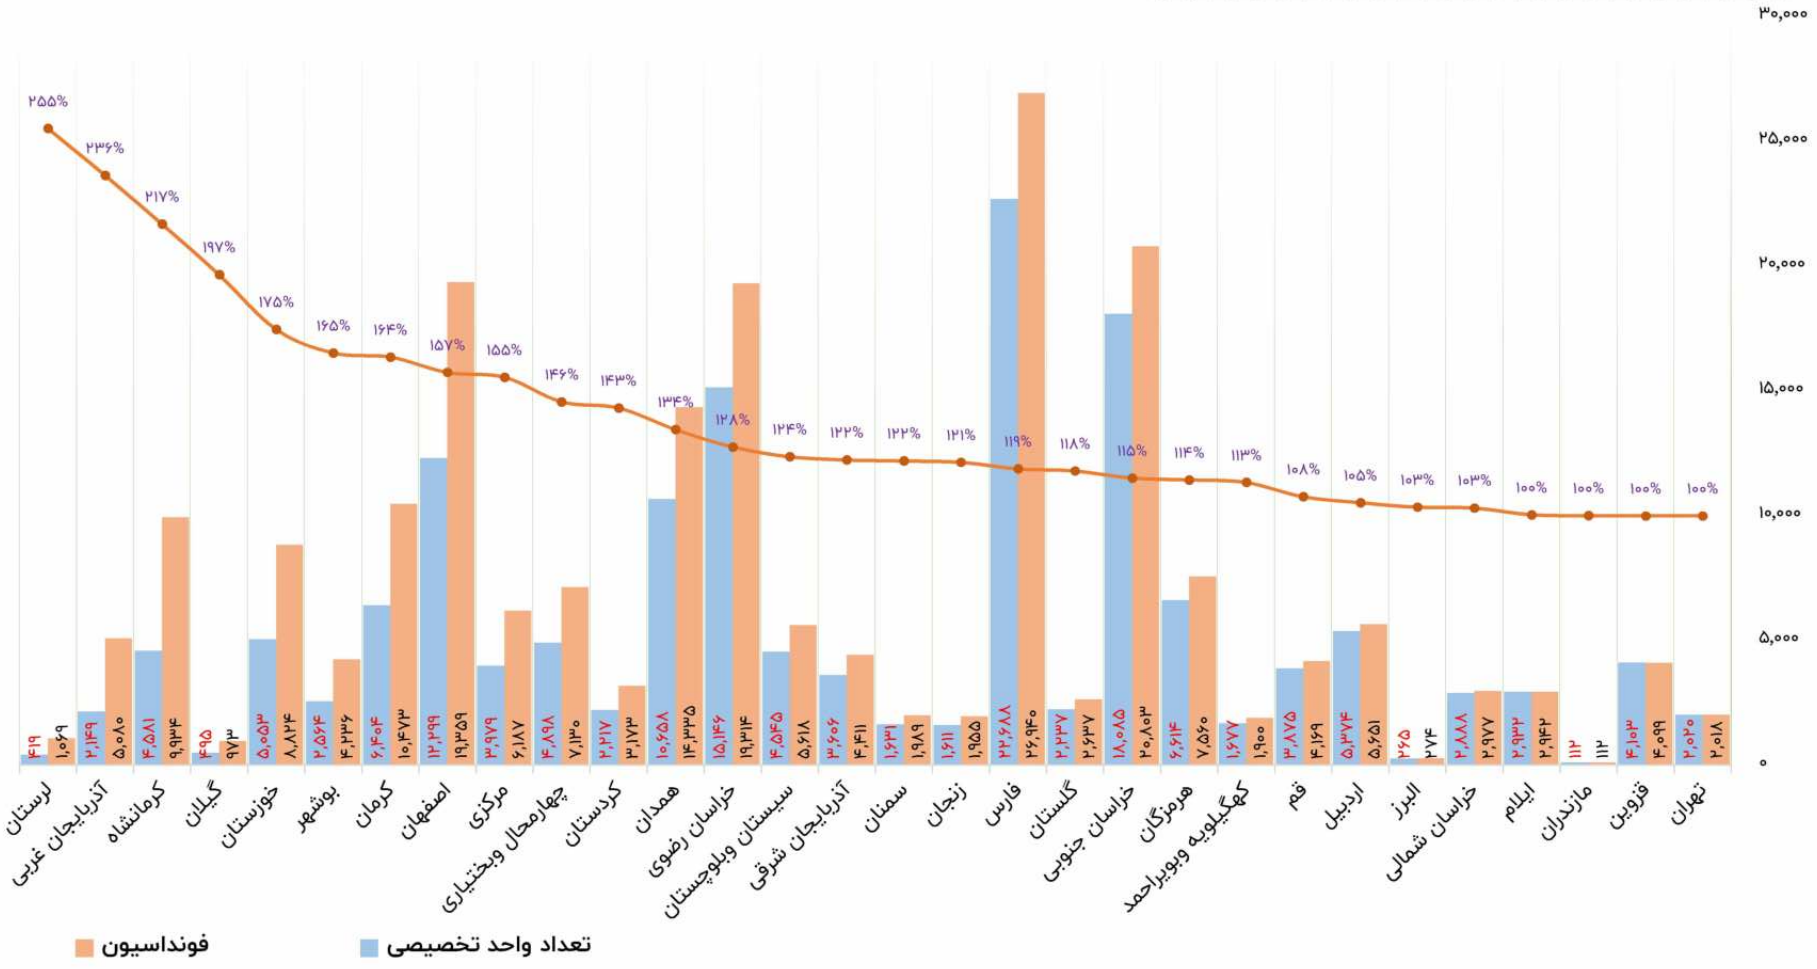


نمودار مقايسه اي نسبت شاخص فونداسيون به شاخص اسكلت و سقف تا تاريخ ۱۴۰۵\۰۷\۱۵

فونداسيون كل كشور: ۱۵۸,۰۲۸
اسكلت و سقف كل كشور: ۱۰۷,۰۹۸
ميانگين كشوري: ۱۴۶%

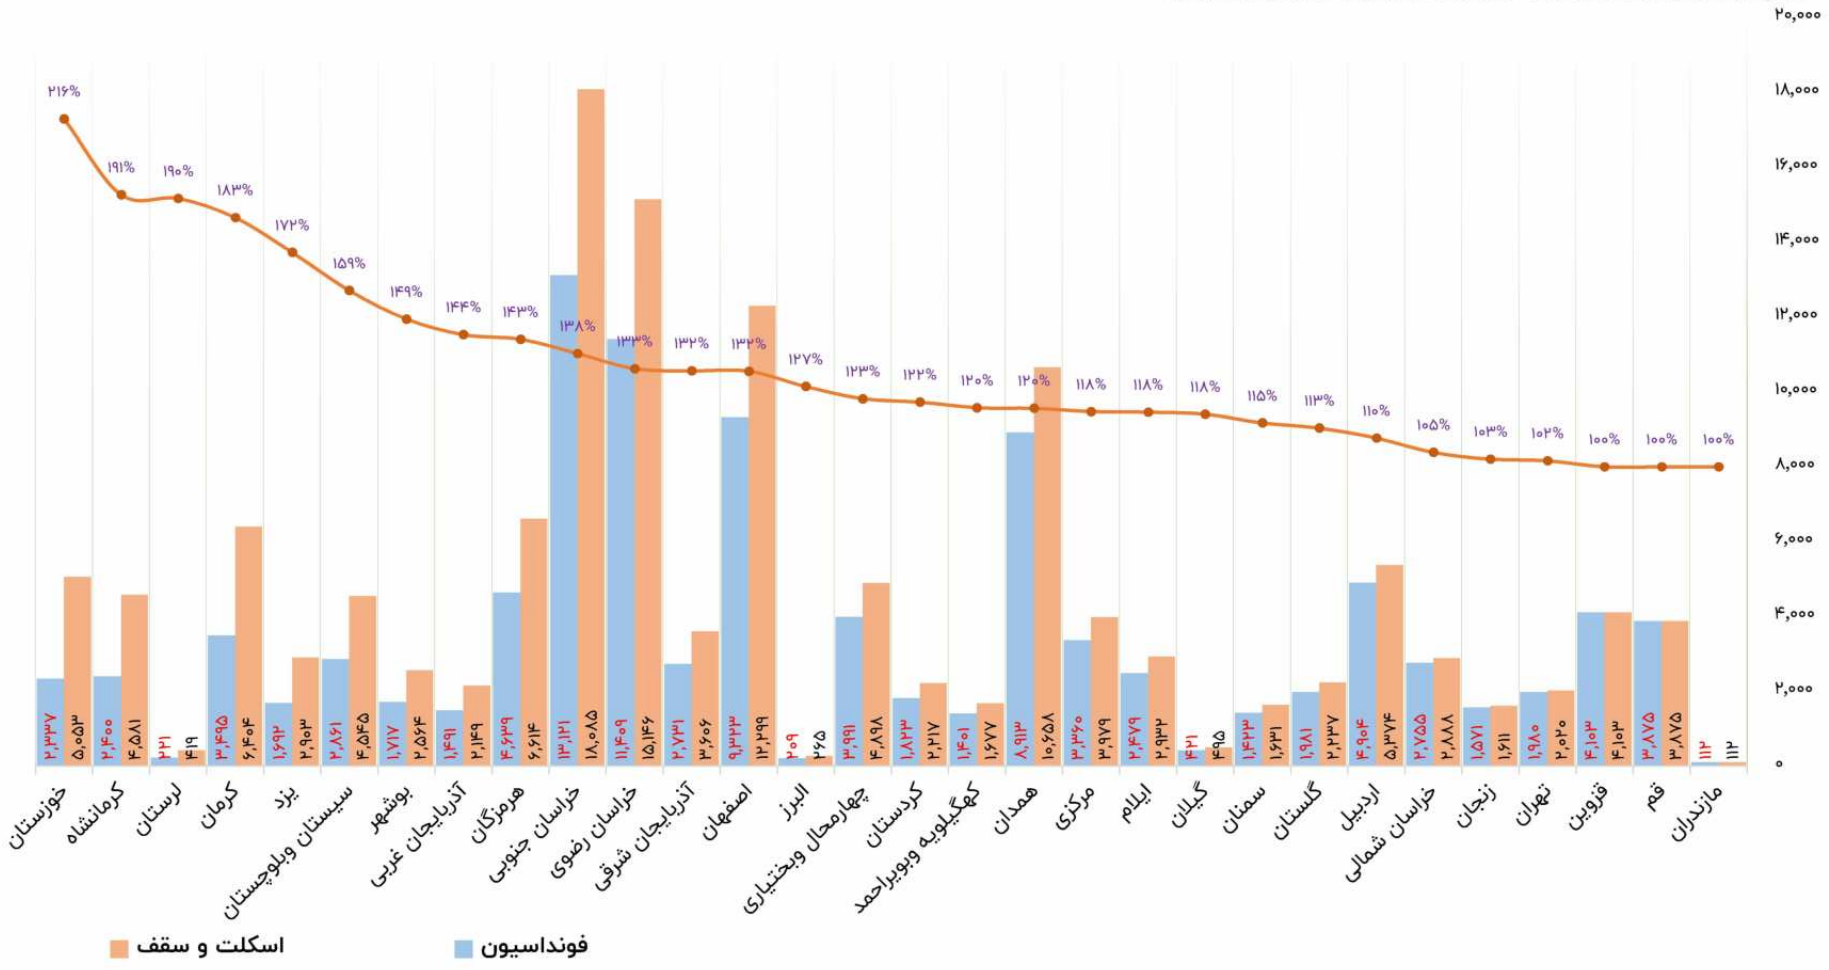


نمودار مقایسه اي نسبت شاخص اسکلت و سقف به شاخص سفتکاری تا تاریخ ۱۴۰۵\۰۷\۱۵

اسکلت و سقف کل کشور: ۱۰۷,۰۹۸
سفتکاری کل کشور: ۶۲,۴۷۰
میانگین کشوري: ۱۹۶%

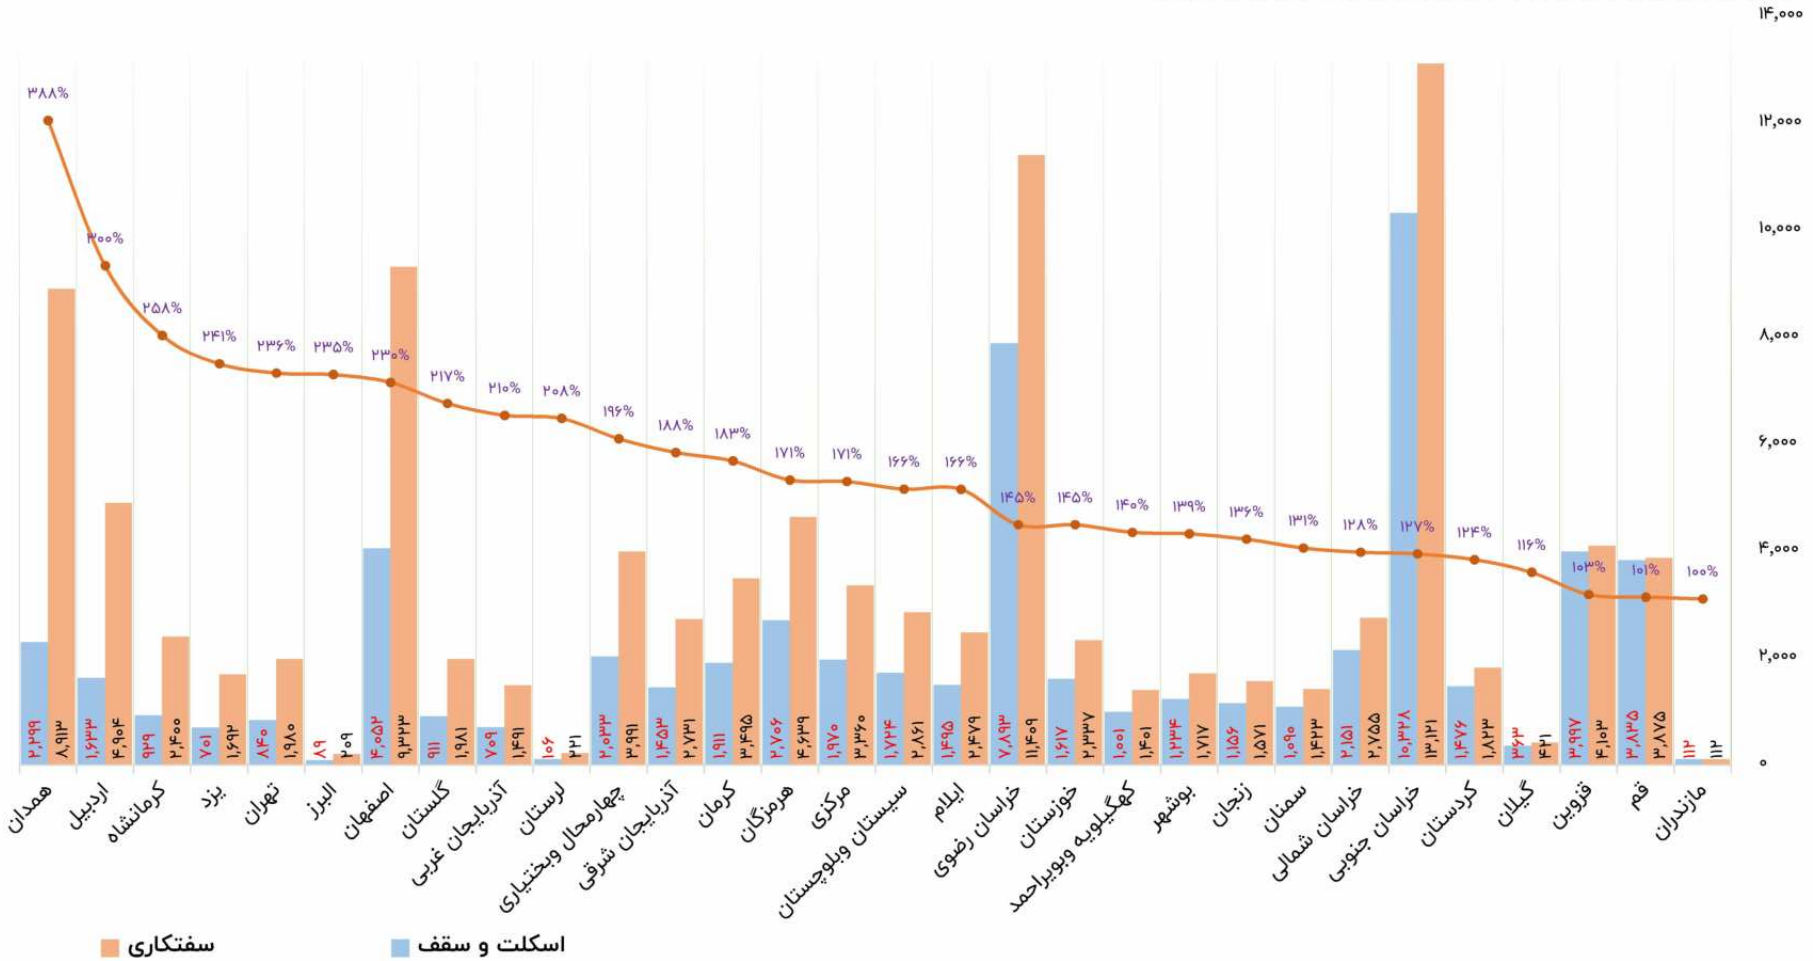

نمودار مقایسه اي نسبت شاخص سفتکاری به شاخص نازک کاری تا تاریخ ۱۴۰۵\۰۷\۱۵

سفتکاری کل کشور: ۶۲,۴۷۰
نازک کاری کل کشور: ۴۷,۴۷۳
میانگین کشوري: ۱۶۵%

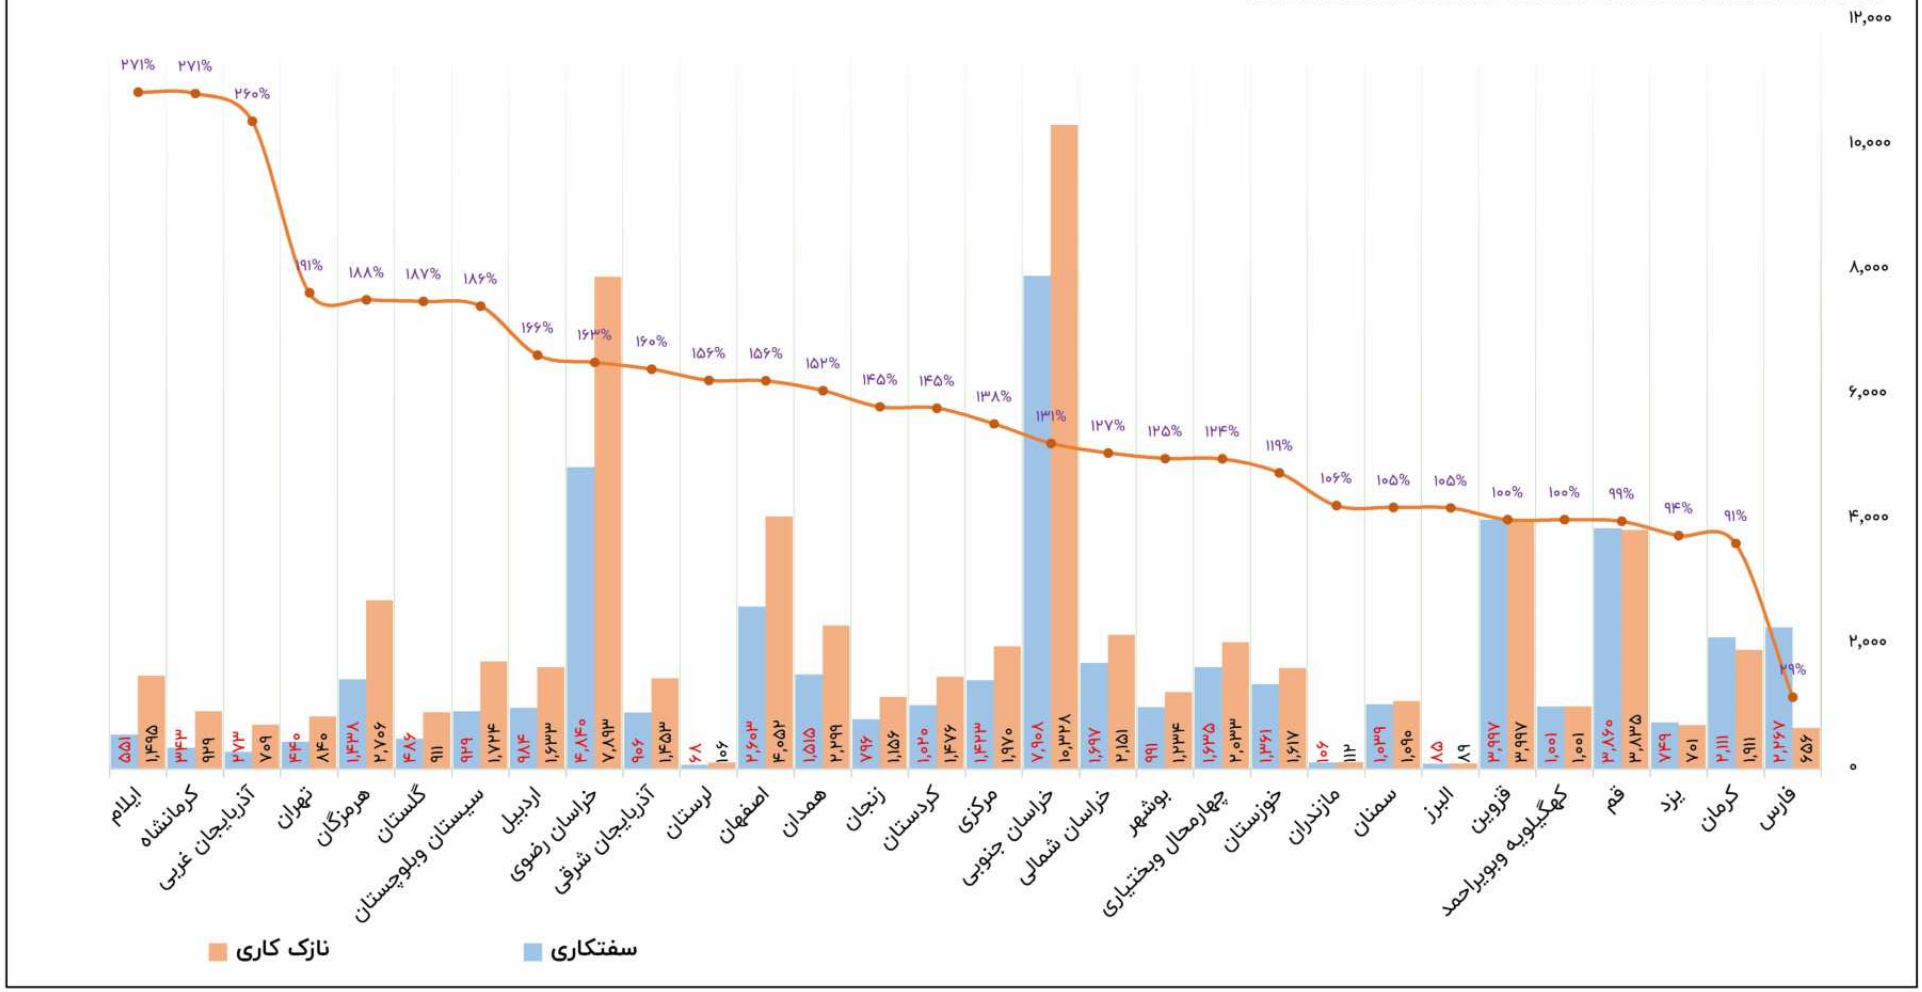

نمودار مقایسه اي نسبت شاخص نازک کاری به شاخص کارهای پایانی تا تاریخ ۱۴۰۵\۰۷\۱۵

نازک کاری کل کشور: ۴۷,۴۷۳
کارهای پایانی کل کشور: ۴۲,۴۳۲
میانگین کشوري: ۱۲۳%

